


平成26年広島豪雨災害の発生箇所における治山工事の状況について  
(平成28年5月28日時点)



<凡例> 災害①・・・災害復旧事業予算により実施している箇所

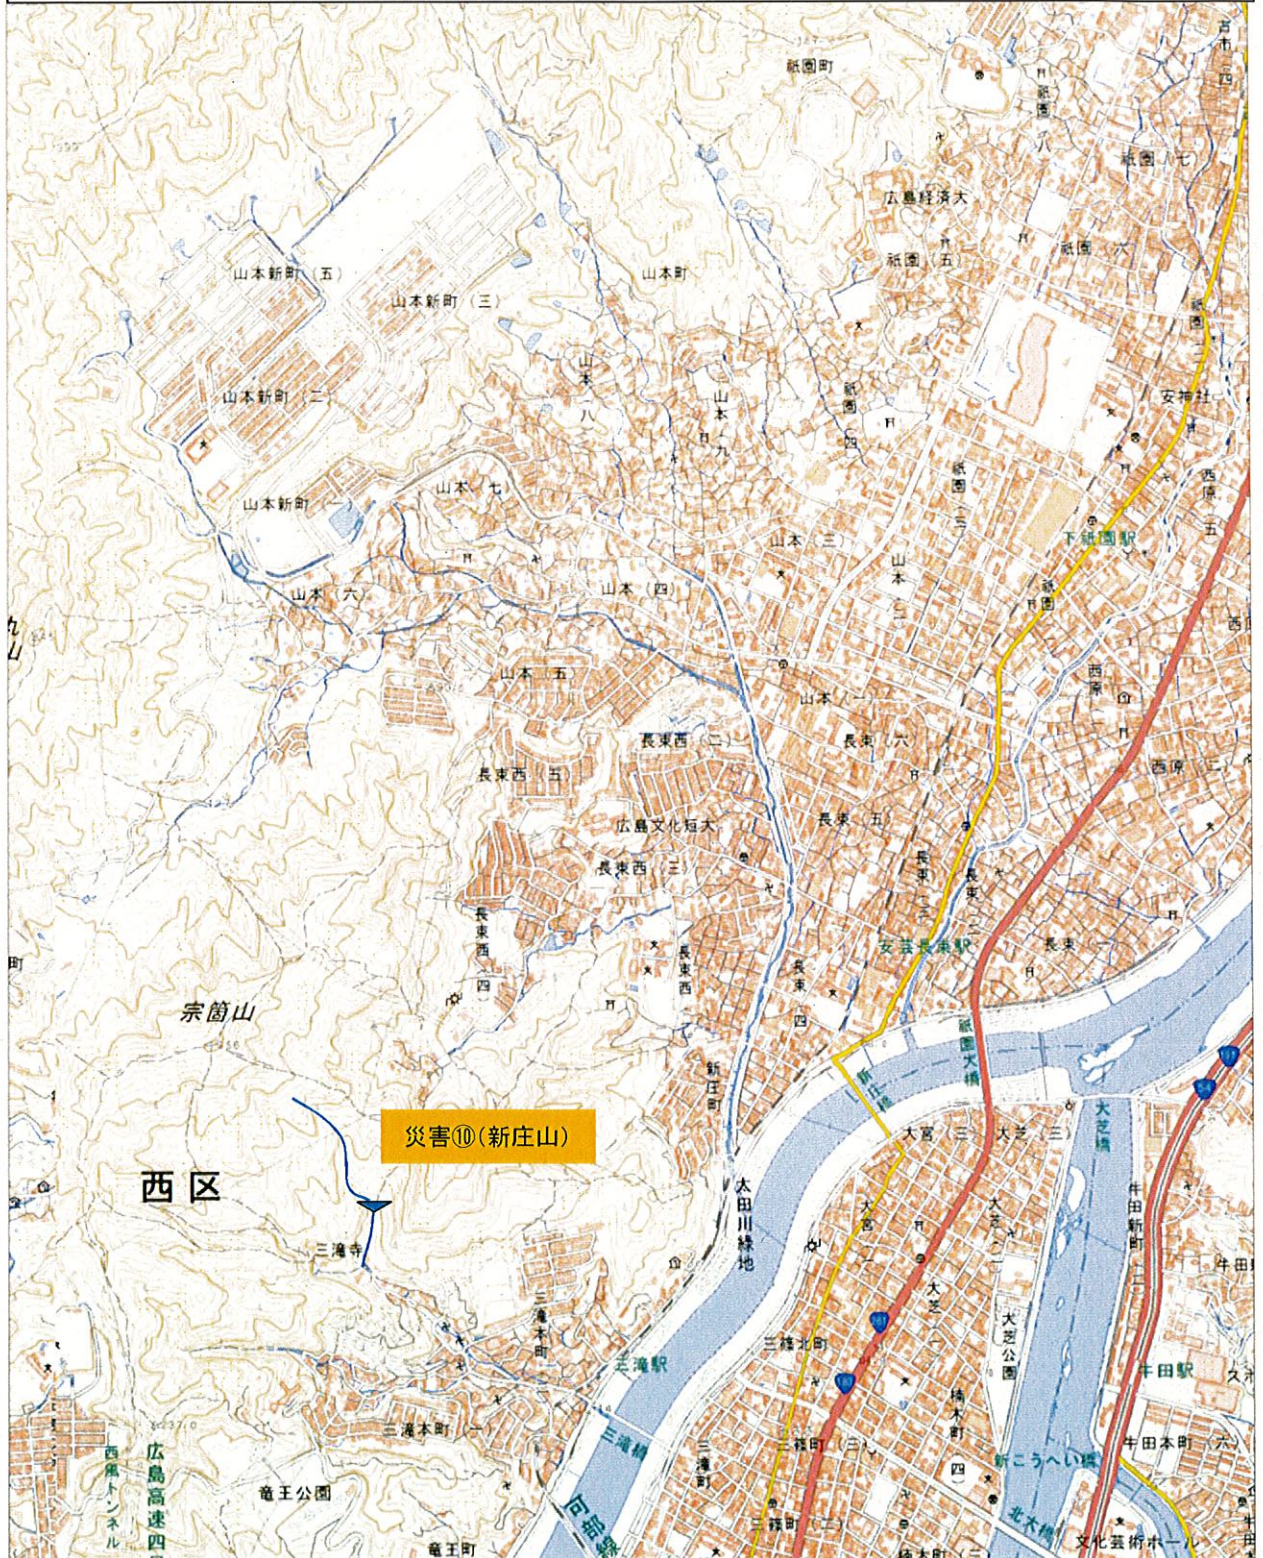

# 災害⑩（新庄山）の実施状況について

H28,5,28現在


被災直後（三瀧寺）



作業道作設中パイロット970m



安佐南区の起点から450m付近

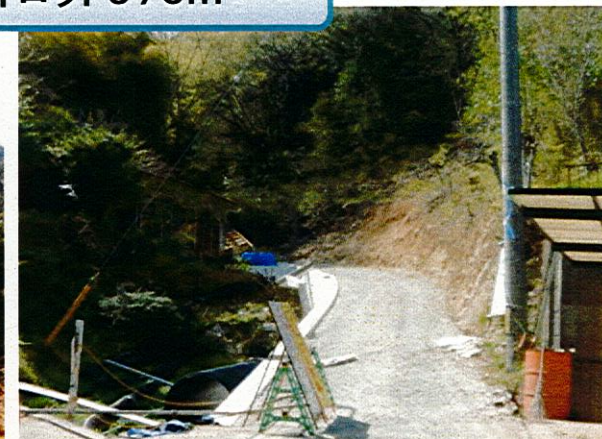

地形上の制約により安佐南区から作業道を延長  
(民地部分 400m 国有林570m計画)  
写真は安佐南区の起点付近

## 新庄山災害復旧工事


契約日:平成27年11月26日

工期:平成27年11月27日～平成28年9月12日

## 工事の進捗状況(5月28日現在)

作業道を作設中  
谷止工箇所掘削中

強靱ワイヤーネット  
設置状況

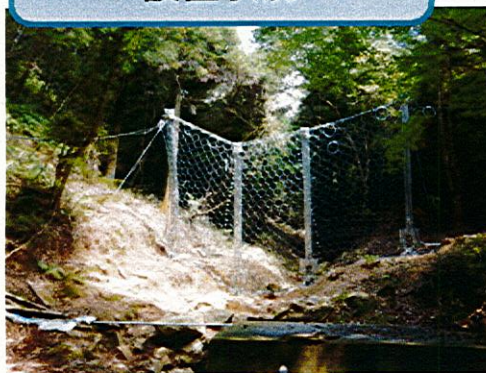

鋼製枠谷止工1基(支障木伐採完了時)






工事規模(写真は上流から)  
L=17.0m H=4.0m V=17.691t



# 平成26年広島豪雨災害に係る今後の治山事業計画位置図

(平成28年4月時点) <広島市西区新庄山国有林>

※平成31年度までに実施することを計画している箇所

凡 例	
実施済又は実施中	溪間工 
	山腹工 
今後の計画	溪間工 
	山腹工 
