


# 現場だより ～町田河内山治山工事～

## ダイジェスト版

4月の工事着工から12月までの工事の進捗状況です。  
皆様には大変ご迷惑をおかけしておりますが、今後ともご協力宜しくお願い致します。

### 山腹工（法面での作業）


着工前

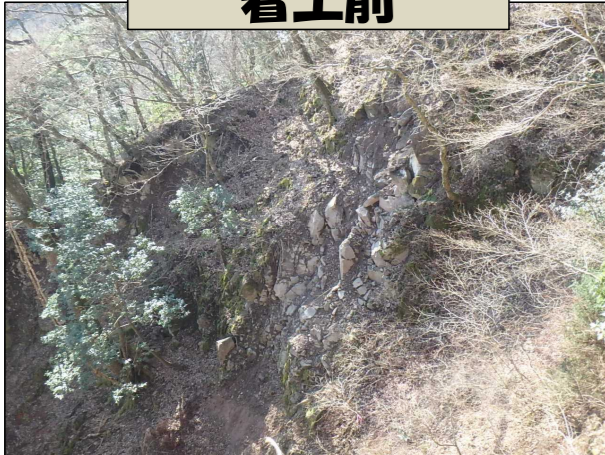

機械による法面整形



金網張り

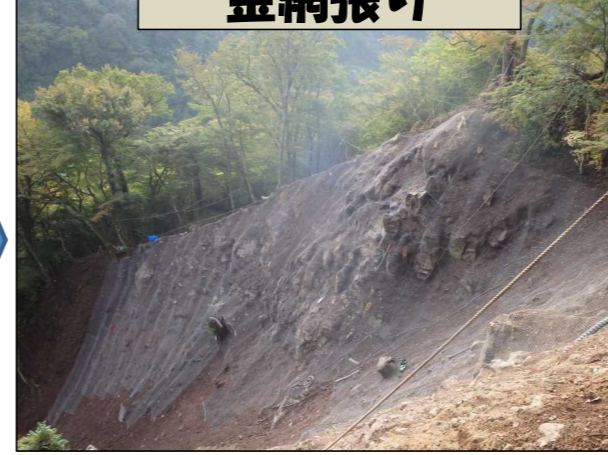


鉄筋組立



1月以降の作業内容は、引き続き鉄筋の組立を行った後、斜面にモルタルの吹付けを行います。

### 床固工（治山ダム）

着工前

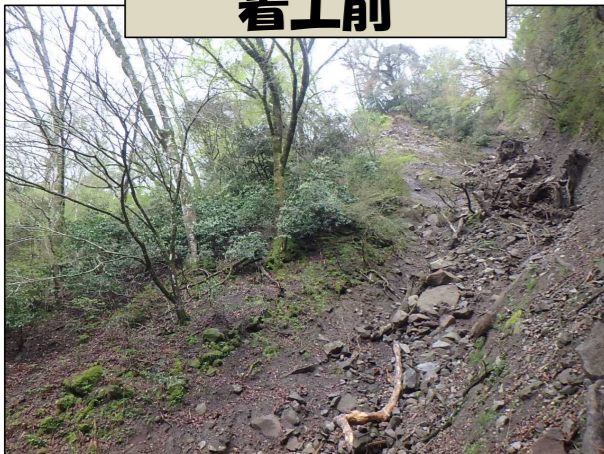

掘削状況



型枠作成状況



コンクリ流し込み



1月以降の作業内容は、12月でコンクリートの流し込みは終わりましたので、型枠を外した後、埋めていきます。

発注者：大分西部森林管理署 受注者：小倉建設株式会社
