

(令和7年5月26日現在)


令和6年能登半島地震・奥能登豪雨 災害復旧工事実施状況 (令和7年度)



林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室

※写真は令和6年能登半島地震により被害を受けた大谷地区の現地調査の状況

災害復旧工事箇所位置図

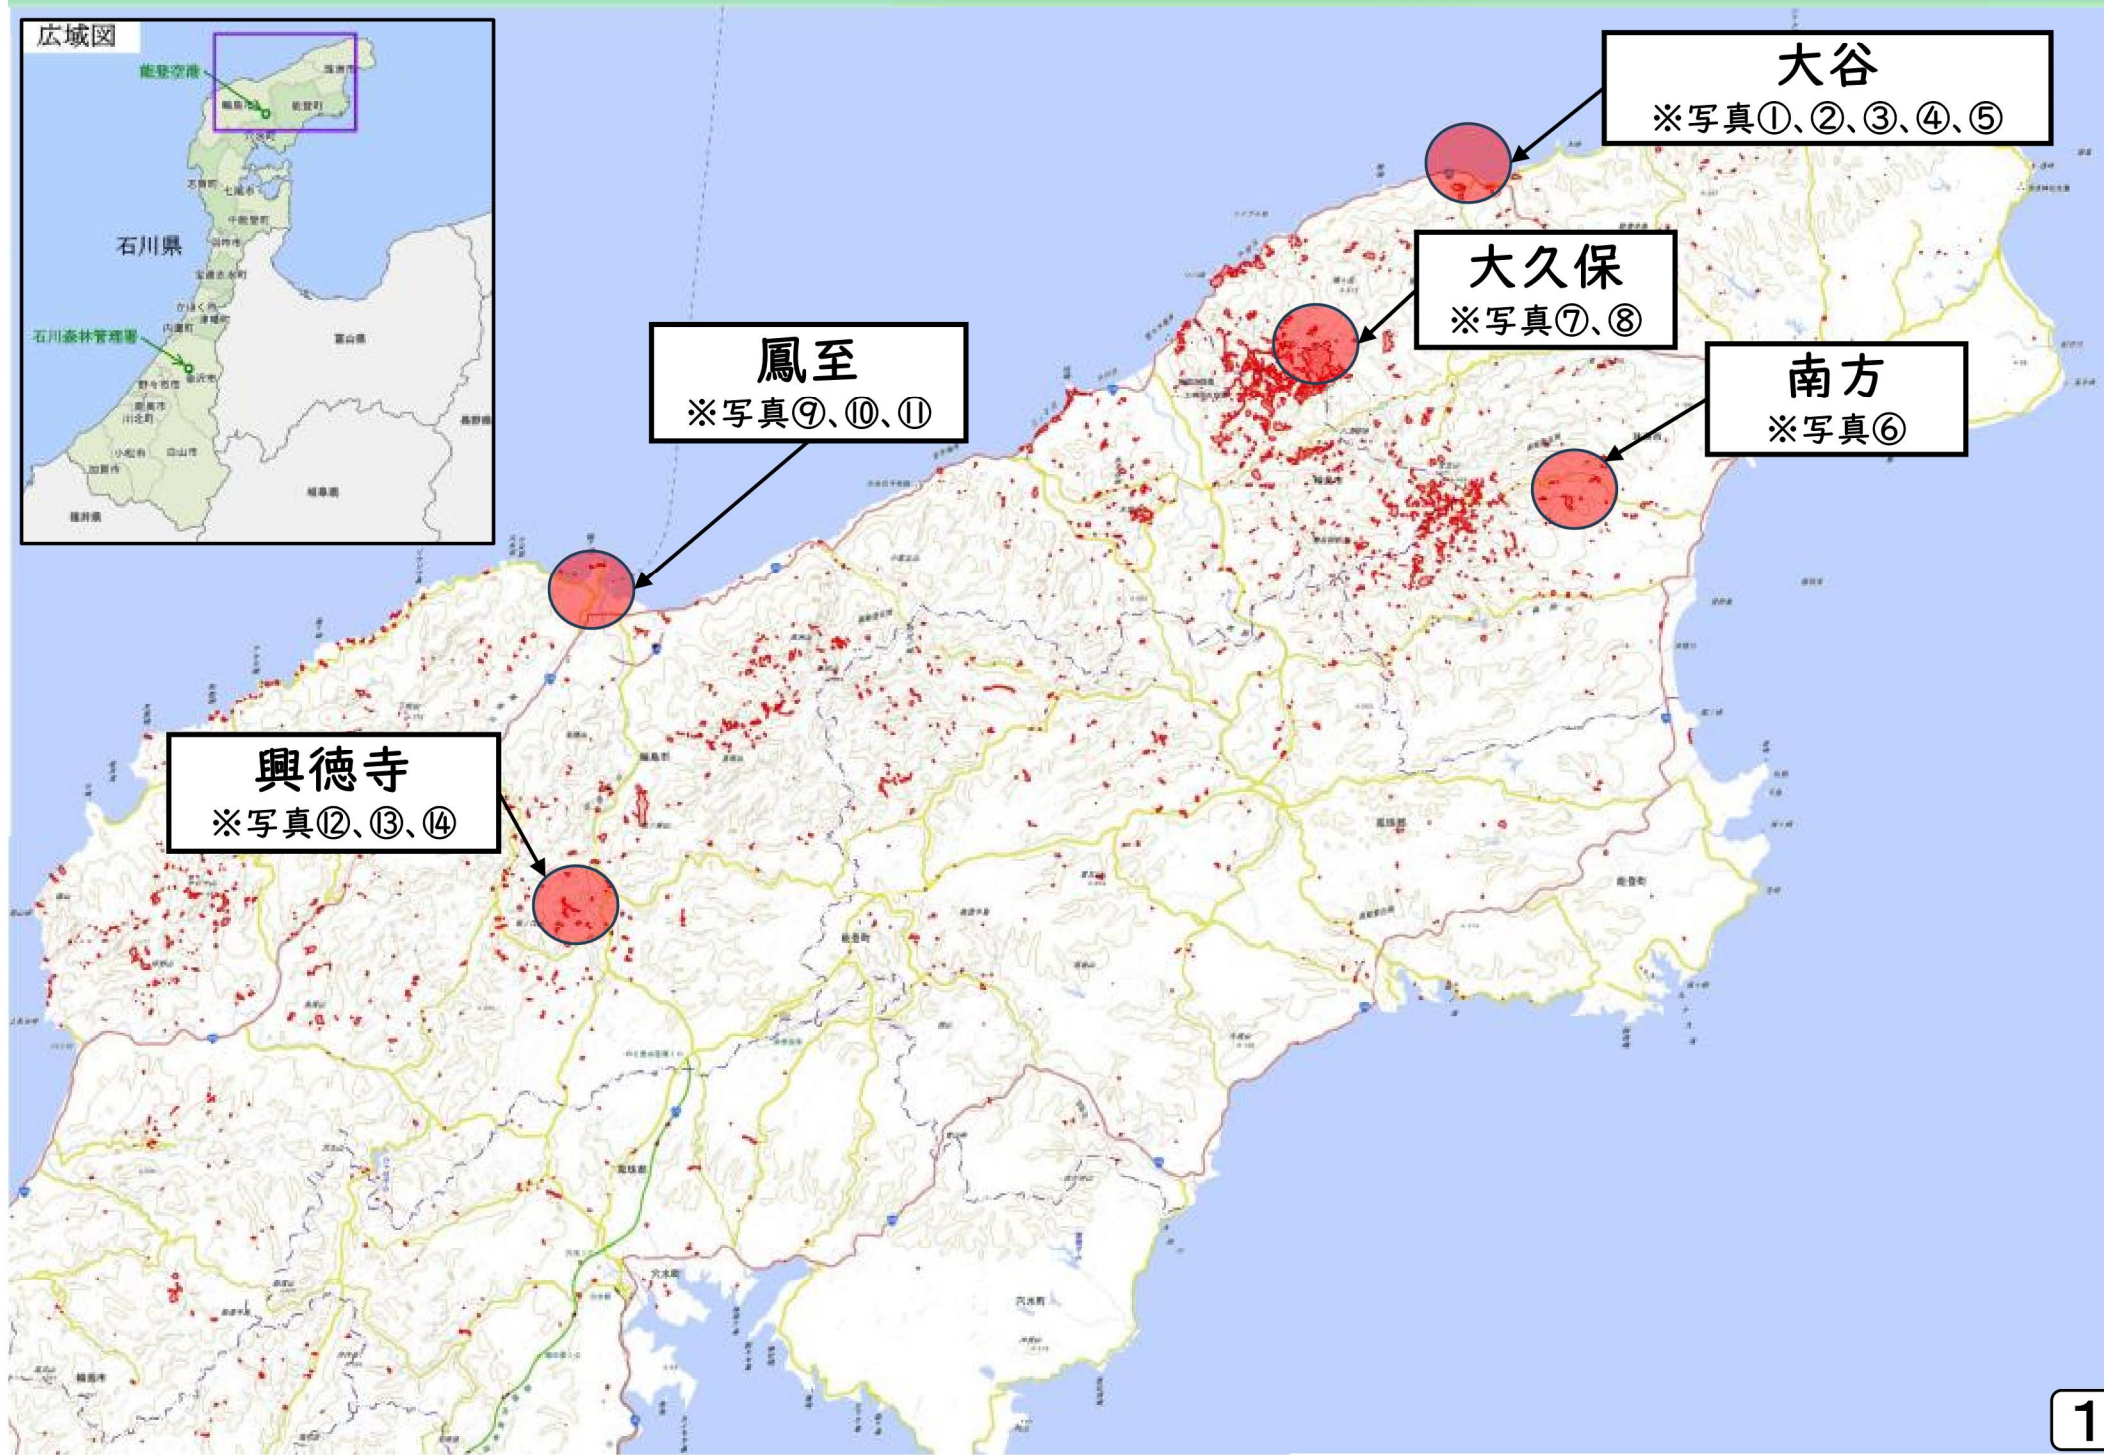


①_大谷災害対策追加工事(工事期間:R6.11.9~R7.6.20)

R7.5.26現在の施工内容：ブロック積谷止工ほか



工事施工箇所遠景 令和7年5月26日現在

②_大谷(ホ-3)災害対策工事(工事期間:R7.3.13~R8.3.13)

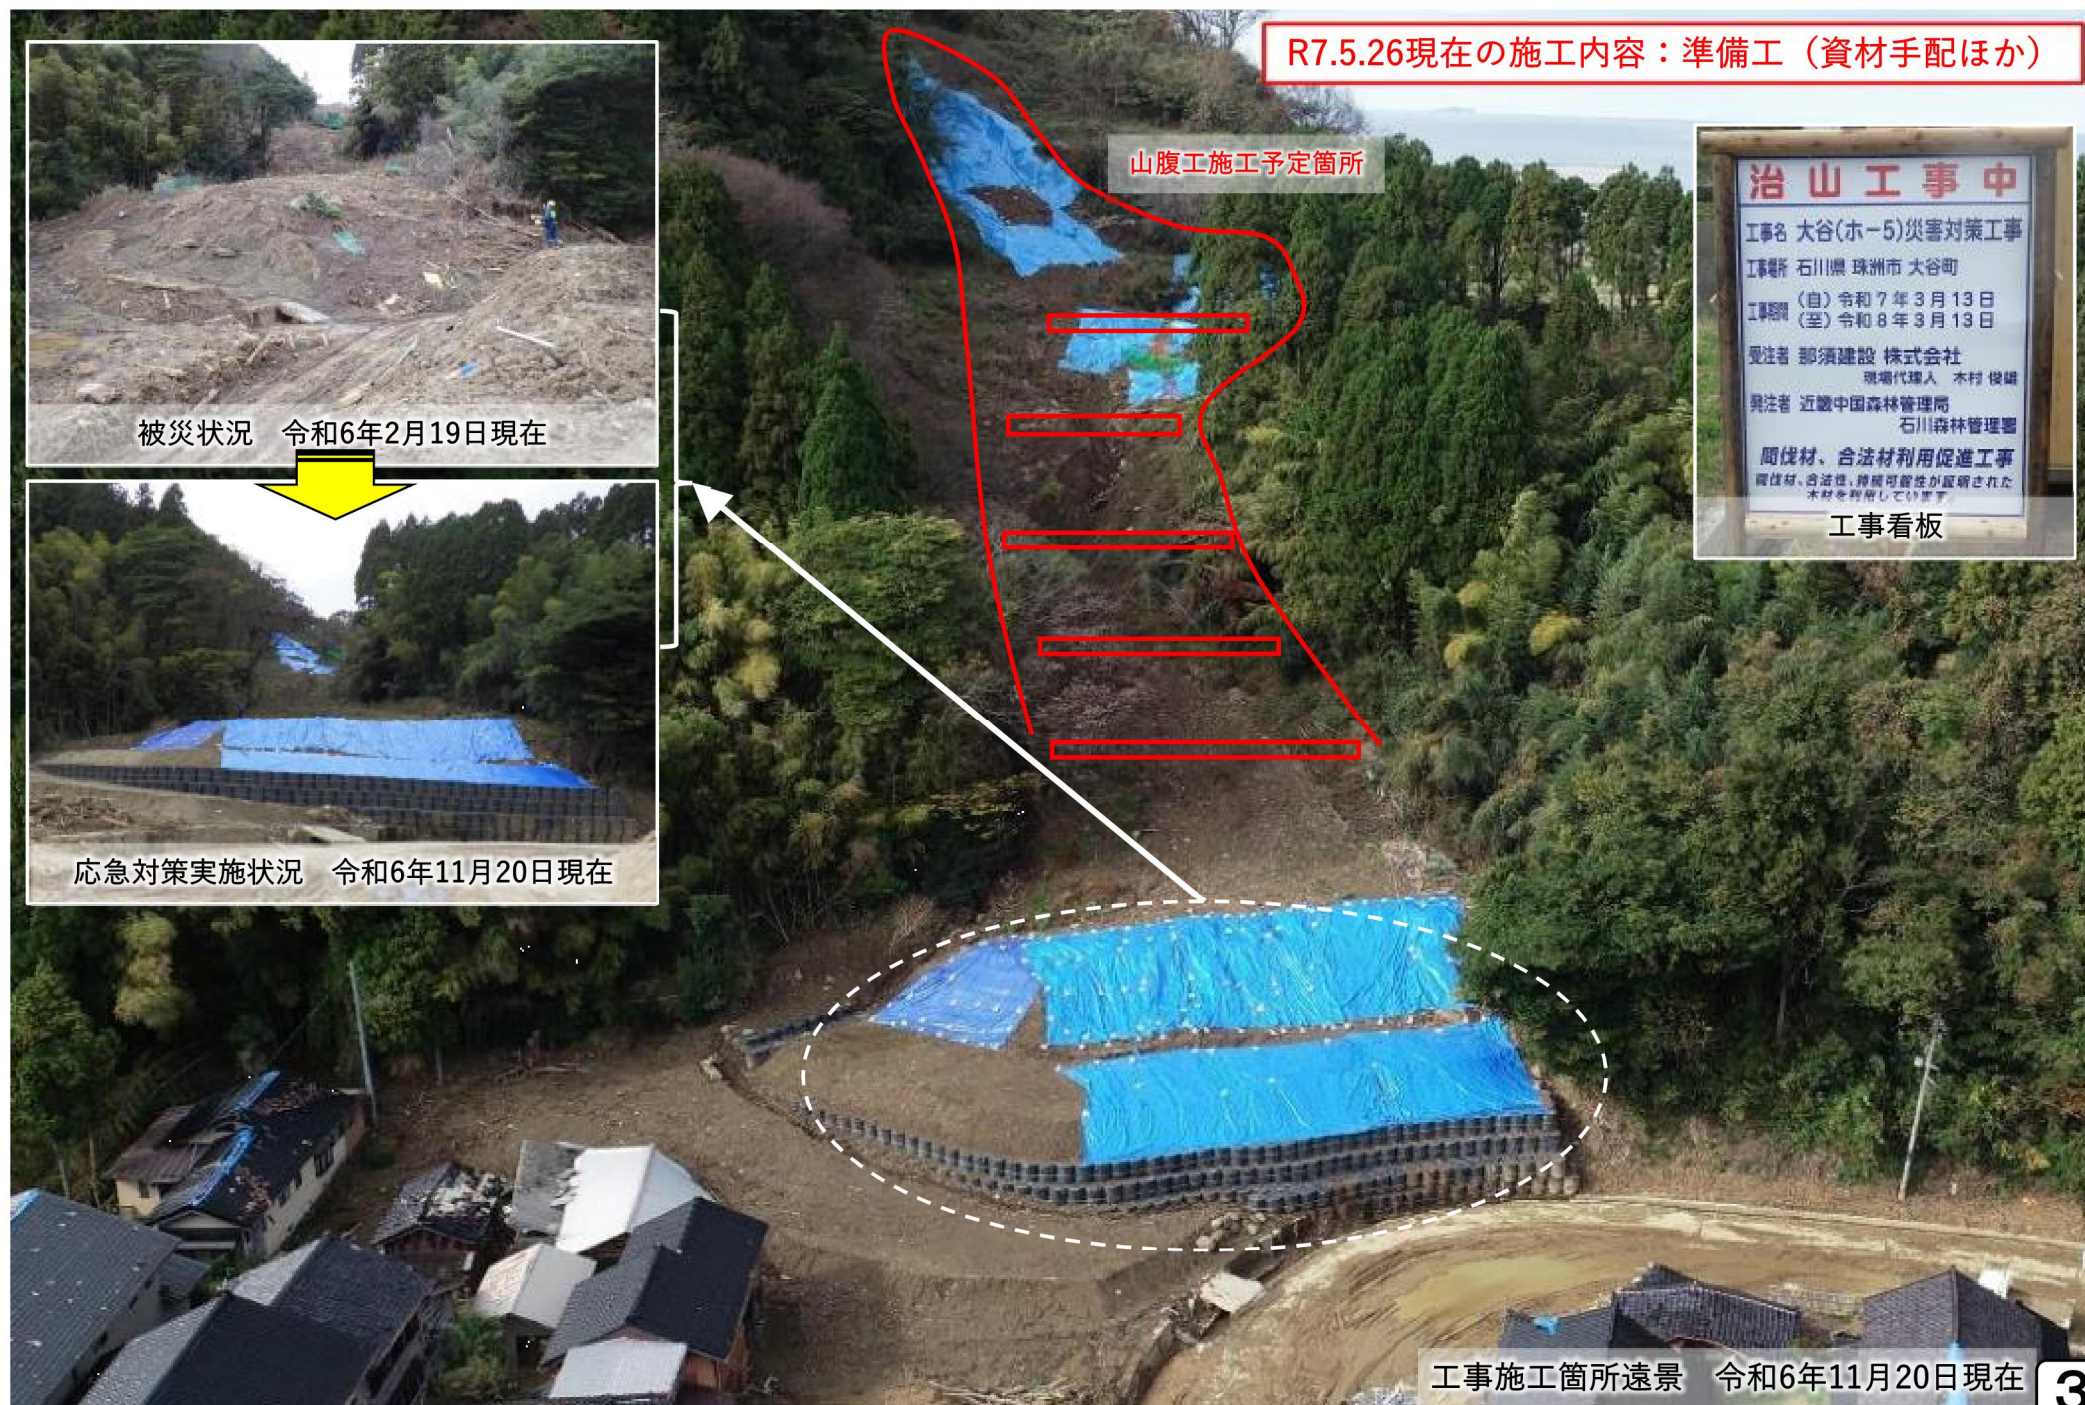

③_大谷(ホ-5)災害対策工事(工事期間:R7.3.13~R8.3.13)

R7.5.26現在の施工内容：作業道作設ほか



④_大谷(A溪流)災害対策工事(工事期間:R7.4.24~R8.3.13)



林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室

R7.5.26現在の施工内容：準備工（資材手配ほか）



工事施工箇所遠景 令和7年5月26日現在

⑤_大谷(B溪流)災害対策工事(R7.8中旬入札予定)



林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室



工事施工箇所遠景 令和7年5月26日現在

⑥_南方災害対策工事(工事期間:R7.3.25~R8.3.13)

R7.5.26現在の施工内容：作業道作設ほか



ご迷惑をおかけします

溪間工事

治山ダムをつくっています

令和 7 年 3 月 25 日から
令和 8 年 3 月 13 日まで
時間帯 8:00 ~ 17:00

南方災害対策工事

発注者 石川森林管理署 奥能登地区山地災害復旧対策室
電話 076-208-5301

施工者 株式会社 SEIWA
電話 082-426-0655

間伐材、合法材利用促進
間伐材、合法材、薪炭材利用促進
工事看板

溪間工施工予定箇所

工事施工箇所遠景 令和6年12月2日現在

⑦_大久保災害対策工事(工事期間:R7.2.6~R8.1.23)

R7.5.26現在の施工内容：作業道作設ほか



大規模崩壊地(約40ha)



工事施工箇所遠景 令和6年5月29日現在

⑧_大久保外治山工事 (R7.6.19入札予定)



林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室



山腹工 (航空実播工)
施工予定箇所周辺

工事施工箇所 (大久保ホ-42~74付近) 遠景 令和6年5月29日現在

⑨_鳳至施設災害対策工事(工事期間:R7.3.5~R7.10.31)

R7.5.26現在の施工内容：鋼製土留工ほか



工事施工箇所遠景 令和6年9月24日現在

⑩_鳳至(地ホ-1)災害対策工事(工事期間:R7.4.10~R8.3.13)

林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室

R7.5.26現在の施工内容：排土工ほか



被災状況 令和6年9月25日現在



応急対策実施状況 令和7年3月17日現在



排土作業状況 令和7年5月26日現在



応急対策実施状況 令和7年3月17日現在




排土作業状況 令和7年5月26日現在



排土作業状況 令和7年4月24日現在

工事施工箇所 令和6年9月25日現在

⑪_鳳至(ホ-1)施設災害対策工事(R7.6.12入札予定)

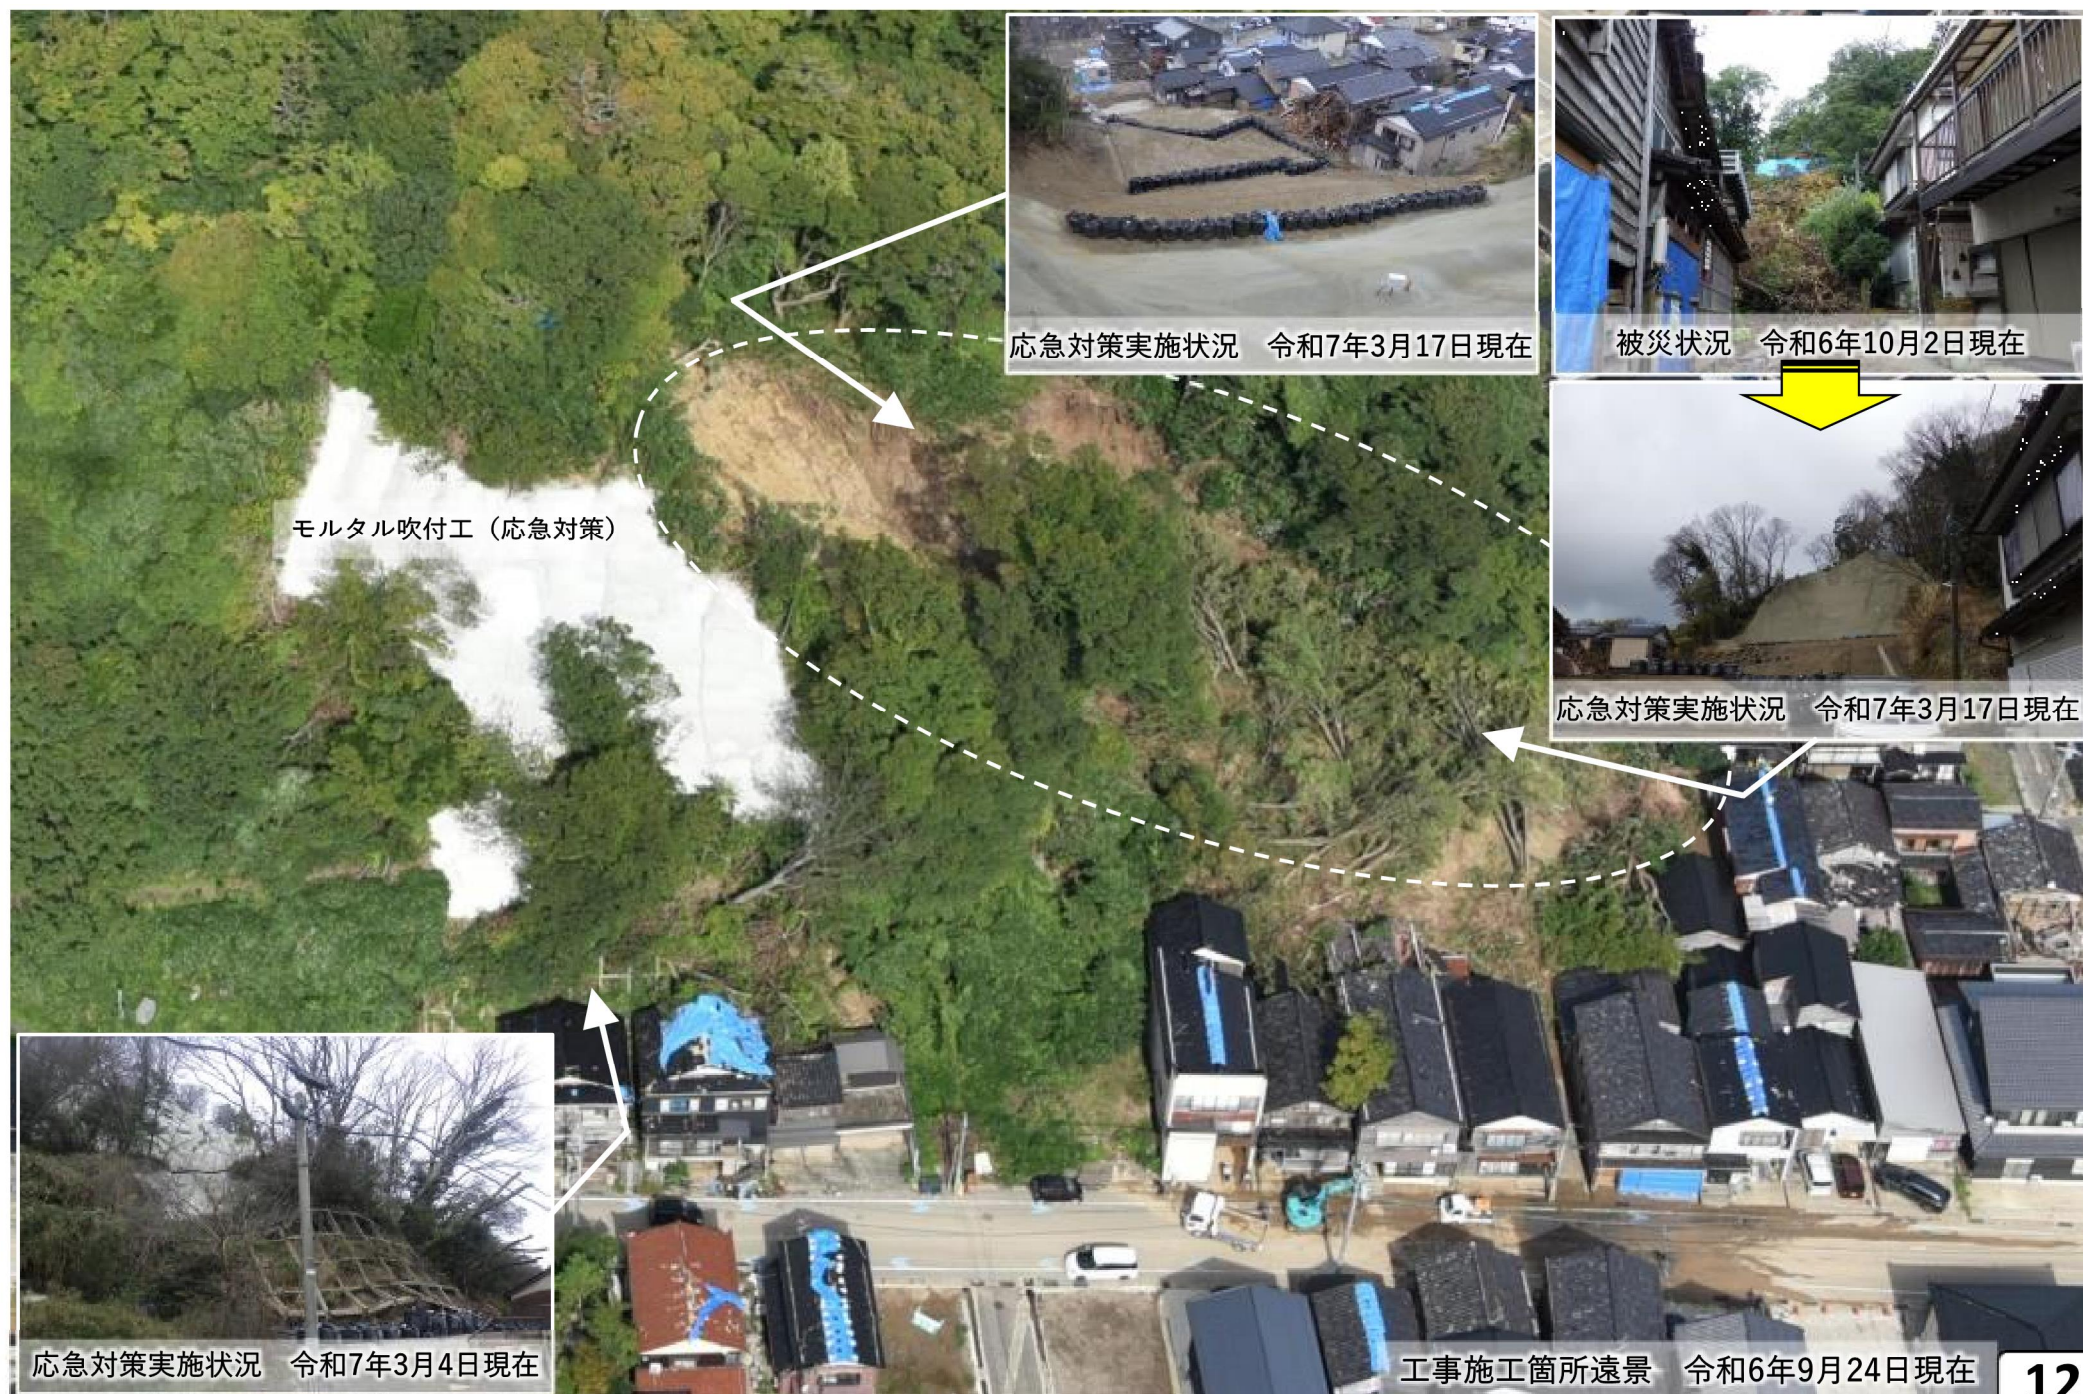

⑫_興徳寺施設災害対策工事(工事期間:R6.11.28~R7.11.28)



林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室

R7.5.26現在の施工内容：溪間工床堀作業ほか

下流域集落・田畑

ご迷惑をおかけします
治山ダム工事を行っています
工事名 興徳寺施設災害対策工事
工事場所 石川県輪島市三井町興徳寺
工事期間 令和6年11月28日
至 令和7年11月28日
受注者 株式会社 山崎組
電話 076-256-7314
現場代理人 北村 潤二
発注者 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
電話 076-261-7191
間伐材・合法材利用推進工事
間伐材・合法材・換植可能な樹種を証明した
木材を
工事看板

流出土砂捕捉

応急対策実施状況 令和7年4月1日現在

溪流荒廃状況 令和6年2月26日現在

河床整理状況 令和7年4月1日現在

溪流荒廃状況 令和6年4月24日現在

河床整理・作業道作設状況 令和7年4月22日現在

溪間工施工箇所 床堀作業状況 令和7年5月26日現在

工事施工箇所遠景 令和7年4月1日現在

⑬_興徳寺(ホ-4)災害対策工事(工事期間:R7.3.25~R8.3.13)



被災状況 令和6年7月19日現在(応急対策実施前)



R7.5.26現在の施工内容:作業道作設ほか

山腹工施工予定箇所(鋼製土留工ほか)



工事看板



被災状況 令和6年10月18日現在



応急対策実施状況 令和7年3月26日現在



作業道作設状況 令和7年5月26日現在

工事施工箇所遠景 令和7年4月1日現在

