

○復旧状況

大型かご枠流路工 完成 (R7.5月)



完成 (R7.5月)



凡 例	
	既設
	R 6 施工箇所
	次年度以降計画

五百瀬工区(2号地)

○概要

場所：十津川村三浦

崩壊地面積：4.35ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年9月7日から

令和7年5月9日まで


令和7年5月9日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。

また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置

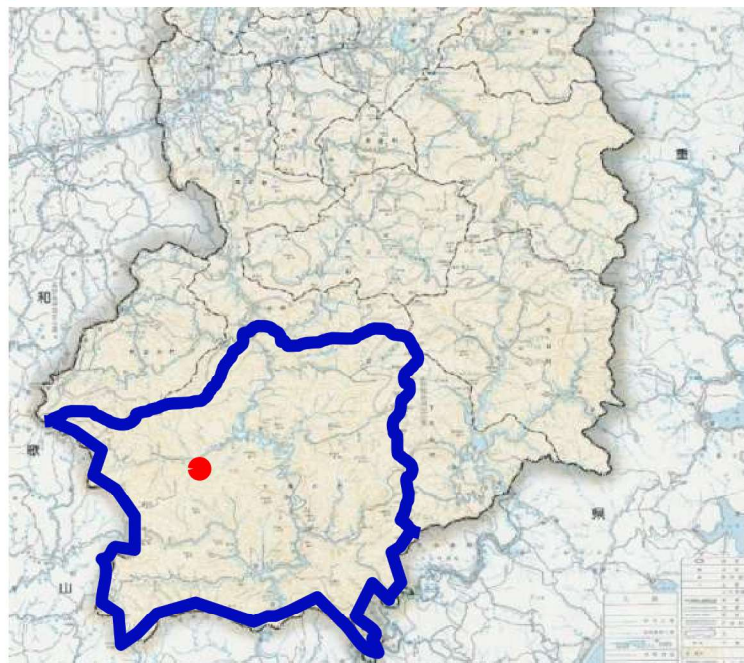

令和7年6月現在

濁谷工区

〇概要

場所：十津川村宇宮原

崩壊地面積：16.5ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年6月15日から
令和7年6月4日まで
令和7年6月4日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

〇位置



〇復旧状況



凡 例	
	既設
	R6 施工箇所
	次年度以降計画

R6 施工箇所 土留工・流路工



完成 (R7.6月)



内野工区

○概要

場所：十津川内野
 崩壊地面積：4.79ha
 主要工種：谷止工、山腹工
 工期：令和6年6月8日から
 令和7年3月7日まで
令和7年2月28日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



R6施工箇所
 ソイル注入マット伏工
 かご枠土留工



令和7年3月現在

凡 例	
■	既設
■	R6施工箇所
■	次年度以降計画

完成 (R7.3月)



野尻工区

○概要

場所：十津川村野尻

崩壊地面積：20.44ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 6年 4月24日から

令和 7年 3月 7日まで

令和 7年 3月 7日完成


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

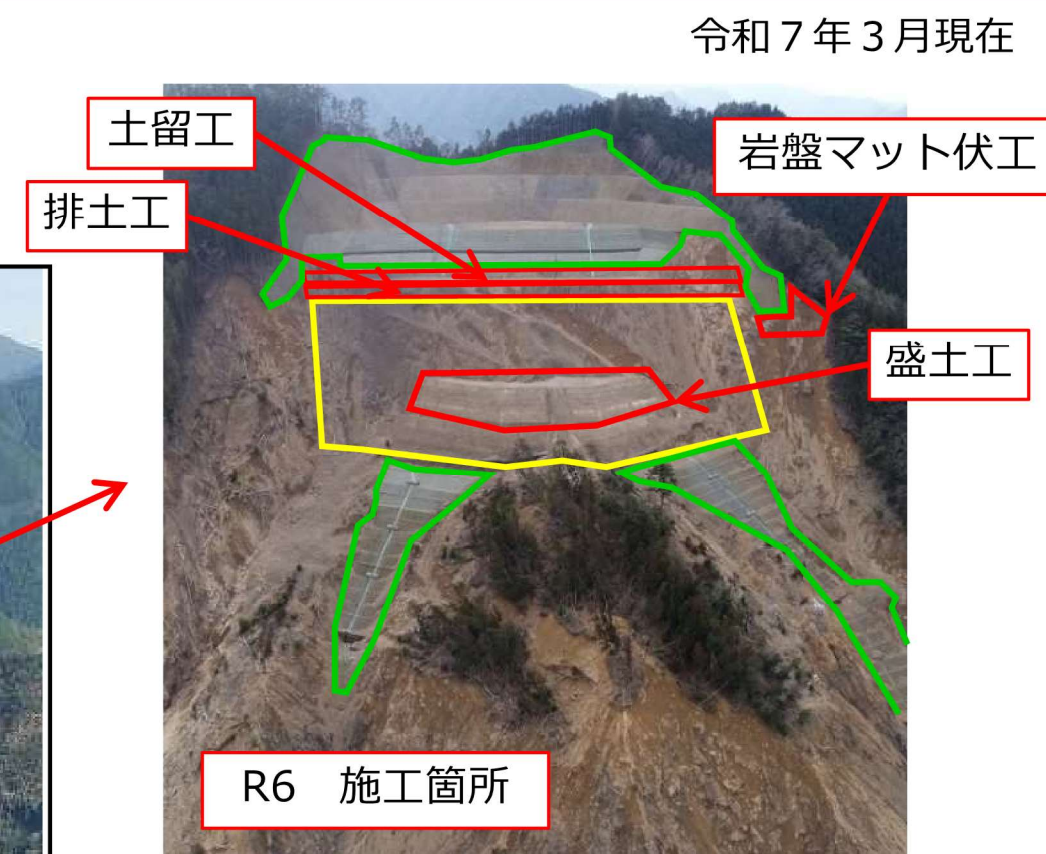

令和7年3月現在

令和7年3月現在

山崎谷工区(2号地)

〇概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年7月4日から
令和7年3月7日まで
令和7年3月7日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

〇位置



〇復旧状況



山腹崩壊の状況

R6施工
簡易吹付法砕工



完成 (R7.3月)

流路工 完成 (R7.3月)



コンクリート谷止工 完成 (R7.3月)

凡 例	
	既設
	R 6 施工箇所
	次年度以降計画

令和7年3月現在

長殿(テラ谷)工区

○概要

場所：十津川村長殿

崩壊地面積：2.75ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年5月30日から
令和7年3月7日まで
令和7年2月28日完成


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。


○位置



○復旧状況

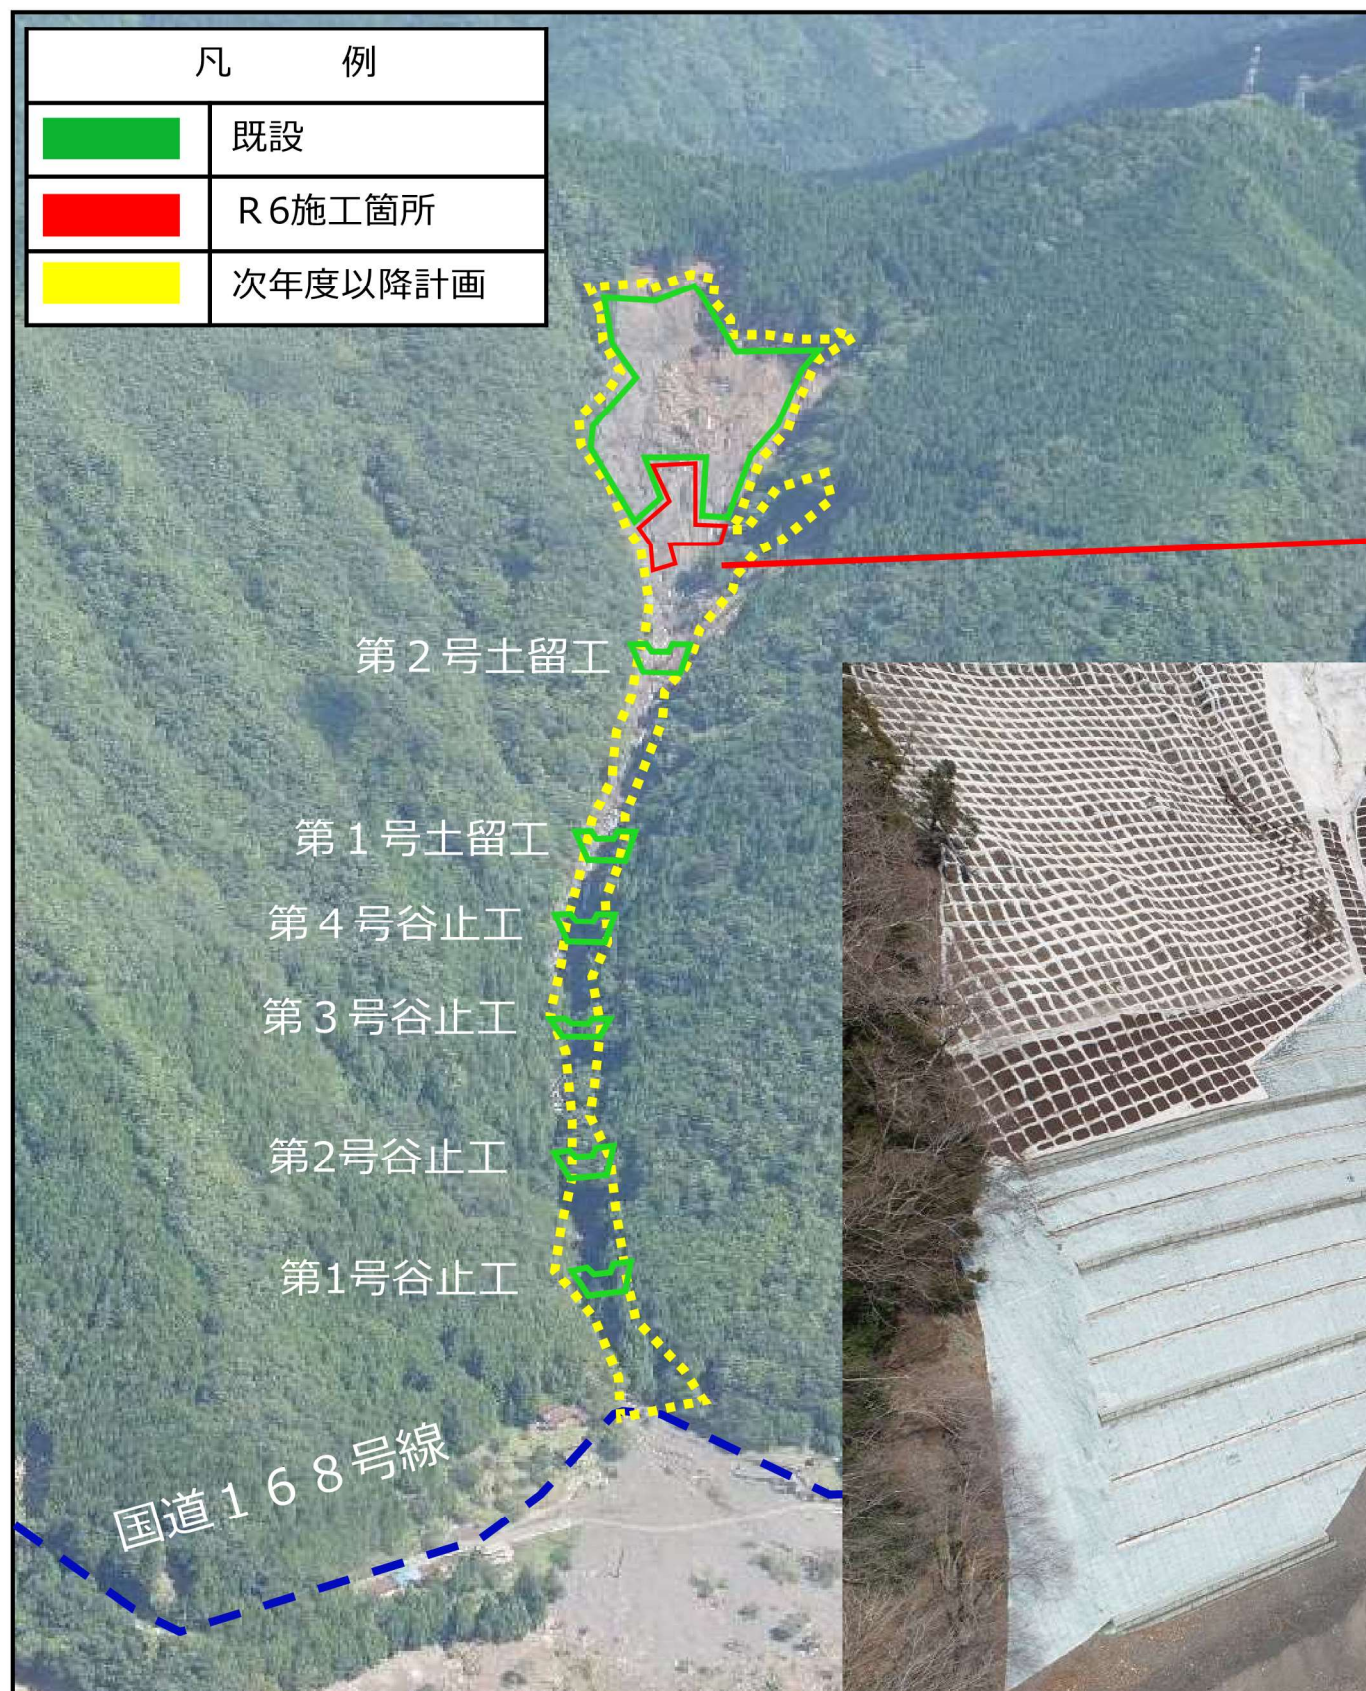

R6施工箇所
簡易法枠吹付工・植生マット伏工・土留工 3基

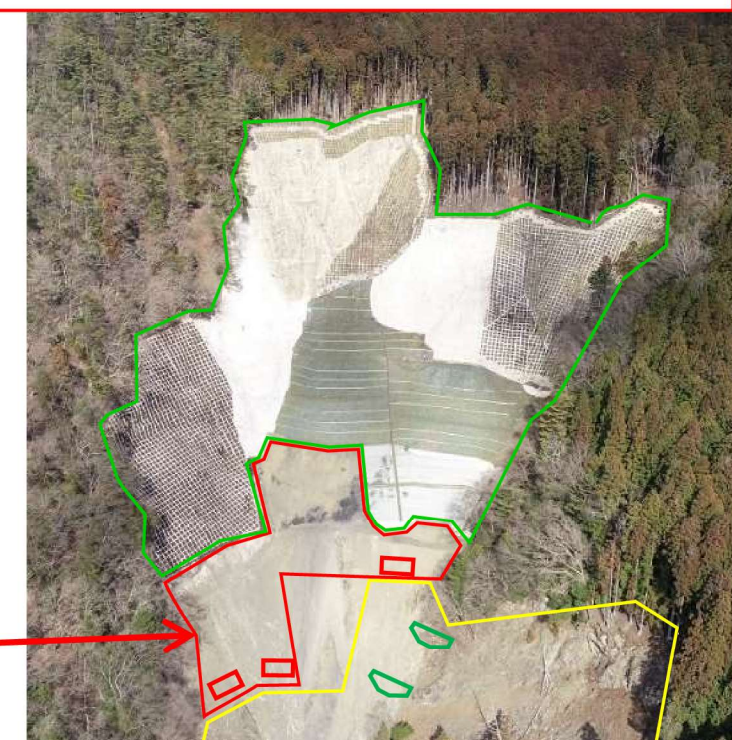

今西工区

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha
主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 6年10月11日から
令和 7年 8月29日まで
令和 7年 8月29日完成


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況

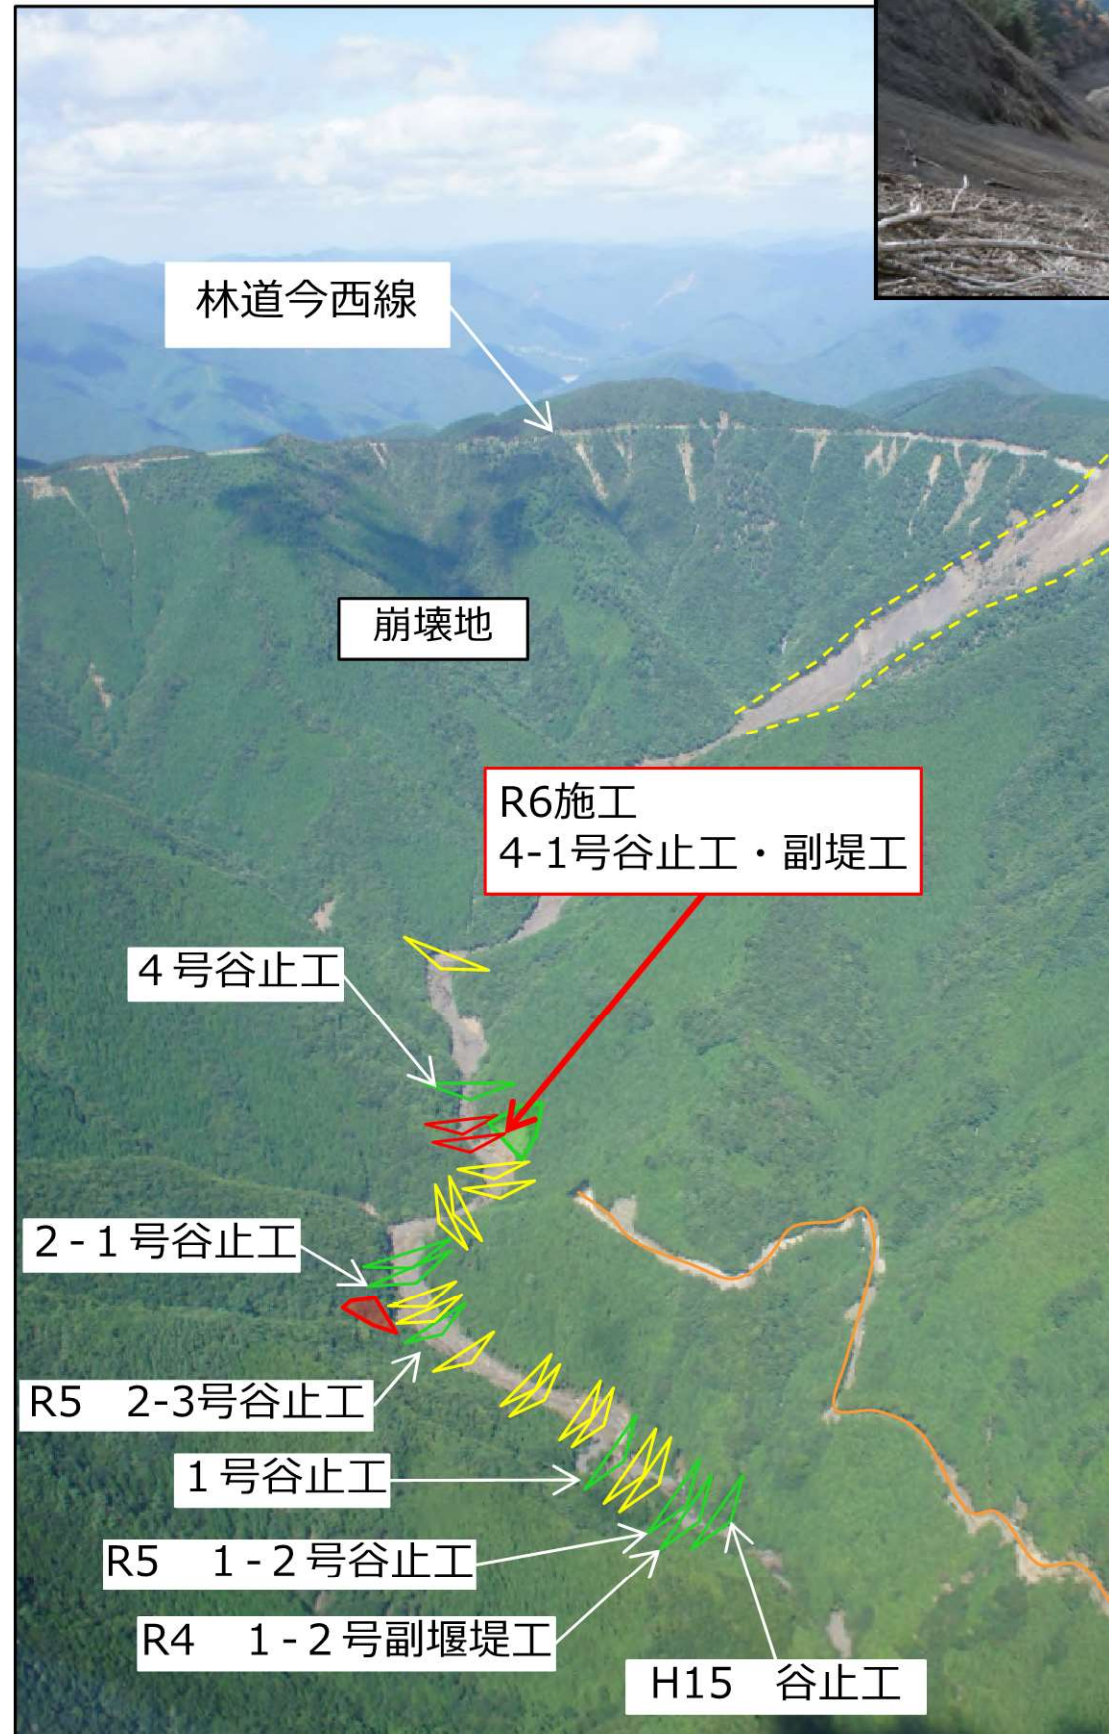

令和7年8月現在

凡 例	
	既設
	R6施工箇所
	次年度以降計画

