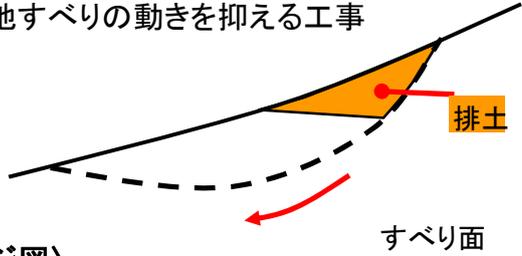


実施箇所	取組状況
<p>①国道342号線祭時集落への迂回路</p>  <p>桂沢迂回路緑化完了(10月10日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・地震により孤立化した祭時(まつるべ)地区につながる国道342号線の迂回路として国有林野内の林道(桂沢林道・東桂沢林道・板川林道)を緊急整備(6月24日より暫定供用・供用終了の11月30日までに関係者や住民の車両3,995台が通行) ・7月24日に発生した岩手県沿岸北部地震による土砂崩壊について、27日に復旧工事を完了し、7月28日(月)より暫定供用が再開されました。 ・8月24日に板川林道に発生した土砂崩れ箇所については、26日に保守点検が終了し、27日から供用が再開されました。 ・10月10日 桂沢迂回路の緑化完了 <p>※現在は一般車両の通行はできません。</p> <p style="text-align: center;">工事完了</p>
<p>②市野々原地区(磐井川)</p>  <p>事業箇所への仮設道路</p>   <p>(4月10日 工事状況)</p>	<p>【警戒避難支援対策】 伸縮計6基設置</p> <p style="text-align: center;">設置済→降雪期のため撤去</p> <p>【応急対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・亀裂に雨水が浸透するのを防止するため、ブルーシートにより地表を被覆 ・流木による二次災害を防ぐため、倒木等进行处理 ・事業箇所への仮設道路の作設 <p style="text-align: center;">工事完了</p> <p>【復旧対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月19日 民有林直轄地すべり防止災害関連緊急事業採択 ・7月4日 実施設計調査に着手 ・12月18日 工事着手(排土工) ・2月17日 工事公告(排土工、杭打工) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>※排土工: 地すべり頭部の土を取り除くことにより、地すべり自体の重みを減らし、地すべりの動きを抑える工事</p>  <p style="text-align: center;">すべり面</p> <p>〈排土イメージ図〉</p>

実施箇所	取組状況
<p>③磐井川地区〔民有林〕</p>	<p>【復旧対策】 (ニゴリ沢Ⅰ地区 溪間対策施設の復旧対策) ・9月12日 民有林直轄治山施設災害復旧事業採択 ・10月20日 実施設計業務着手 ・3月13日 工事着手(コンクリート谷止工) 工事中</p> <p>(ニゴリ沢Ⅱ地区 地すべり防止施設の復旧対策) ・9月12日 民有林直轄治山施設災害復旧事業採択 ・10月20日 実施設計業務着手 ・3月13日 工事着手(集水井工) 工事中</p>
<p>④磐井川地区 上流</p>  <p>東桂沢 工事状況(セメントミルク注入)</p>  <p>東桂沢 工事状況(H鋼建込)</p>	<p>【警戒避難支援対策】 ・土石流センサー1基設置</p> <p>設置済</p> <p>【復旧対策】 (東桂沢 山腹斜面の復旧対策) ・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月3日 実施設計調査に着手 ・10月29日 工事着手(山腹工) ・2月5日 工事公告(山腹工) ・2月9日 工事公告(鋼製枠床固工) ・2月17日 工事公告(山腹工) ・3月10日 工事完了(山腹工)</p> <p>工事完了</p> <p>(桂沢 土砂流出抑制対策) ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月13日 工事着手(コンクリート谷止工) 工事中</p> <p>(一ツ石沢 土砂流出抑制対策) ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月4日 工事着手(コンクリート谷止工) 工事中</p> <p>(鬼頭沢 土砂流出抑制対策) ・8月8日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・9月9日 実施設計調査に着手 ・2月26日 工事着手(コンクリート谷止工) 工事中</p> <p>(湯尻沢 土砂流出抑制対策) ・8月8日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・9月9日 実施設計調査に着手 ・3月5日 工事着手(コンクリート谷止工) 工事中</p>

実施箇所	取組状況
<p>⑤産女川地区(磐井川)</p>  <p>コンクリート谷止工 工事状況</p>  <p>産女川上流監視カメラ画像(4月24日14:20) セルダム:4月21日頃に発生した土石流を捕捉し効果を発揮しました。</p>	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土石流センサー3基設置 ・監視カメラ2機設置 ・クラック発生箇所に伸縮計3基設置 ※冬期間も観測可能 <p style="text-align: center;">設置済</p> <p>【復旧対策】 (産女川上流 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月3日 実施設計調査に着手 ・8月28日 工事着手(セルダム) ・3月20日 工事完了 <p style="text-align: right;">工事完了</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1月23日 工事着手(コンクリート谷止工) <p style="text-align: right;">工事中</p>
<p>⑥産女川地区(磐井川)[民有林]</p>  <p>産女川治山ダム 施設被害状況</p>	<p>【復旧対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月12日 民有林直轄治山施設災害復旧事業採択 ・10月18日 実施設計調査に着手 ・2月17日 工事公告(補修、嵩上げ)
<p>⑦胆沢川地区</p>  <p>無人バックホウによる河道閉塞対策工事</p>	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土石流センサー2基設置 (尿前川・大寒沢) <p style="text-align: center;">設置済</p> <p>【応急対策】 (尿前川地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月8日 尿前川地区において、河道確保及びカゴ砕工に着手 ・7月22日 無人バックホウを搬入 ・7月23日 無人バックホウにより河道閉塞箇所までの道路補修に着手 ・7月25日 無人バックホウによる河道閉塞対策工事に着手 ・7月29日 カゴ砕工床掘作業に着手 ・8月8日 無人バックホウによる河道開削終了 ・8月25日 カゴ砕工 工事終了 <p style="text-align: right;">工事完了</p>

実施箇所	取組状況
<p>⑦胆沢川地区(つづき)</p>  <p>尿前川 河道開削工事終了後</p>  <p>尿前川 カゴ枠工完成(8月25日)</p>	<p>【復旧対策】</p> <p>(尿前沢 地すべり対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山施設災害関連復旧事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月15日 工事着手(集水井工) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(荒沢 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月14日 工事着手(集水井工) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(前川Ⅰ・Ⅱ 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月5日 工事着手(コンクリート谷止工)Ⅰ ・3月12日 工事着手(コンクリート谷止工)Ⅱ <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(大寒沢 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月5日 工事着手(コンクリート谷止工) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(北沢 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月15日 工事着手(コンクリート谷止工) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(ナガドロ沢 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8月8日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・9月9日 実施設計調査に着手 ・2月26日 工事着手(山腹工) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(大沢 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8月8日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・9月9日 実施設計調査に着手 ・2月26日 工事着手(コンクリート谷止工) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(尿前沢 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山施設災害復旧事業採択 ・8月7日 実施設計調査に着手 ・3月15日 工事着手(コンクリート谷止工嵩上げ) <p style="text-align: right;">工事中</p> <p>(尿前沢 土砂流出抑制対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山施設災害復旧事業採択 ・8月7日 実施設計調査に着手 ・12月7日 工事着手(鋼製谷止工) ・3月20日 工事完了 <p style="text-align: right;">工事完了</p>
<p>⑧衣川地区</p> 	<p>(月山 山腹崩壊地の復旧対策)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月25日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・8月6日 実施設計調査に着手 ・3月5日 工事着手(山腹工) <p style="text-align: right;">工事中</p>

実施箇所	取組状況
<p>⑩現地調査等の結果</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・磐井川・産女川・胆沢川 各地区に設置した土石流センサー、監視カメラからの情報では、現地の異状は確認されていません。(3月13日12:00現在) ・市野々原・磐井川・産女川・胆沢川・衣川の各地区の現地調査(3月12日)を実施しましたが、前回に比べ、被害の拡大は確認されませんでした。 ・12月20日 第8回山地災害対策検討会を開催しました。 市野々原地区地すべりについての対策を含め、岩手・宮城内陸地震による山地災害に係る治山計画のとりまとめが行われました。 ※山地災害対策検討会の資料等については、東北森林管理局のホームページ (http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/koho/saigaijoho/kyoku/kentokai/index.html)をご覧ください。
<p>⑪安全管理体制</p>  <p style="text-align: center;">安全対策協議会(4月10日)</p>	<p>【岩手南部森林管理署管内震災現場安全対策協議会】 復旧工事現場の連絡・調整及び安全衛生活動を実施するため、流域ごとに請負業者による安全対策協議会を設立。(5流域) ・4月10日 全体会議及び分科会開催</p>
