


平成28年台風被害に係る新冠町における災害事業実施箇所【日高南部森林管理署】




平成28年台風被害に係る新冠町における災害事業進捗状況【日高南部署：牧野の沢】

工事名： 牧野の沢災害関連緊急事業
場所： 新冠郡新冠町字美宇 日高南部森林管理署2110林班
工期： 平成29年 3月 3日 ~ 平成29年11月20日
主な工事内容： コンクリート谷止工 2基
受注者： 株式会社 笹田組
進捗： 平成29年 4月中旬に現場作業に着手。
 現場作業については平成29年9月中旬完了。

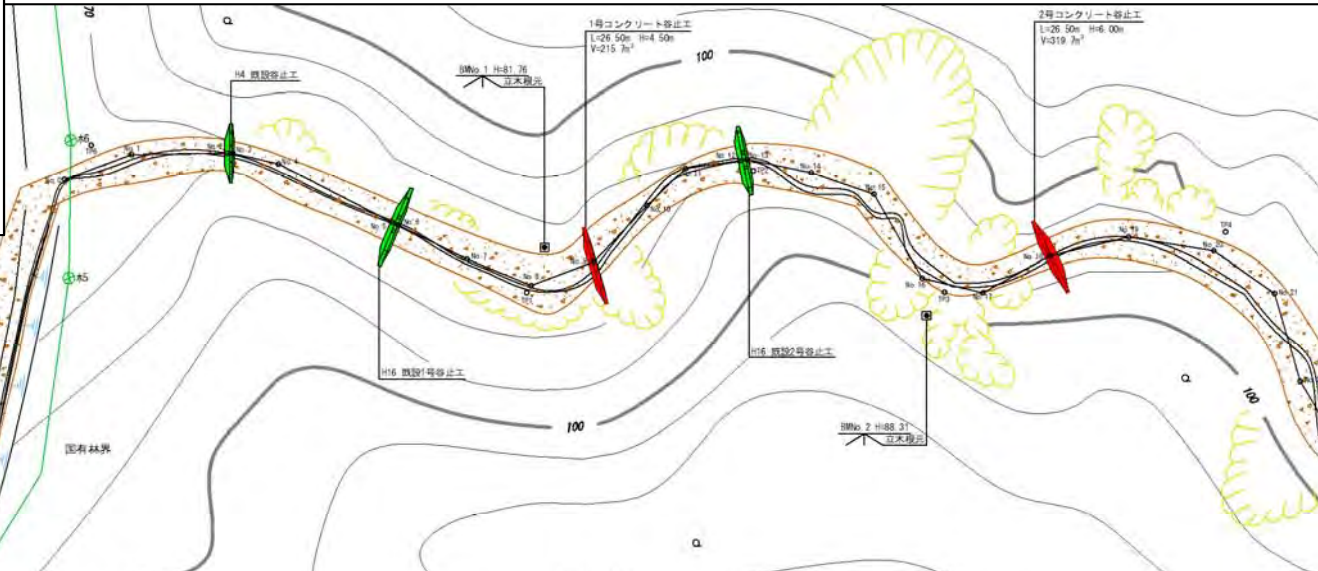

被災状況

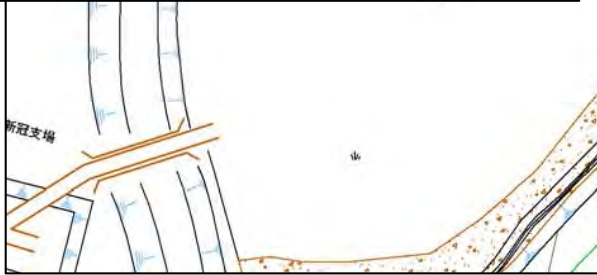


1号：計画



2号：計画



被災状況

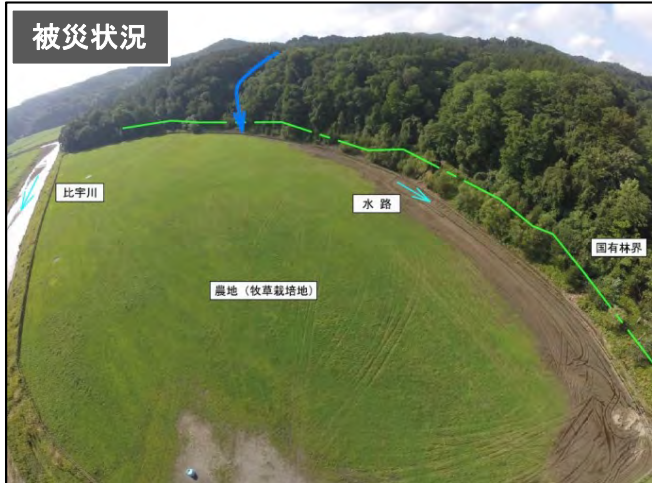

1号：施工状況（H29.09.11現在）



2号：施工状況（H29.06.20現在）

