



平成28年台風被害に係る新冠町における災害事業進捗状況【日高南部署：平山の沢】

工事名：平山の沢災害関連緊急事業
場所：新冠郡新冠町字美宇 日高南部森林管理署2077林班
工期：平成29年 3月 4日 ~ 平成29年11月20日
主な工事内容：コンクリート谷止工 2基、床固工 1基
受注者：株式会社 賀集建設
進捗：平成29年 5月上旬に現場作業に着手。
 現場作業については平成29年11月上旬完了。

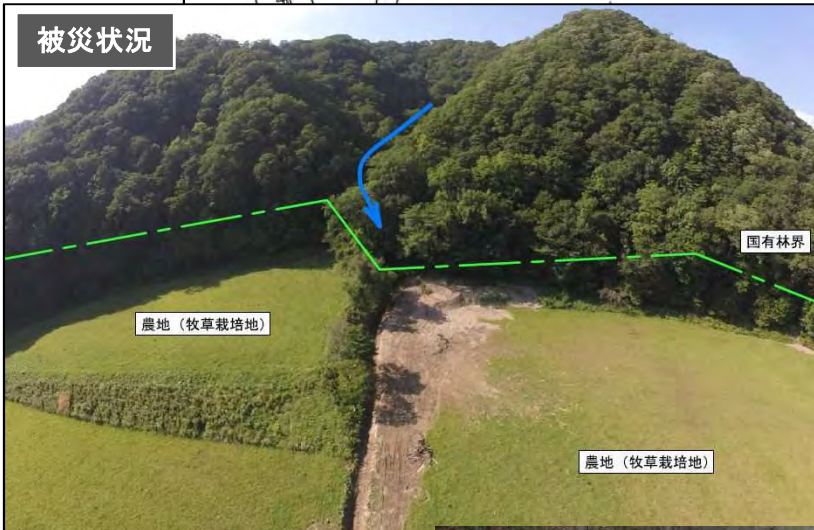

1号：施工状況 (H29.11.07現在)

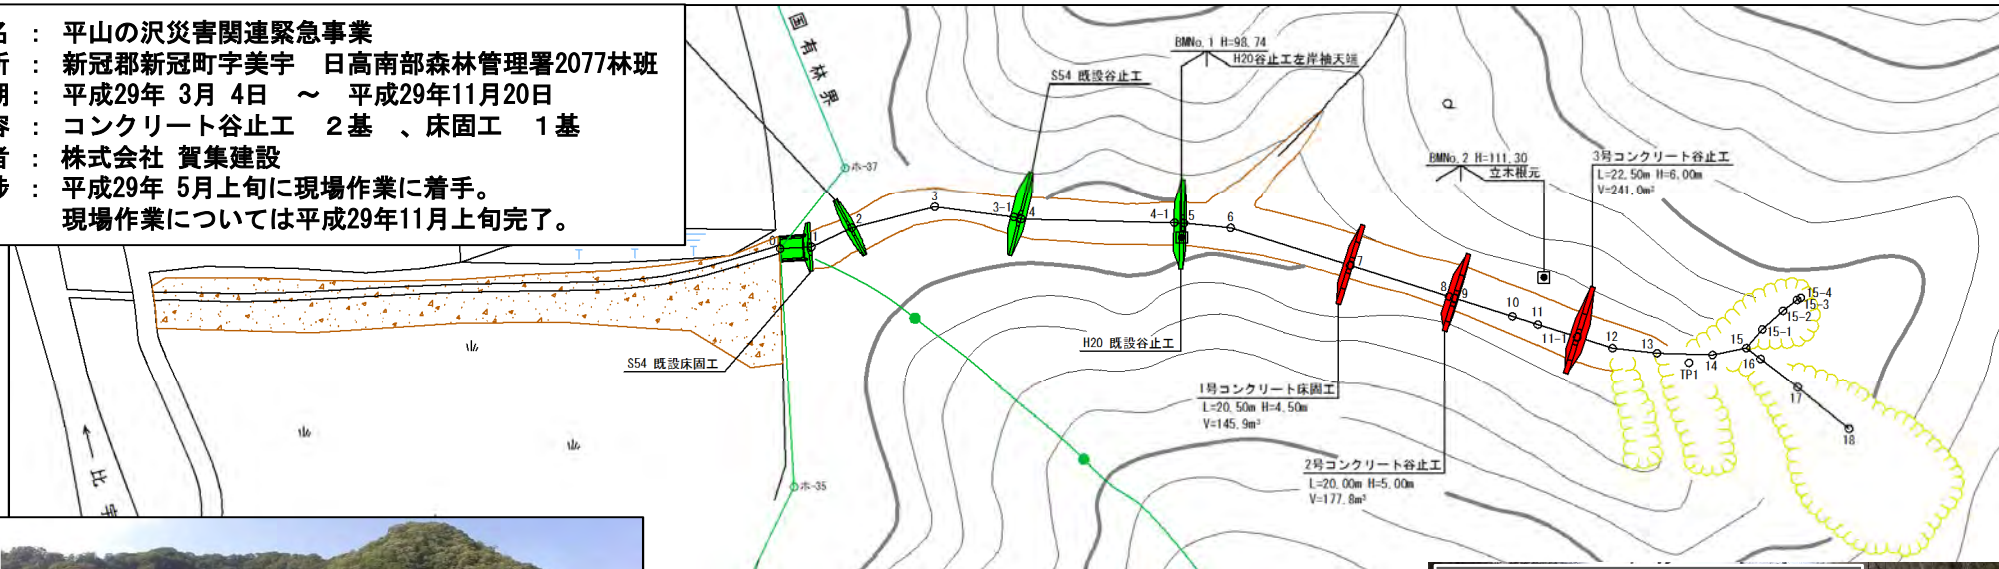

2号：施工状況 (H29.11.07現在)



3号：施工状況 (H29.08.31現在)

