

平成28年台風等被害に係る美瑛町における災害事業実施箇所【上川中部森林管理署】



平成28年台風等被害に係る美瑛町における災害事業進捗状況【上川中部署：石ノ沢】


工事名：石ノ沢災害関連緊急事業
場所：上川郡美瑛町町白金 上川中部森林管理署1068・1069林班
工期：平成29年 3月10日 ~ 平成30年3月20日
主な工事内容：コンクリート床固工 5基
受注者：浜塚建設株式会社
進捗：平成29年 6月下旬に現場作業に着手。
 現場工事は平成29年11月中旬に完了。

その他：道道十勝岳美瑛線水楽橋復旧工事を施工中

被災状況



被災状況

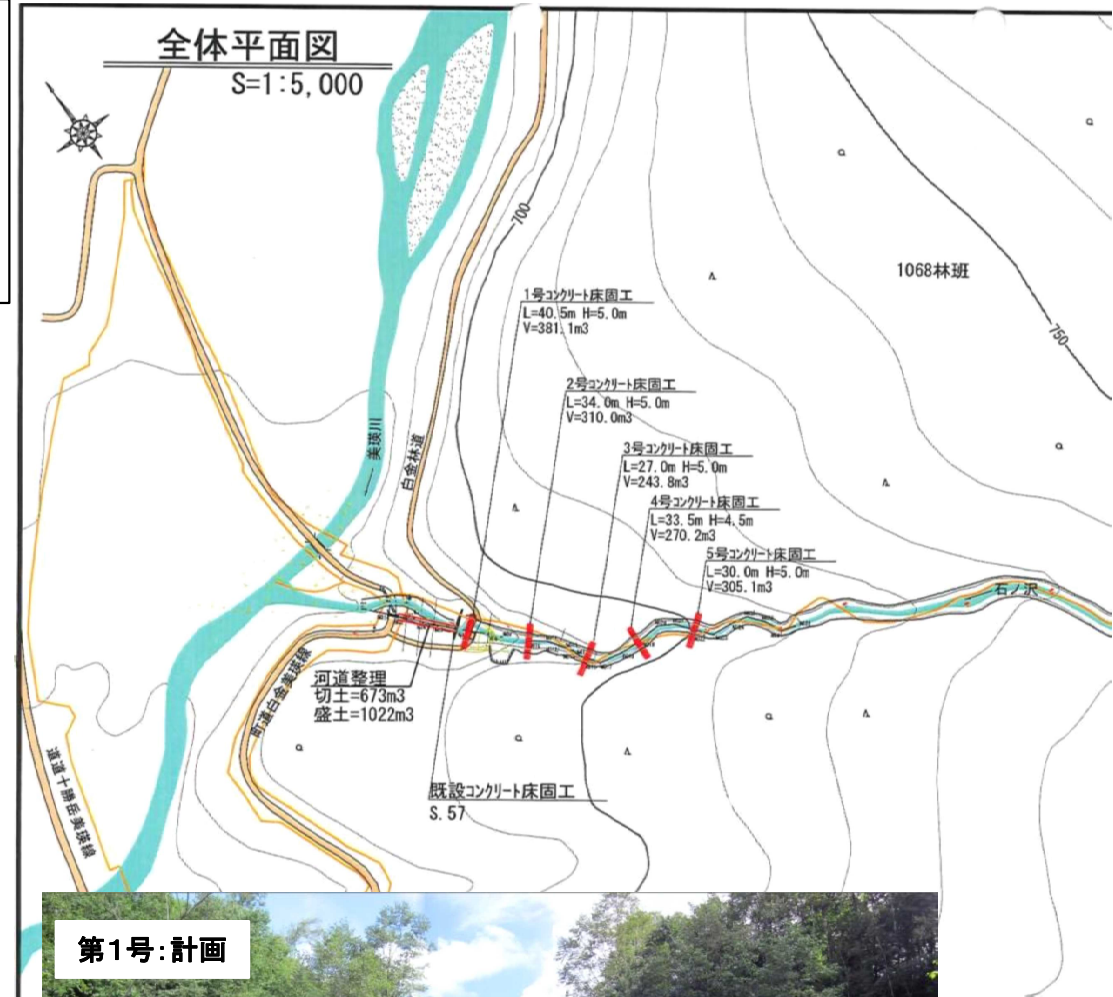

第1号:計画



平成28年台風等被害に係る美瑛町における災害事業進捗状況【上川中部署：石ノ沢】

第1号床固工施工状況(H29.11.10現在)



第3号床固工施工状況(H29.11.10現在)



第4号床固工施工状況(H29.11.10現在)



第5号床固工施工状況(H29.11.10現在)

