


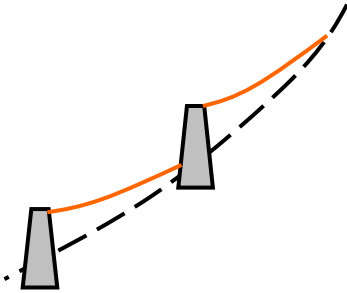


実施箇所	これまでの取組状況
<p>①花山湖上流</p>  <p>小川原地区 実施設計調査業務状況</p>  <p>※点線は元の斜面 傾斜が緩やかになり、土砂が安定する。</p> <p>〈土留エイメージ図〉</p>	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土石流センサー1基設置 ・7月14日調整終了 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">設置済</div> <p>【応急・復旧対策】</p> <p>(一迫川地区(小川原地区) 崩落土砂流出防止対策(土留工))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月1日より実施設計調査に着手 <p>(一迫川地区(河原小屋沢) 溪間対策(治山ダム))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月27日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月4日より実施設計調査に着手 <p>(一迫川地区(湯ノ倉上流) 溪間対策(治山ダム))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月2日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月11日より実施設計調査に着手 <p>《今後の予定》</p> <p>(一迫川地区(小川原地区))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計後、土留工に着手予定 ※土留工:崩壊斜面の表土を動かさないようにすることで、崩壊の拡大を防止する工事 <p>(一迫川地区(河原小屋沢))</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計後、工事用作業道の整備に着手予定
<p>②花山湖上流(民有林)</p>  <p>温湯地区被害状況</p>	<p>(温湯地区・浅布地区・本軽井沢地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月4日 民有林直轄治山災害関連緊急事業採択 <p>《今後の予定》</p> <p>(温湯地区・浅布地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計後、大型土のう工に着手予定
<p>③国道398号線へ接続する林道の緊急整備</p> 	<p>・被災した国道398号線の緊急復旧工事のための資材運搬路として、鎌内国有林林道を緊急に整備(18日より緊急車両(工事車両)通行中)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;">工事完了</div>

実施箇所	これまでの取組状況
<p>④荒砥沢ダム上流</p>  <p>荒砥沢ダム監視カメラ画像(7月17日 15:50)</p>  <p>排水工事用作業道整備(7月4日)</p>	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土石流センサー2基・傾斜計1基設置 設置済 ・監視カメラ1機設置 <p>・7月15日より地すべり伸縮計・雨量計による観測を実施</p> <p>【応急・復旧対策】</p> <p>(二迫川地区 地すべり地内の排水工事)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月23日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月1日より工事現場までの作業道整備開始 ・7月5日より排水工事に着手 <p>(バックホウ2台、14人体制、排水工事用作業道の整備)</p> <p>(二迫川地区 ダム上流部の地すべり調査)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月27日 国有林野内直轄治山災害関連緊急事業採択 ・7月3日より地すべり調査に着手
<p>⑤荒砥沢ダム上流(民有林)</p>	<p>(耕英地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月4日 民有林直轄治山災害関連緊急事業採択 <p>《今後の予定》</p> <p>(耕英地区)</p> <p>実施設計後、資材運搬路工事に着手予定</p>
<p>⑥(市道)馬場駒の湯線の整備</p> 	<p>荒砥沢ダム上流部の復旧対策のほか、孤立化した集落(栗原市耕英地区)への通行確保にも資する(市道)馬場駒の湯線の崩土を除去(国有林に接する部分の崩土除去を6月22日完了)</p> <p style="text-align: center;">工事完了</p>
<p>⑦栗駒ダム上流</p>  <p>放森地区(7月10日)</p>	<p>【警戒避難支援対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土石流センサー1基設置(駒の湯温泉搜索現場の安全対策) <p style="text-align: center;">設置済</p> <p>【応急・復旧対策】</p> <p>(放森地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・7月4日 応急対策として大型土のう積工に着手 ・7月10日 国有林側への据付完了(330個) ・7月15日 県道沿いの据付完了(120個) 工事完了

実施箇所	これまでの取組状況
<p>⑧栗駒ダム上流(民有林)</p>	<p>(日影森地区・洞万地区) ・7月4日 民有林直轄治山災害関連緊急事業採択</p> <p>《今後の予定》 (洞万地区) 実施設計後、大型土のう工に着手予定</p>
<p>⑨県道築館栗駒公園線(行者滝周辺)</p> 	<p>【応急・復旧対策】 ・流木による二次災害を防ぐため、行者滝周辺の倒木等処理</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>工事完了</p> </div>
<p>⑩林道の復旧事業</p>  <p>被災した林道の現況(マダラ沢林道)</p>	<p>【応急・復旧対策】 ・7月8日 国有林林道3路線の林道施設災害復旧事業採択(揚石林道、マダラ沢林道、山王林道)</p>
<p>現地調査等の結果</p>  <p>腰抜沢と大地沢の合流点付近の様子(水は流れている模様)</p>	<p>○栗駒ダム上流・荒砥沢ダム上流・花山湖上流に設置した土石流センサー、監視カメラからの情報では、現地の異常は確認されていません。(7月16日14:00現在)</p> <p>○河原小屋沢・相ノ沢及び湯浜温泉下流域の現地調査(7月14～15日)を実施しましたが、前回に比べ、新たな山腹崩壊の発生はみられませんでした。</p> <p>○国有林の裏山対策(人家近くの国有林の被災地の応急対策)のための調査を16日までに、花山地区・栗駒地区の6箇所を実施し、崩落やクラック等の被害状況を把握しました。その結果、放森地区において大型土のう積工を実施しました。今後は必要に応じて応急対策(ブルーシート張り・簡易伸縮計設置等)を行う予定です。</p>

※ 下線部は新たな動き
