



白米千枚田(輪島市白米町)



高市総理大臣現場視察
(令和7年12月7日:珠州市 大谷区域)



ゴジラ岩(珠州市馬縹町)

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨 民有林直轄治山事業 実施状況 (令和8年度)



輪島市のキリヨ祭り




鈴木農林水産大臣現場視察
(令和7年11月1日:輪島市 興徳寺区域)



大谷町鯉のぼりフェス(珠州市大谷町)

民有林直轄治山事業箇所位置図

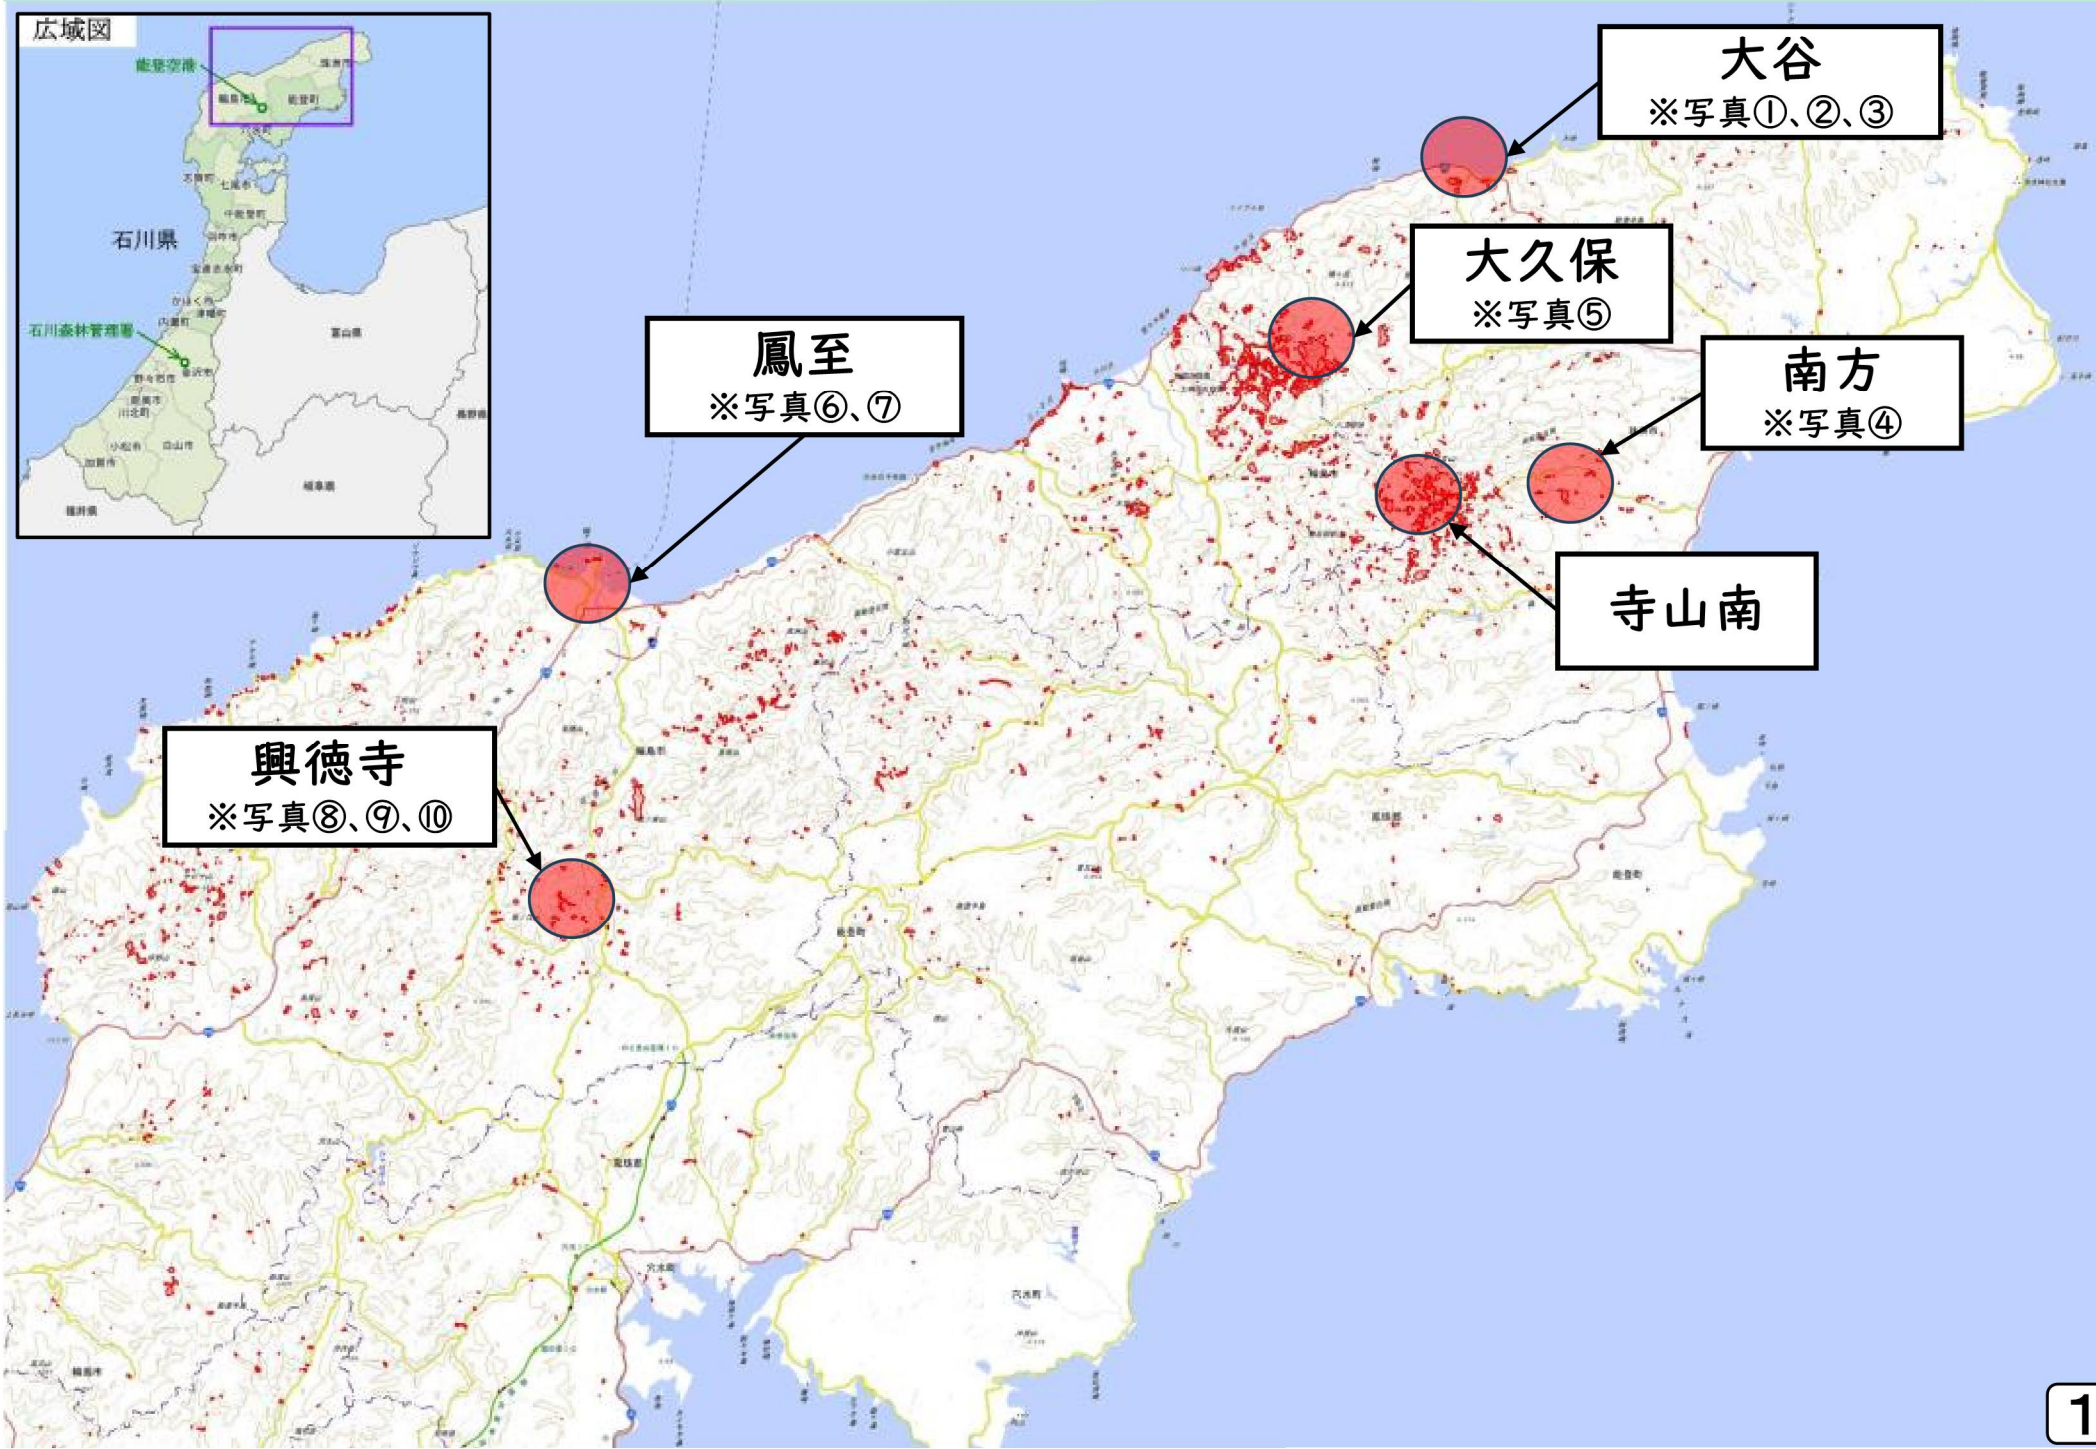



R8.4.1現在の施工内容：準備工(資材等手配ほか)



②_大谷(ホ-3)山腹工事(工事期間:R8.5~R9.3(予定))



令和7年度(完了)
山腹工(鋼製土留工ほか)



山腹工 施工状況 (R7完了)
令和8年2月20日現在

令和8年度(予定)
山腹工(水路工、筋工ほか)

令和8年度(予定)
鋼製土留工

令和8年度(予定)
土砂等撤去整理、流末処理工

工事施工箇所遠景 令和8年3月17日現在

③_大谷(ホ-5)治山工事(工事期間:R8.5~R9.3(予定))



令和7年度(完了)
山腹工(法枠工ほか)

令和8年度(予定)
鋼製谷止工

令和8年度(予定)
土砂等撤去整理、流末処理工




山腹工施工状況(R7完了)
令和8年3月5日現在

R8.4.1現在の施工内容：準備工(資材等手配ほか)



⑤_大久保溪間工事(工事期間:R8.6~R9.3(予定))

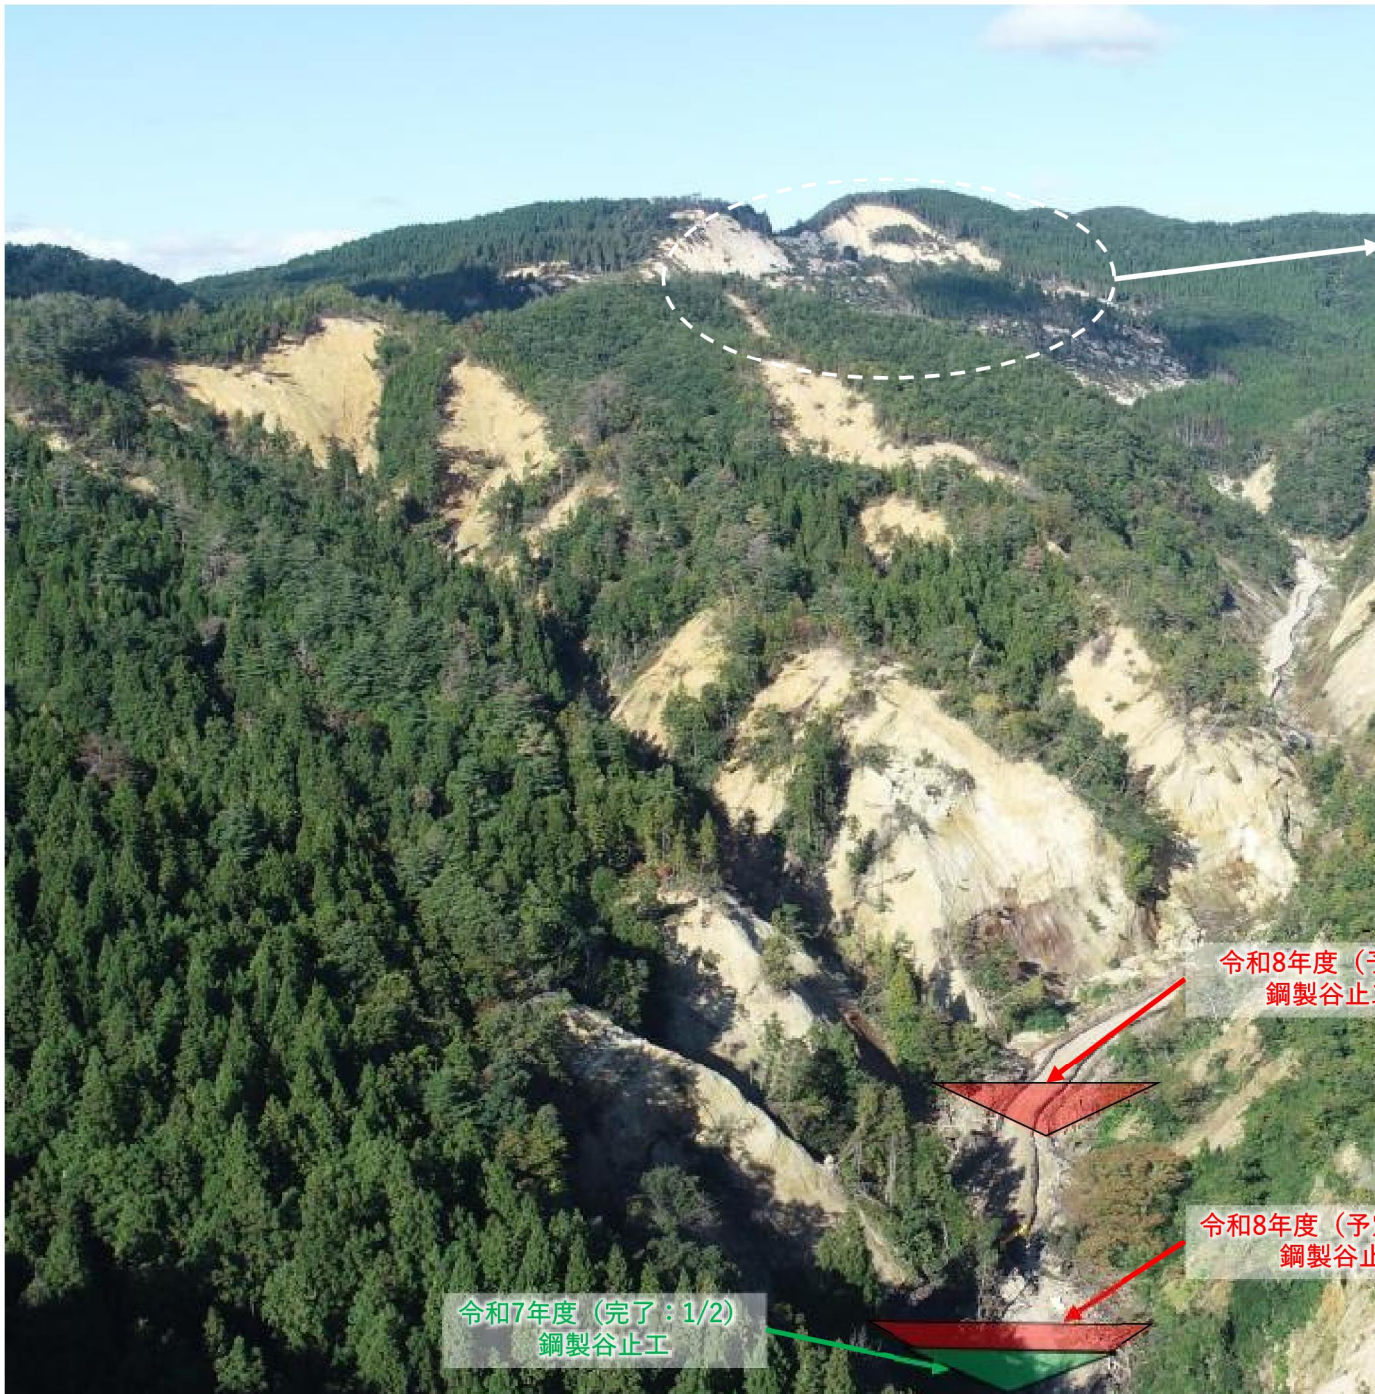

約42haの大規模崩壊地 令和6年5月29日現在



鋼製谷止工施工状況 (R7完了: 1/2)
令和8年3月18日現在

令和8年度(予定)
鋼製谷止工

令和8年度(予定: 1/2)
鋼製谷止工

令和7年度(完了: 1/2)
鋼製谷止工

工事施工箇所遠景 令和7年10月24日現在

⑥_鳳至(地ホ-1)山腹工事(工事期間:R8.3.24~R9.2.19)

R8.4.1現在の施工内容：仮設工(作業ヤード整備ほか)



⑦_鳳至(ホ-1)施設災害対策工事(工事期間:R8.4~R9.3(予定))

林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室





R8.4.1現在の施工内容：準備工(資材等手配ほか)



令和7年度(完了)
鋼製谷止工

令和8年度(予定)
鋼製谷止工

鋼製谷止工施工状況(R7完了)
令和7年12月1日現在

⑨_興徳寺(ホ-4)山腹工事(工事期間:R8.5~R9.3(予定))



令和7年度(完了)
山腹工(鋼製土留工ほか)



令和8年度(予定)
山腹工(筋工、伏工)

令和8年度(予定)
大型力ゴ棒土留工



コンクリート谷止工施工状況 (R7完了)
令和8年3月16日現在

令和7年度(完了)
コンクリート谷止工

令和8年度(予定)
流路工

令和8年度(予定)
土砂等撤去整理
