

平成26年広島豪雨災害の発生箇所における治山工事の状況について
(平成28年5月28日時点)



<凡例> 災害①・・・災害復旧事業予算により実施している箇所

災害⑦（犬戻鳴山B地区）の実施状況について

H28,5,28現在

被災した当初の状況



谷止工完成状況(平成28年5月11日現在)



犬戻鳴山B地区災害復旧工事

契約日:平成27年4月14日

工期:平成27年4月15日～平成28年6月30日

工事の進捗状況(5月28日現在)

谷止工本堤は完成
土砂整理、後片付けを施工中

工事規模(土石流対策型)
L=63.0m H=14.0m V=4784.9m³

災害⑧（犬戻鳴山A地区（谷止工））の実施状況について H28,5,28現在



犬戻鳴山A地区災害復旧工事(谷止工箇所)

契約日:平成27年4月13日

工 期:平成27年4月14日～平成28年6月30日

工事の進捗状況(5月28日現在)

谷止工本堤は完成
土砂整理、後片付けを施工中



災害⑨（犬戻鳴山A地区（山腹工））の実施状況について H28,5,28現在


被災した当初の状況



施工状況



復旧計画 山腹工 完成状況

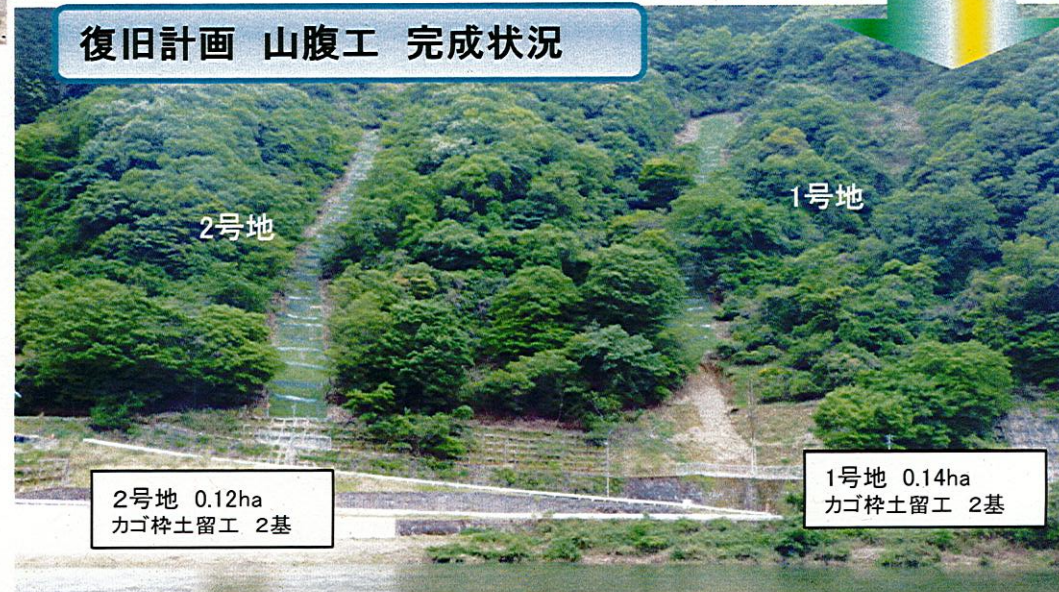

犬戻鳴山A地区災害復旧工事(山腹工箇所)

<本体工事完了>

契約日:平成27年4月13日

工期:平成27年4月14日～平成28年6月30日

工事の進捗状況(5月28日現在)

山腹工 1号地・2号地とも完成
(谷止工箇所が完成すれば検査を実施します)

2号地 0.12ha
カゴ枠土留工 2基

1号地 0.14ha
カゴ枠土留工 2基
