


東北森林管理局では、津波に対して根返りを起こしにくい健全な海岸防災林を再生するため、生育基盤となる盛土の造成に平成23年度から着手しており、生育基盤造成が完了したところから順次植栽工を実施しております。

1 復興工程表（平成27年4月版）

	H23			H24			H25			H26			H27			H28			H29			H30
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	以降
応急対策	市町村策定の復興計画等を踏まえ、防潮堤等の復旧・海岸防災林の造成のための盛土・植栽等を実施																					
施工準備	『今後、海岸防災林の復旧・再生は、林帯地盤等の復旧が完成した箇所から順次、植栽を実施。全体の復旧は、平成23年度から概ね10年間で完了することを目指す。』																					

2 工事進捗状況（平成28年3月末現在）

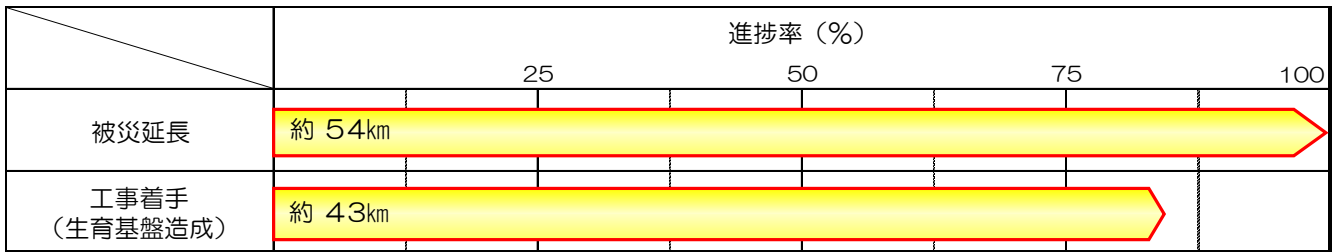

3 被災した海岸防災林の復旧工程



被災した海岸防災林



生育基盤盛土造成



防風柵等設置




植栽

根の健全な成長を促すため、地下水位から2~3mの地盤高を確保する盛土を実施

海岸に吹く強い風から苗木等を保護するため防風柵等を設置

仙台 (生育基盤盛土工及び植栽工を実施中)

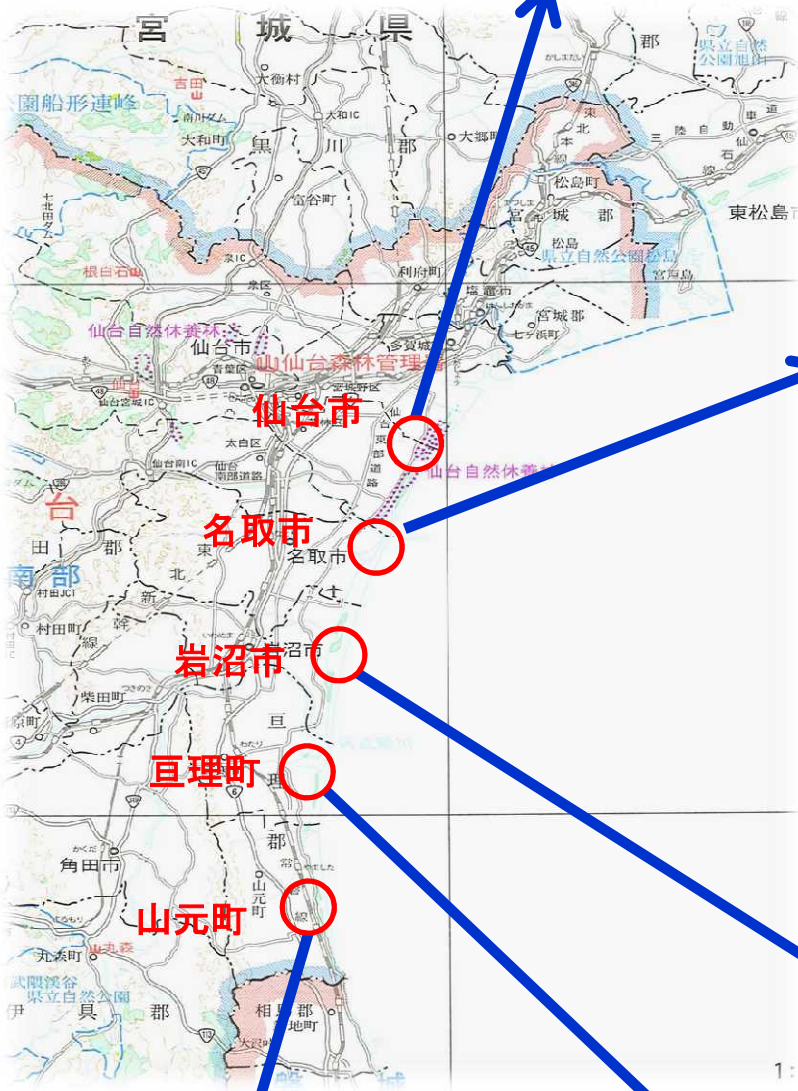

名取 (生育基盤盛土工及び植栽工を実施中)



岩沼 (生育基盤盛土工及び植栽工を実施中)



山元 (生育基盤盛土工及び植栽工を実施中)



亶理 (生育基盤盛土工及び植栽工を実施中)




海岸防災林再生事業の進捗状況

がんばろう！東北

(三沢海岸 ～ 東松島)



三沢海岸(植栽工実施中)

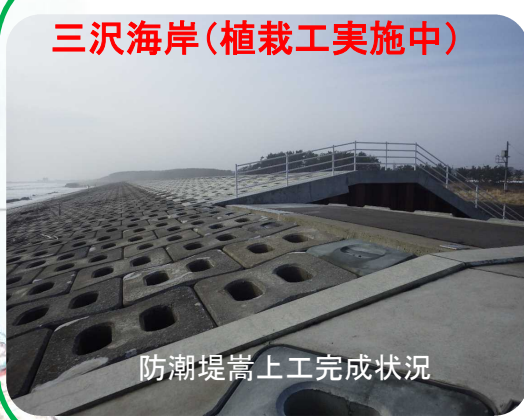

矢本地区(植栽工施工予定)

