


平成30年度 日高町における流木対策（治山事業）の実施状況【日高北部森林管理署】



平成30年度 日高町における流木対策（治山事業）の実施状況【右五の沢】

工事名：右五の沢治山工事
場所：沙流郡日高町字千栄 日高北部森林管理署61林班
工期：平成30年 4月27日 ~ 平成30年12月25日
主な工事内容：コンクリート谷止工 1基
副ダム 1基
受注者：丸彦渡辺建設株式会社
完了：平成30年10月下旬に完了。

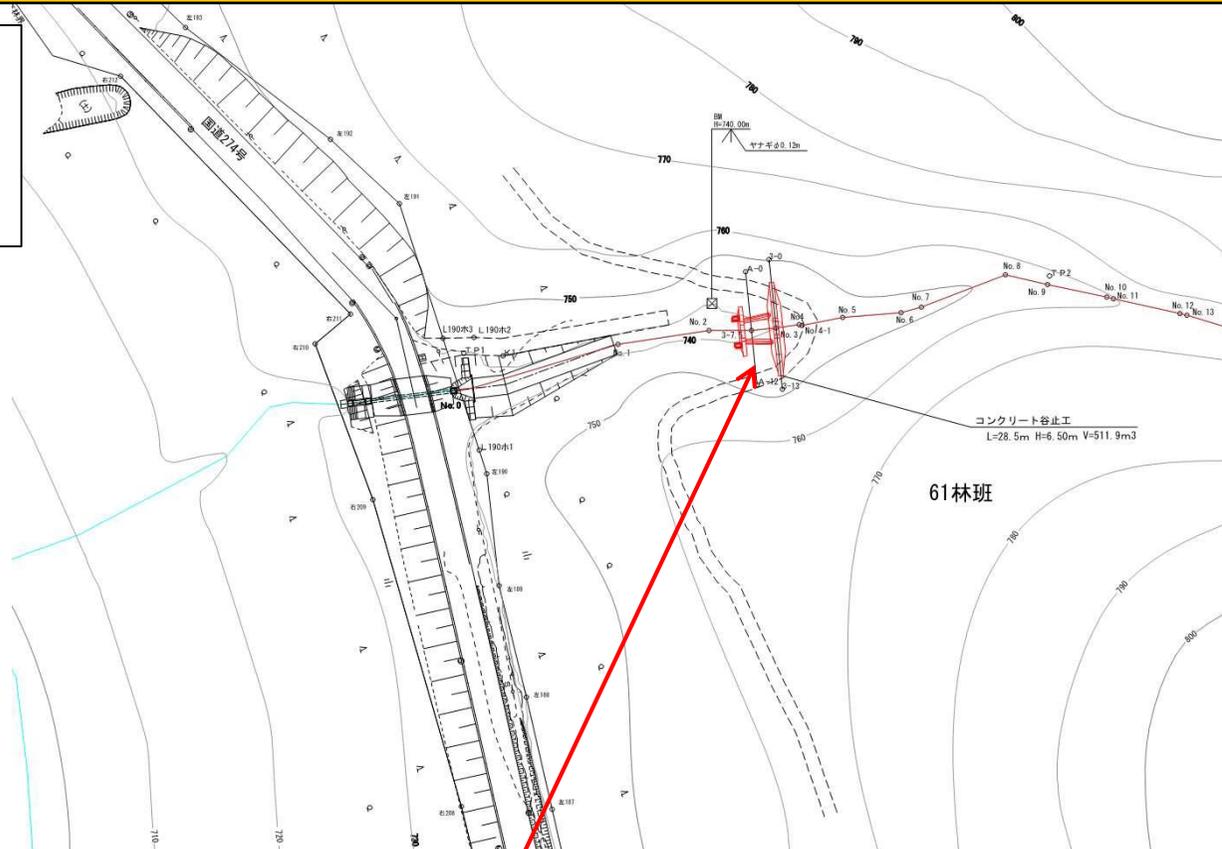

被災状況

右五の沢




第1号:計画



第1号:完成

平成30年度 日高町における流木対策（治山事業）の実施状況【喜代次沢】

工事名：喜代次沢治山工事
場所：沙流郡日高町字千栄 日高北部森林管理署62・64林班
工期：平成30年 4月27日 ~ 平成30年3月12日
主な工事内容：1号コンクリート床固工 1基（鋼製スリット）
：2号コンクリート谷止工 1基
受注者：日成建設株式会社
完了：平成30年11月下旬に完了。

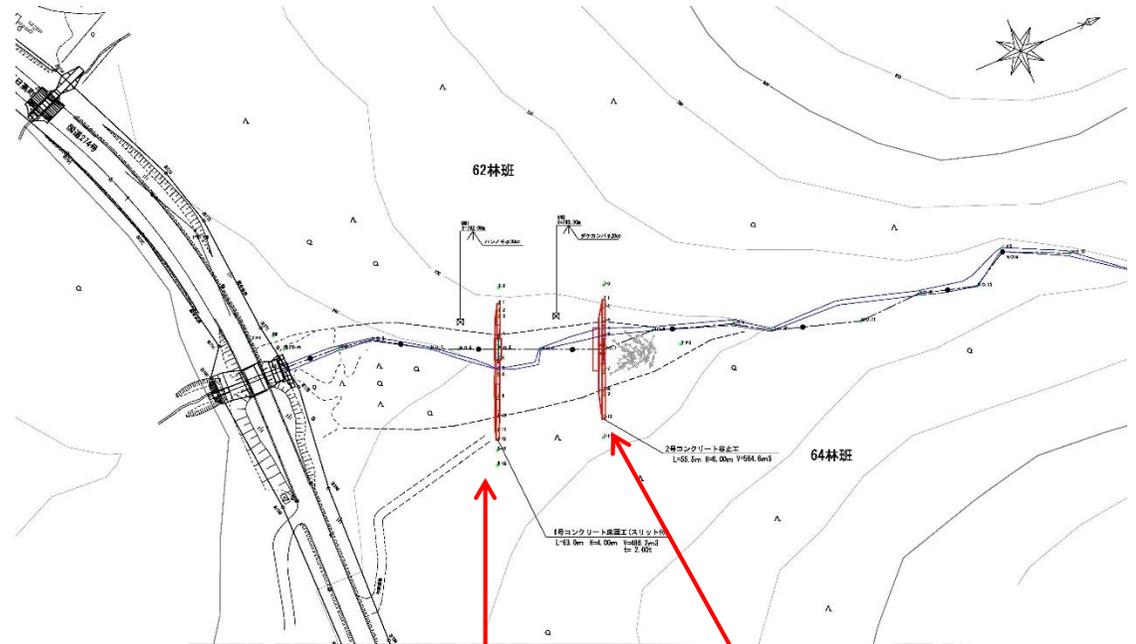


被災状況



喜代次沢

第1号、2号 計画

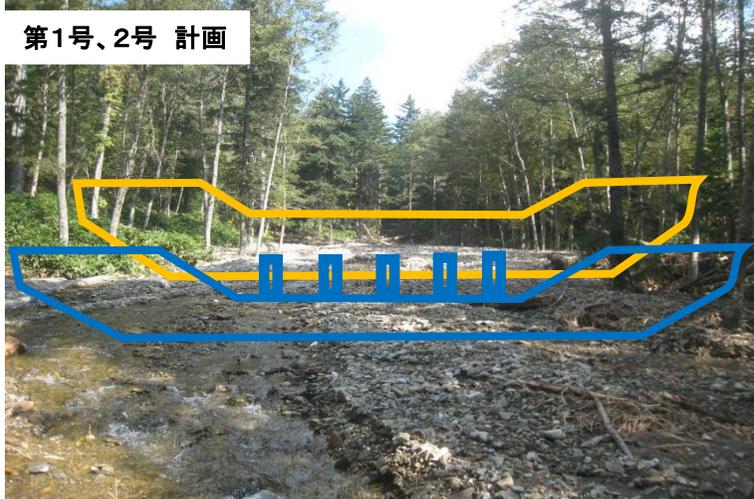

第2号 完成



第1号 完成

平成30年度 平取町における流木対策（治山事業）の実施状況【水源の沢（7の沢）】

工事名： 水源の沢（7の沢） 治山工事
場所： 沙流郡平取町字旭 日高北部森林管理署1228林班
工期： 平成30年 3月13日 ～ 平成30年11月30日
主な工事内容： コンクリート谷止工 2基
受注者： 株式会社 五十嵐工業
進捗： 11月2日 完成

被災状況



全景



2号谷止工

1号谷止工

H9施工 谷止工



1号谷止工 完成



2号谷止工 完成
