

今西地区

○復旧状況

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：6.62ha


主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成26年6月24日から
平成27年3月20日まで
平成27年2月10日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と土留工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置

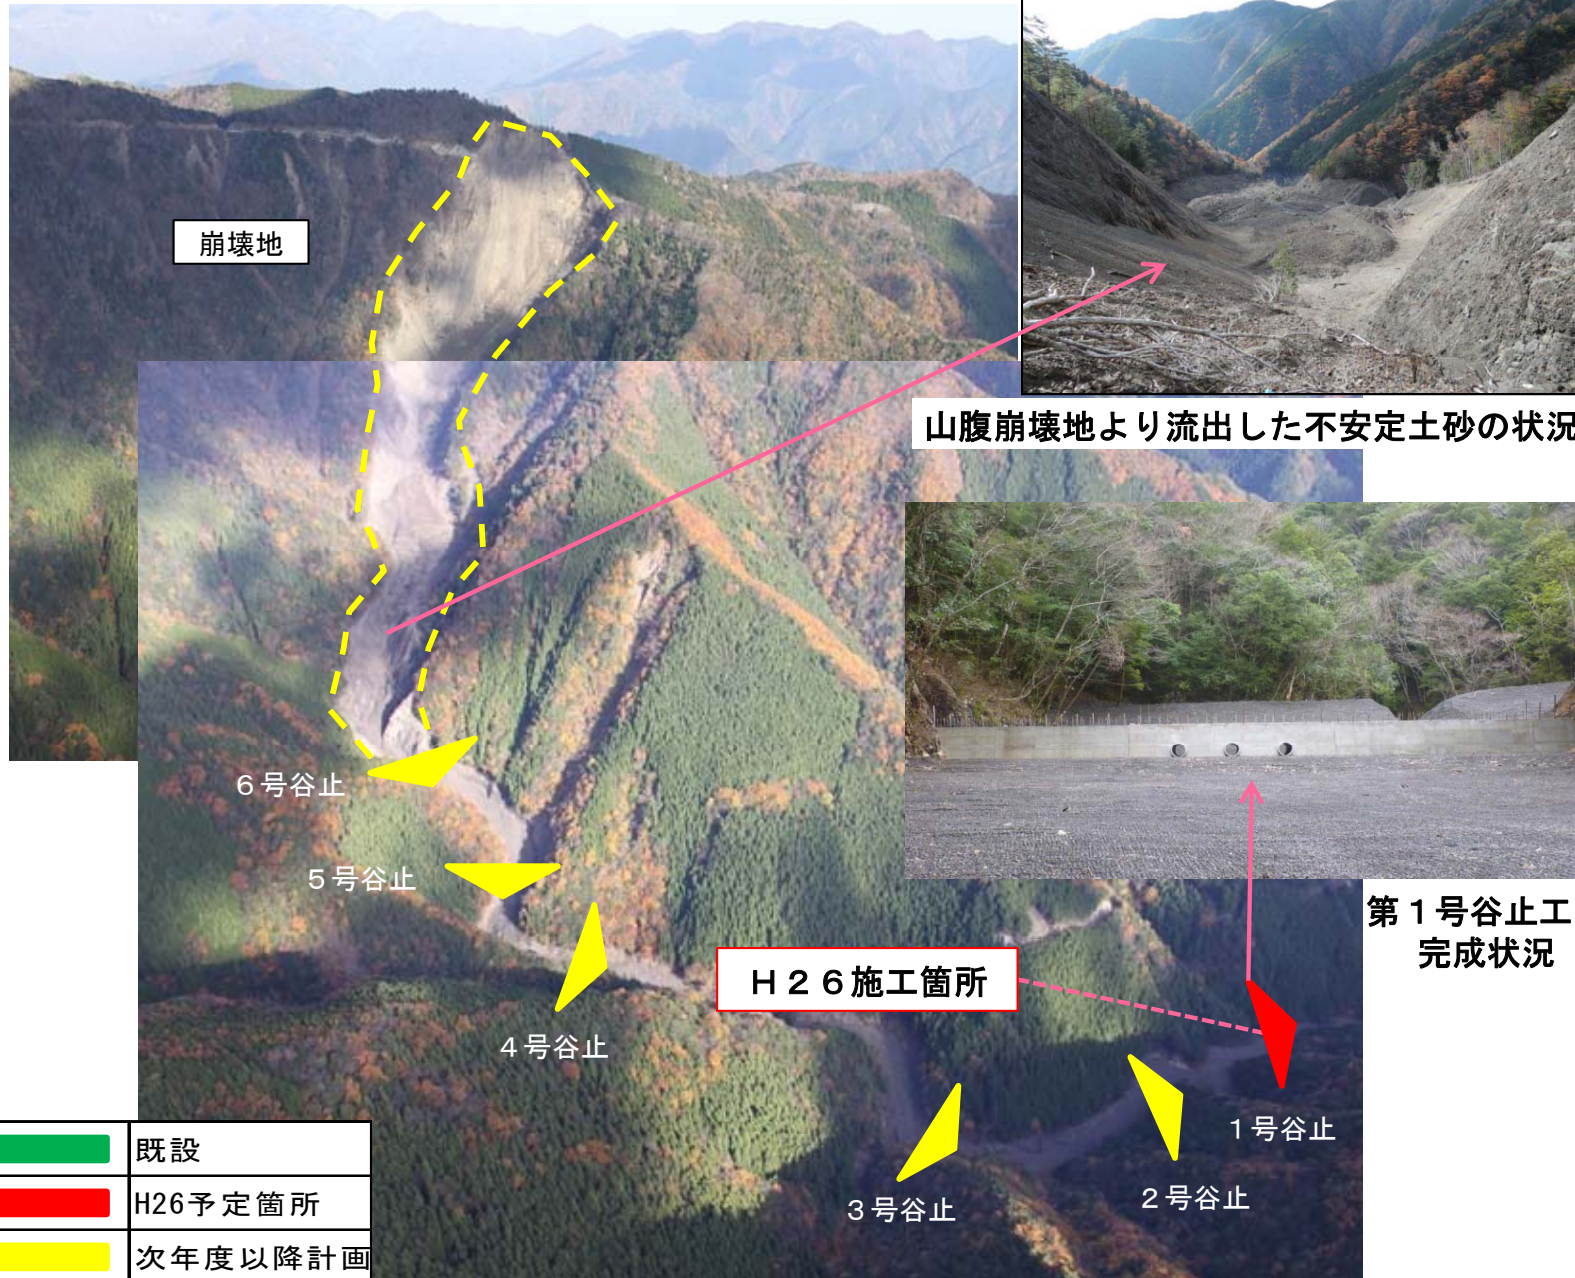

■	既設
■	H26予定箇所
■	次年度以降計画
