

長殿(テラ谷)地区

○概要

場所：十津川村長殿

崩壊地面積：2.75ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成26年 3月25日から
平成26年12月15日まで
平成26年12月26日完成

概要


山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況

凡 例	
	既設
	H26予定箇所
	次年度以降計画

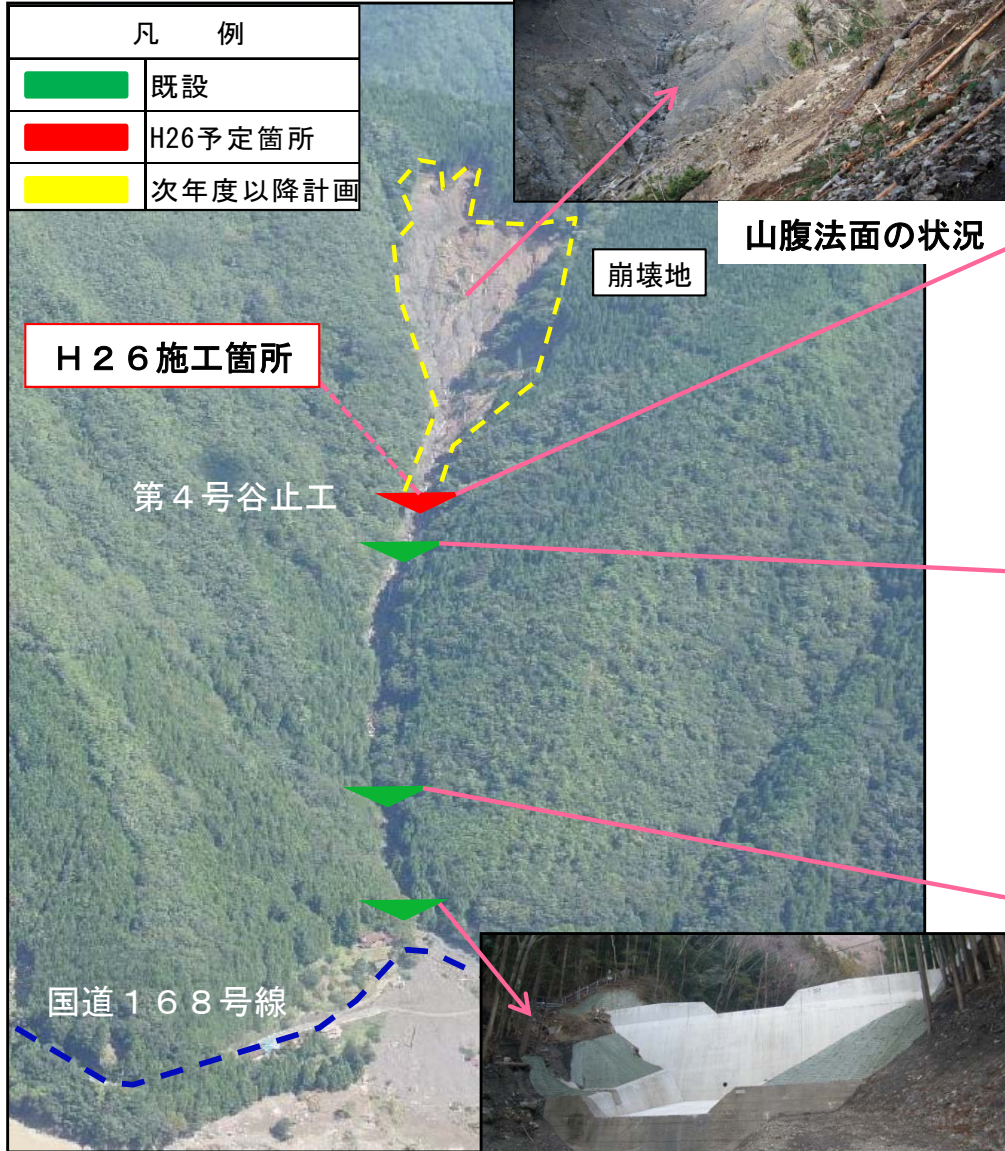

第1号谷止工 完成状況

第2号谷止工 完成状況
