

現場だより ～町田河内山治山工事～

H29年12月版


下記の写真は11月の現場の施工状況です。法面にネット（金網）を張る作業を行いました。下流部では治山ダム作成のため土砂の掘取り（掘削）を行いました。

12月の工事予定

金網張り完了



施工イメージ

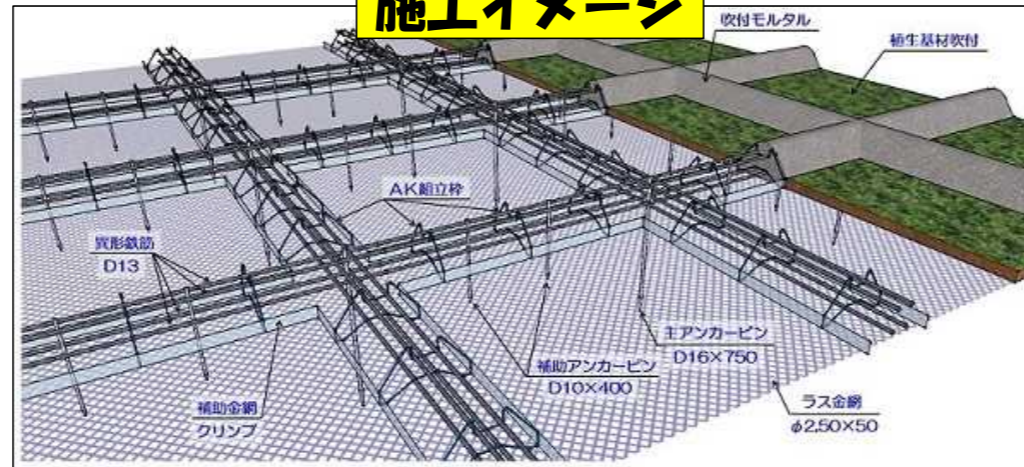

※実際の形状とは多少異なります。

掘削状況



完成後イメージ



※実際の形状とは多少異なります。

下流部は治山ダムを作成するため、掘削を行っております。その後枠を作り、コンクリートを流し込みイメージ写真のような治山ダムを作ります。

12月のスケジュール
12/1～の期間は
片側交互通行（終日）

※交通誘導員または信号機を設置しております。

今月の作業内容

法面のネット（金網）の上に鉄筋を組む作業を予定しています。

また、下流部は治山ダムのコンクリート打設（コンクリートの流し込み）を行います。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力宜しくお願い致します

発注者：大分西部森林管理署 受注者：小倉建設株式会社

