

平成28年台風等被害に係る位置図【網走中部署：北見市留辺薬町富士見】





「電子国土Web」(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成

平成28年台風等被害に係る北見市における災害事業進捗状況 (H29.10.5現在)

【網走中部署：富士見地区その2】

崩壊時の状況

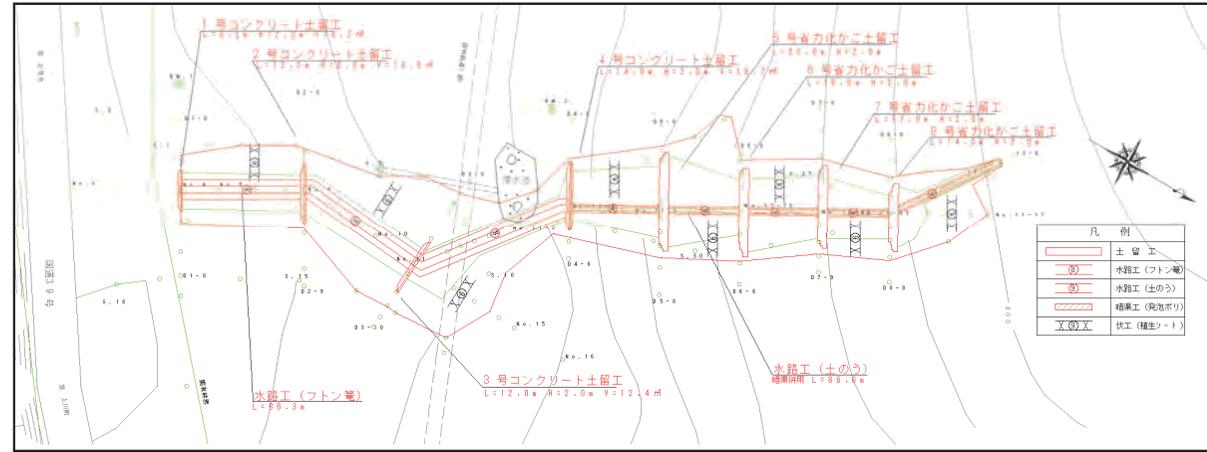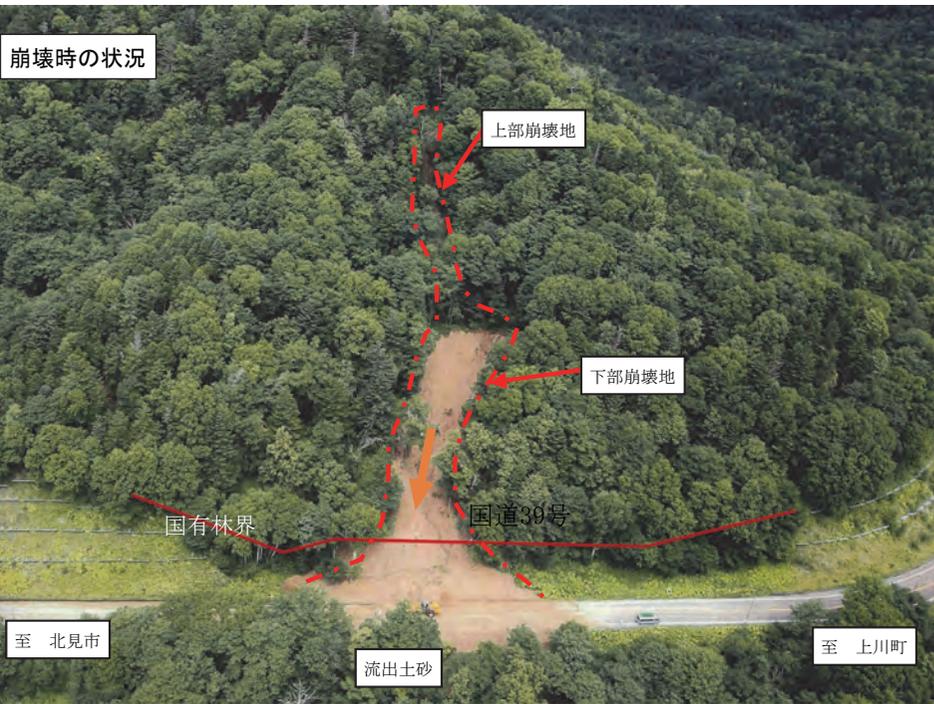

第5～8号: 施工状況 (H29. 7.31現在)



第4号: 施工状況 (H29. 8. 8現在)



工事名： 富士見地区その1外災害関連緊急事業その2
場所： 北見市留辺蘆町富士見 網走中部森林管理署1127林班
工期： 平成29年 4月27日 ～ 平成30年 2月 6日
主な工事内容： コンクリート土留工 4基、省力化かご土留工 4基
受注者： 興和建設株式会社 (北見市泉町1丁目2番12号)
進捗： 平成29年 6月上旬に現場作業に着手
 ・第1～4号コンクリート土留工：完了
 ・第5～8号省力化かご土留工：完了
 ・水路工(土のう)：完了
 ・水路工(フトン籠)：完了
現場作業について完了
その他： 国道39号のイトムカ橋付近

