


平成28年台風被害に係る新冠町における災害事業実施箇所【日高南部森林管理署】




平成28年台風被害に係る日高町における災害事業進捗状況【日高南部署：富居の沢】

工事名： 富居の沢災害関連緊急事業
場所： 沙流郡日高町字正和 日高北部森林管理署2048林班
工期： 平成29年 3月10日 ~ 平成29年 8月25日
主な工事内容： コンクリート谷止工 1基
受注者： 真下建設株式会社
進捗： 平成29年 4月中旬に現場作業に着手。
 現場作業については平成29年7月中旬完了。

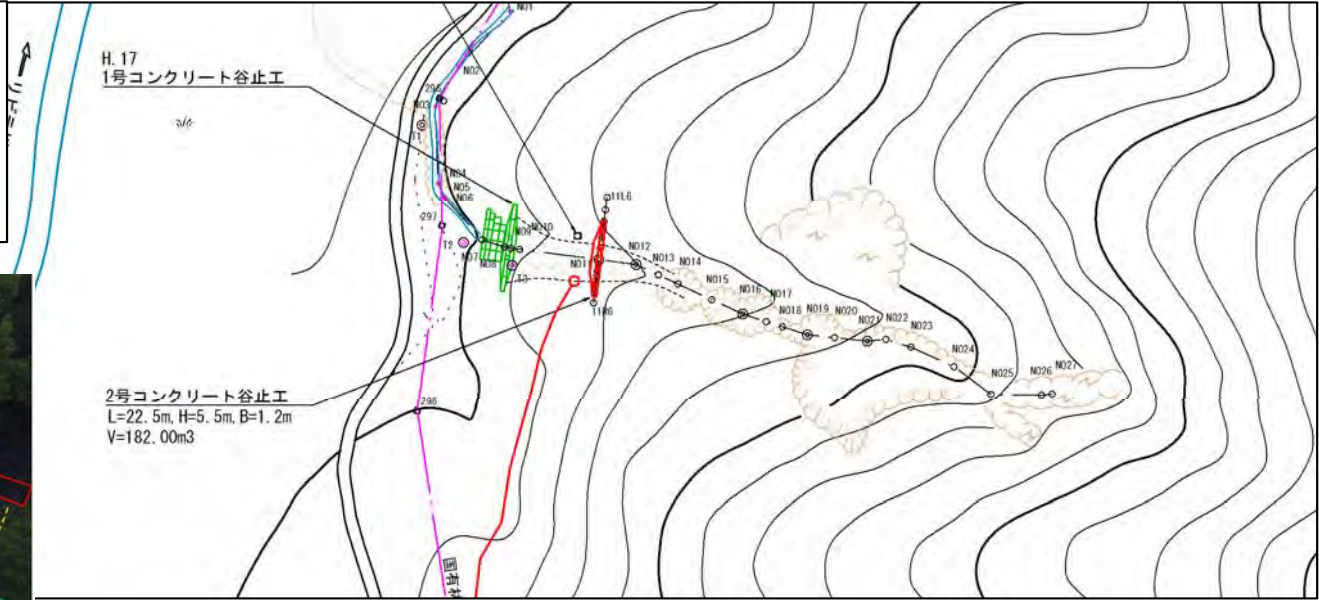

被災状況

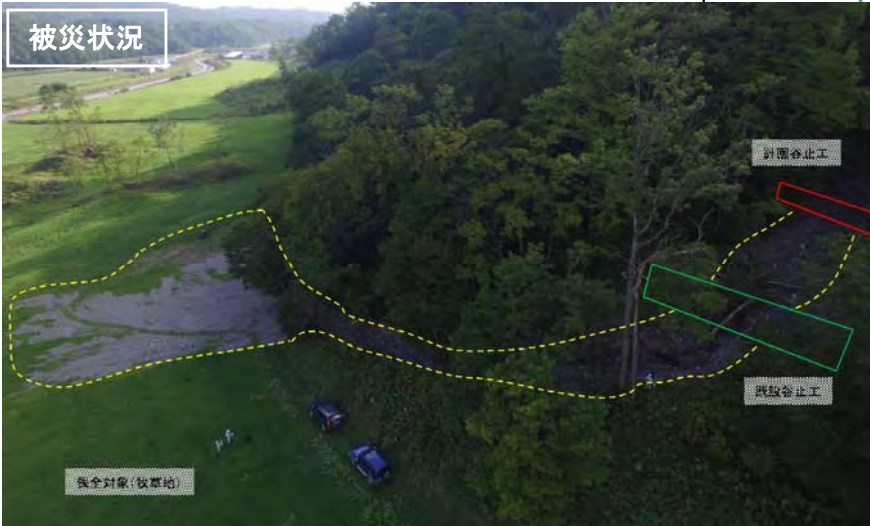

施工状況 (H29.09.05現在)



計画

