


平成28年台風等被害に係る利尻富士町における災害事業実施箇所【宗谷署：ヤムナイ沢】

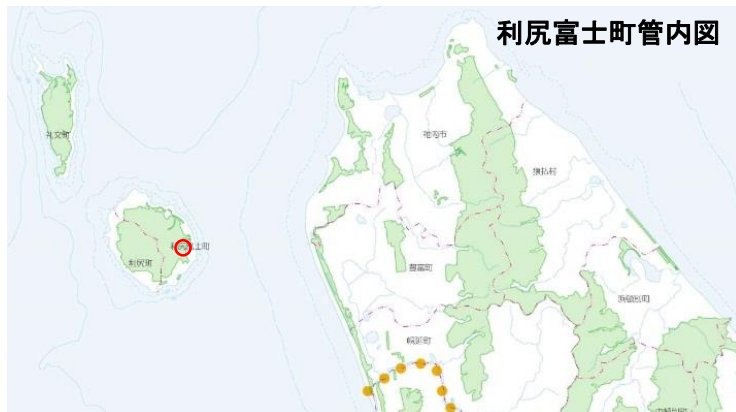


『電子国土Web』（国土地理院）(<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成

平成28年台風等被害に係る利尻富士町における災害事業進捗状況 1 【宗谷署：ヤムナイ沢】

1号谷止工完成状況



工 事 名 : ヤムナイ沢施設災害復旧事業
場 所 : 利尻郡利尻富士町 宗谷部森林管理署104・105林班
工 期 : 平成29年 3月13日 ~ 平成30年2月28日
主な工事内容 : コンクリート谷止工4基 袖部工3基
受 注 者 : (株)山崎組・荒井建設(株)
進 捗 : 荒井建設工区については平成30年2月28日に工事終了、山崎組工区は12月・1月の悪天候により、工期を延長し、平成30年3月22日に工事終了。

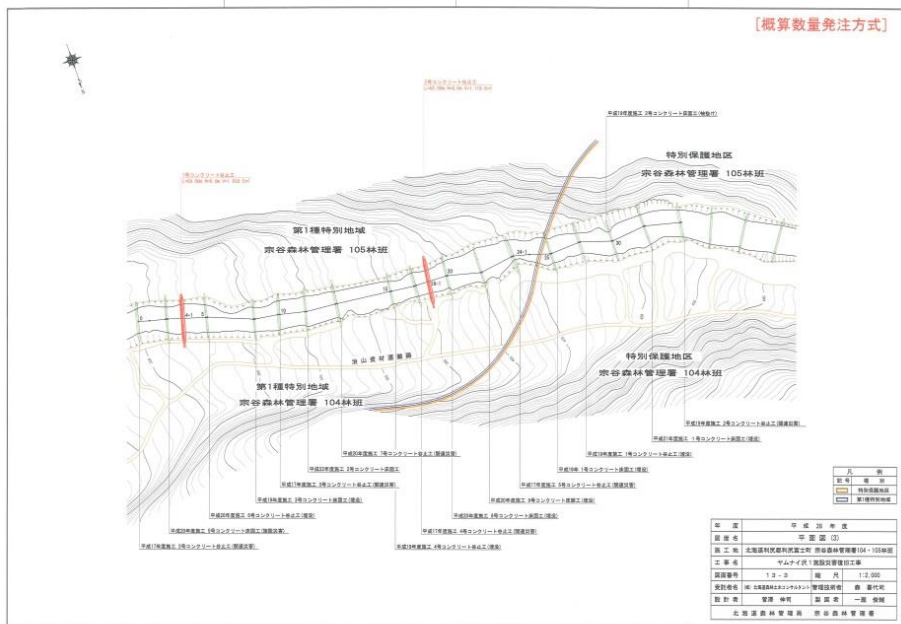


2号谷止工完成状況



平成28年台風等被害に係る利尻富士町における災害事業進捗状況 2 【宗谷署：ヤムナイ沢】

3号谷止工完成状況

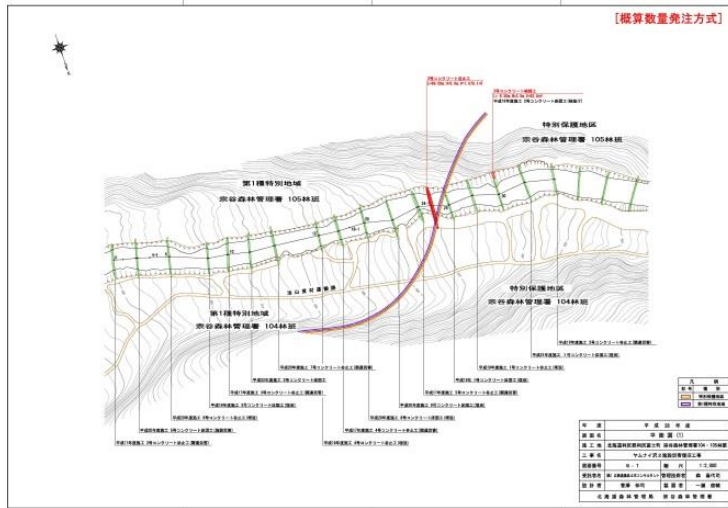

4号谷止工完成状況

