

五百瀬地区(1号地)

○概要

場所：十津川村五百瀬

地すべり兆候面積：1.30ha

主要工種：アンカー工  
排水ボーリング

工期：平成27年 6月13日から  
平成28年 3月18日まで  
平成28年 3月15日完成

概要


山腹崩壊斜面の復旧が完了したため、地すべりの兆候が見られる斜面について、アンカー工及び排水ボーリング工により、地すべり土塊の安定化を図ります。

○位置



○復旧状況

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:green;"></span>	既設
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:red;"></span>	H27予定箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>	次年度以降計画

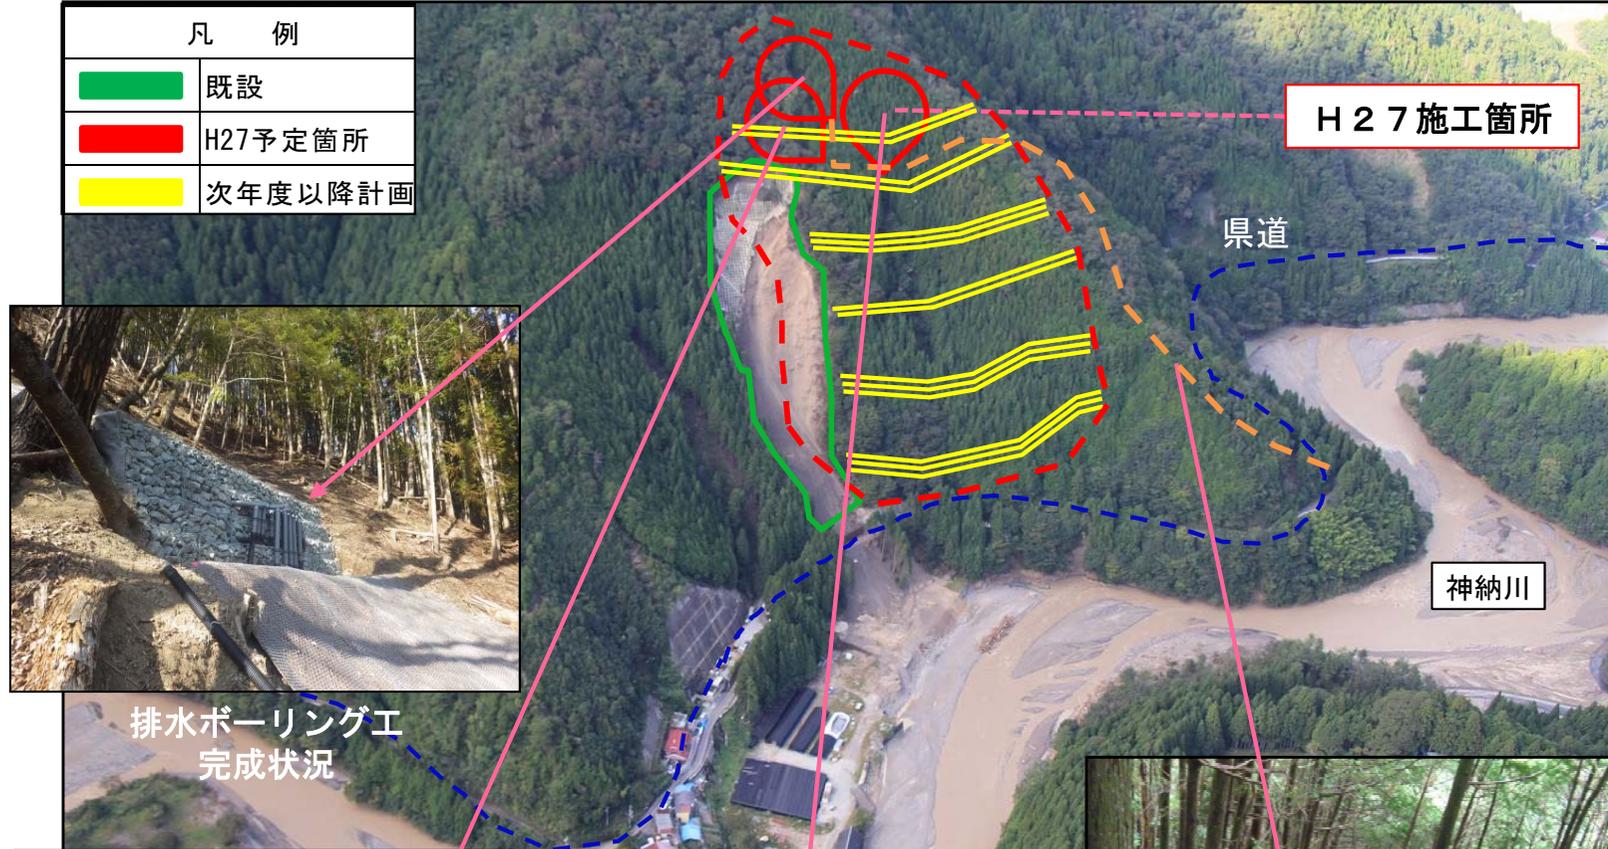

排水ボーリング工  
完成状況



排水ボーリング工  
完成状況



排水ボーリング工  
完成状況



仮設モノレール設置完了
