

内野地区

○概要

場所：十津川内野

崩壊地面積：4.79ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：平成27年 7月15日から  
 平成28年 3月18日まで  
 平成28年 3月10日完成

概要


山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させる治山工事を行いました。今後は、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:green;"></span>	既設
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:red;"></span>	H27予定箇所
<span style="display:inline-block; width:15px; height:15px; background-color:yellow;"></span>	次年度以降計画

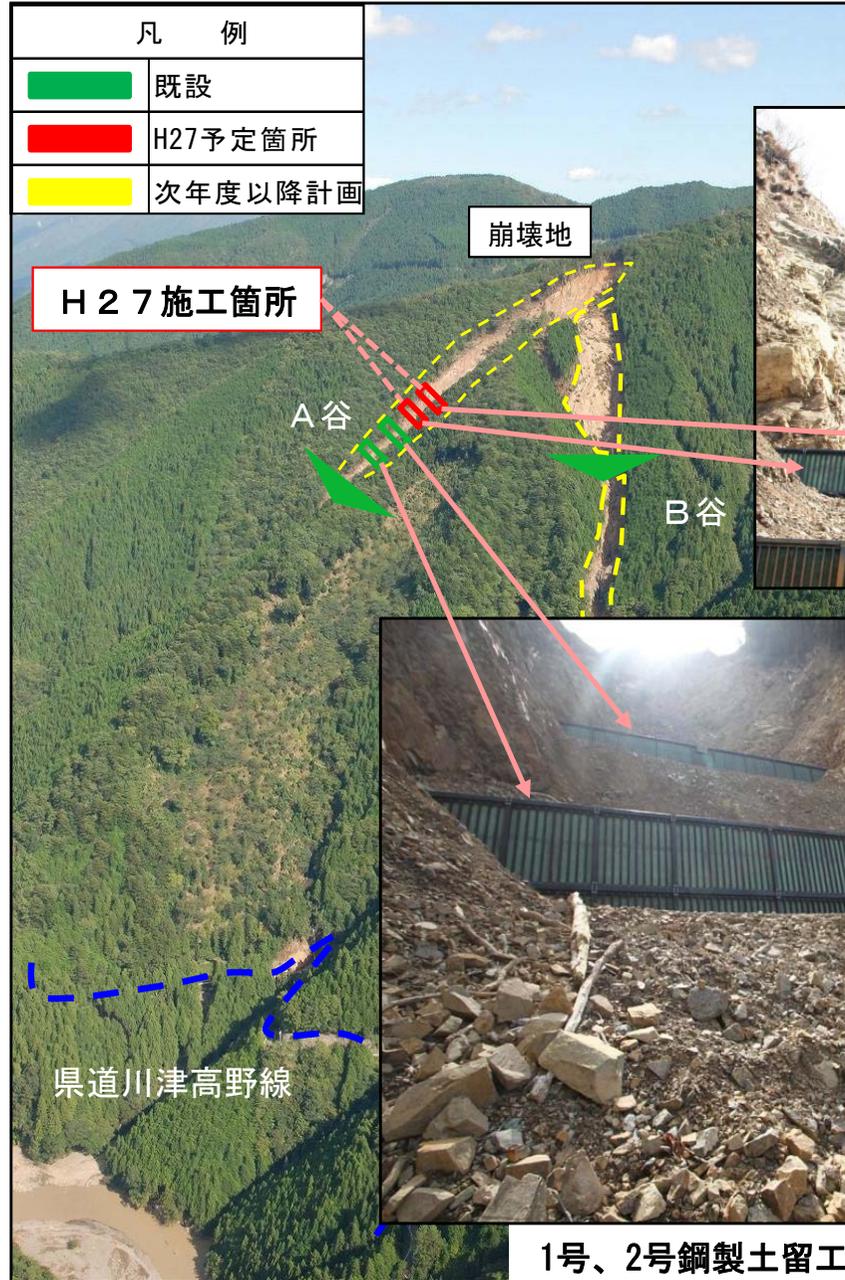

3号、4号鋼製土留工完成状況



1号、2号鋼製土留工 完成状況
