

檜股地区

○概要

- 場所 : 野迫川村檜股
- 崩壊地面積 : 2.30ha
- 主要工種 : 谷止工、流路工
山腹工(土留工)
- 工期 : 平成25年3月19日～
11月25日完成


概要

山腹崩壊によって不安定な土砂が堆積していることから、土留工により斜面を安定させます。また、谷止工と流路工により溪流の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

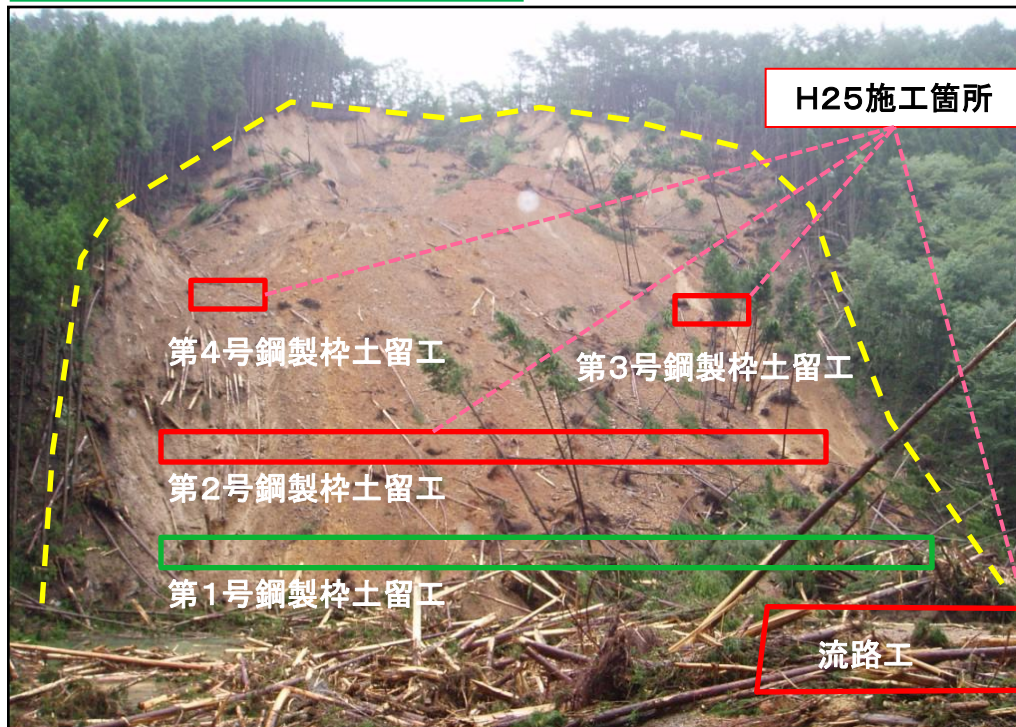

凡 例	
	既設
	H25予定箇所
	次年度以降計画



鋼製砕土留工 完成状況



流路工 完成状況
