

長殿(テラ谷)地区

○概要

場所 : 十津川村長殿
 崩壊地面積 : 2.50ha
 主要工種 : 谷止工 4基
 工期 : 平成25年 3月1日～
 12月5日完成


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況

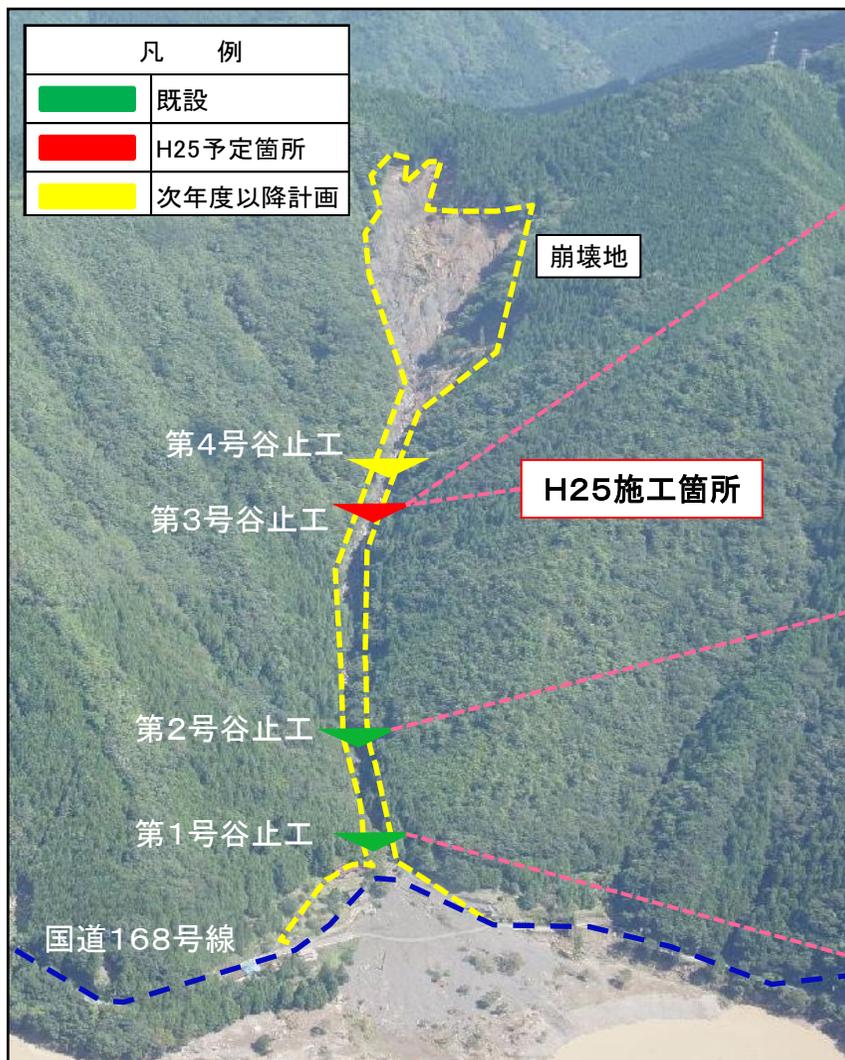

第3号谷止工 完成状況



第2号谷止工 完成状況



第1号谷止工 完成状況
