
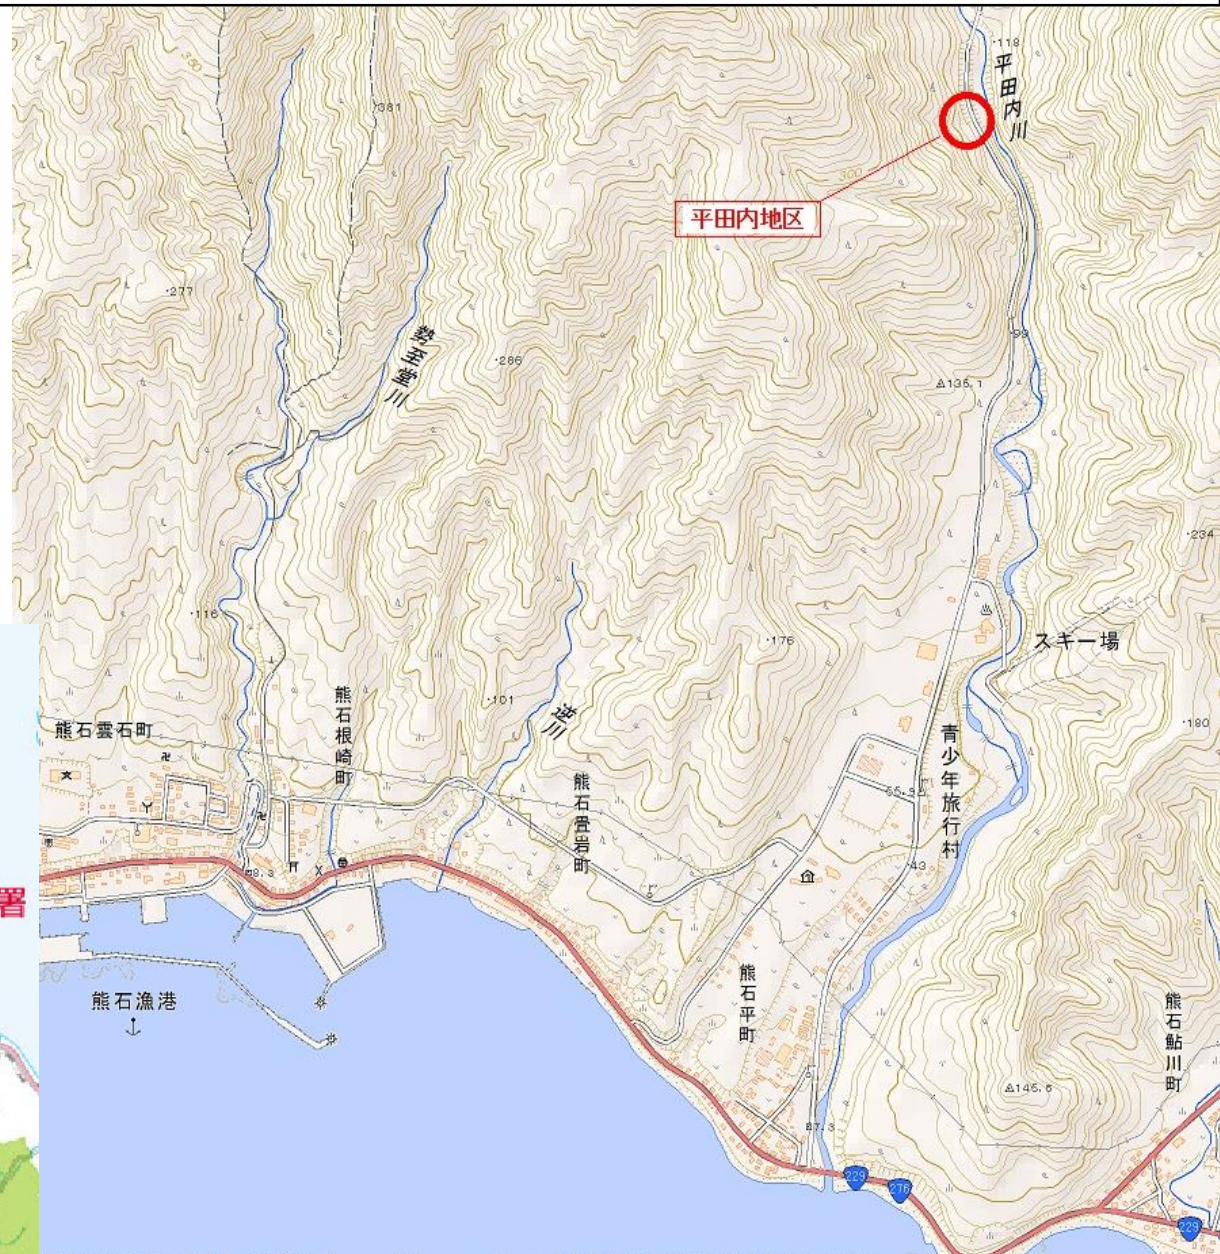


令和元年度 八雲町熊石における流木対策（治山事業）の実施状況【渡島森林管理署】

平田内地区【位置図】

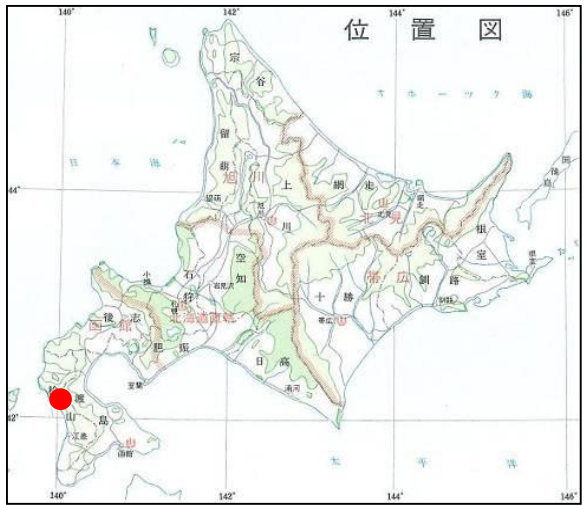

電子国土Web(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成

令和元年度 八雲町熊石における流木対策（治山事業）の実施状況【平田内地区】

工 事 名: 平田内地区治山工事
場 所: 二海郡八雲町熊石平町 渡島森林管理署7170林班
工 期: 令和元年5月15日～令和2年1月31日
主な工事内容: 落石防護柵工 110m
 ロープ伏工 36m²
 ロープ掛工 1式
受 注 者: (株)松本組
進 捗: 令和元年 5月16日着工
 令和元年12月 3日完成



着工前



流木の状況

ロープ伏工・掛工完成



落石防護柵工完成

