

五百瀬工区(2号地)

〇概要

場所：十津川村三浦

崩壊地面積：4.35ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年9月7日から

令和7年5月9日まで


令和7年5月9日完成

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。

また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

〇位置

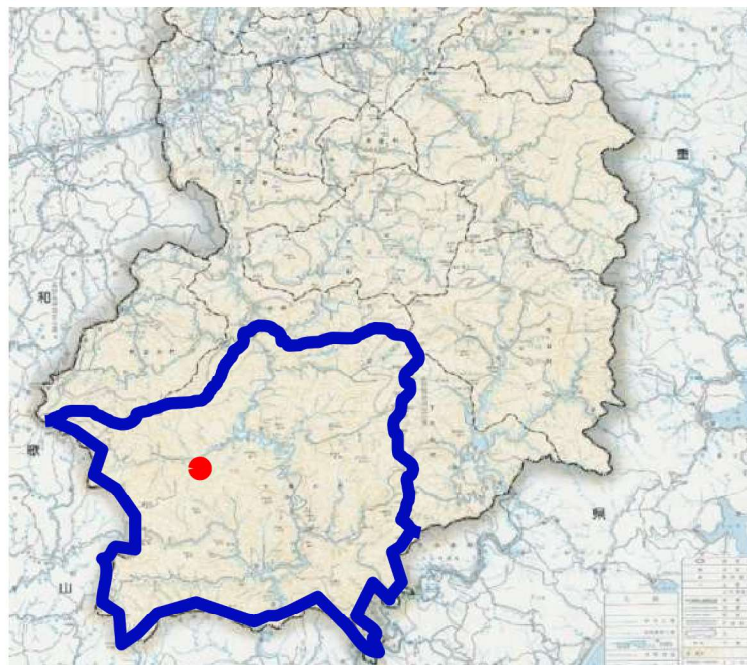

〇復旧状況



R6施工箇所 大型かご枠流路工 完成 (R7.5月)



凡 例	
	既設
	R 6 施工箇所
	次年度以降計画
