

内野工区

○概要

場所：十津川内野
崩壊地面積：4.79ha
主要工種：谷止工、山腹工
工期：令和 7年 7月16日から
令和 8年 3月19日まで


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

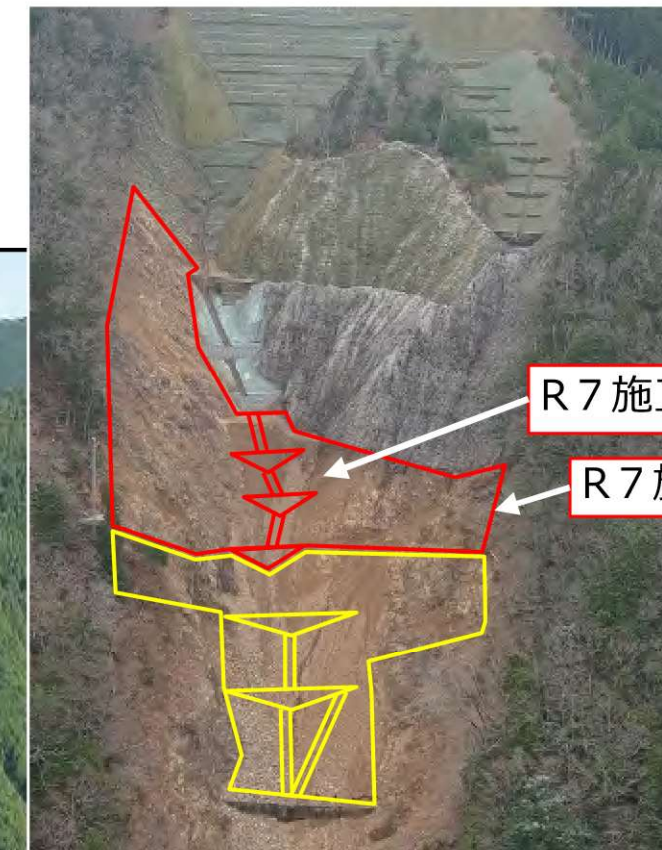


令和7年10月現在

凡 例	
	既設
	R 7 施工箇所
	次年度以降計画

R 7 施工 かご枠土留工

R 7 施工 ソイル注入マット伏工

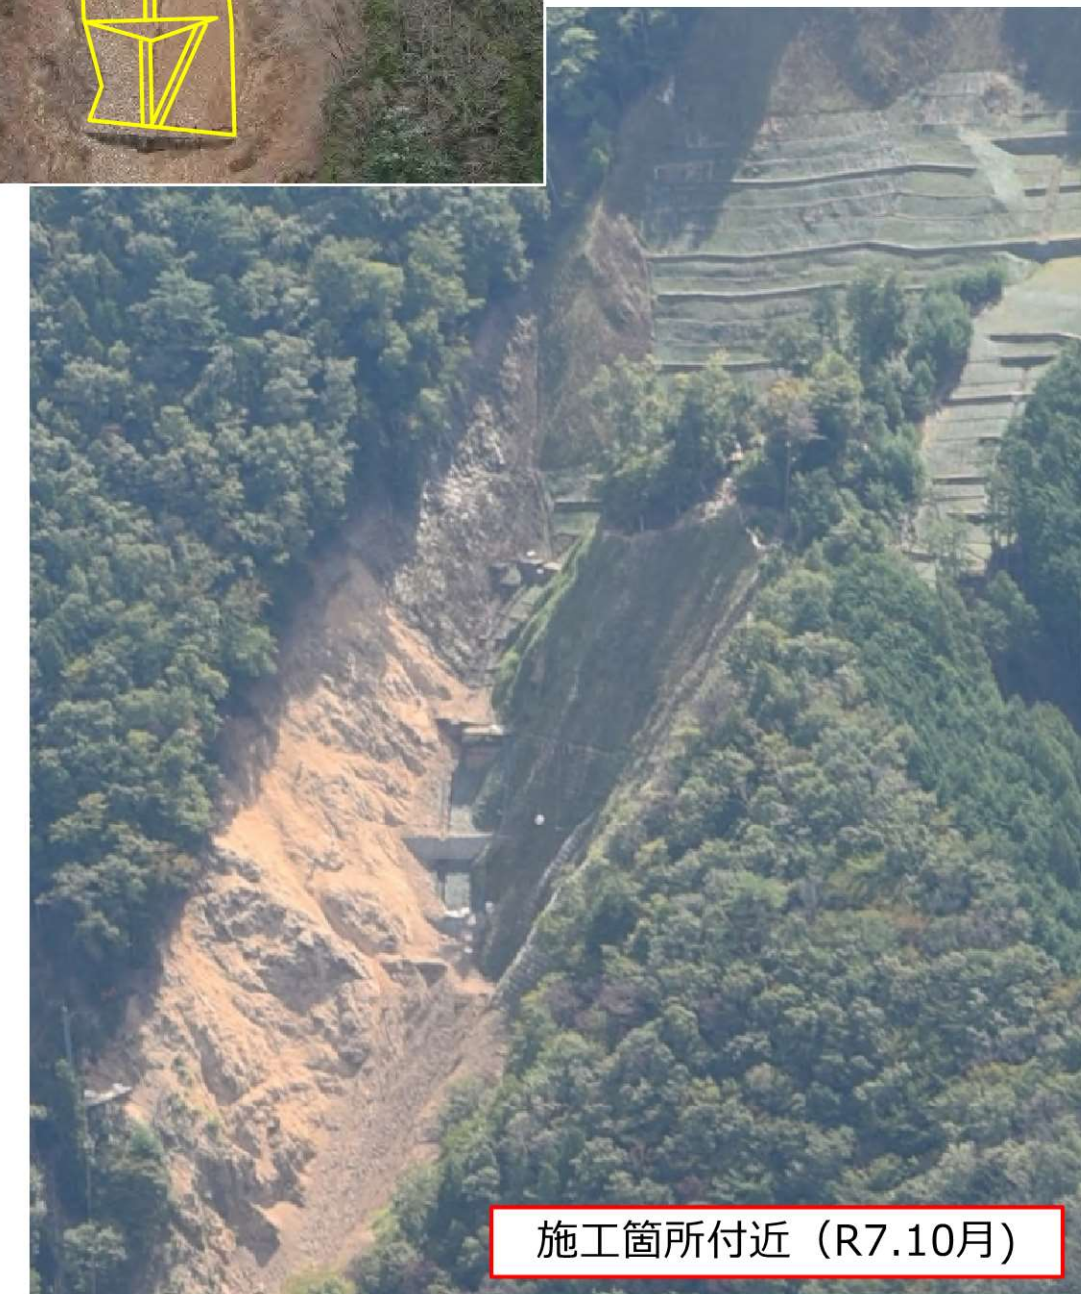

施工箇所付近 (R7.10月)
