

天川村：坪内工区

令和7年10月現在

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工
排土工

工期：令和7年 4月24日から
令和8年 1月30日まで


概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

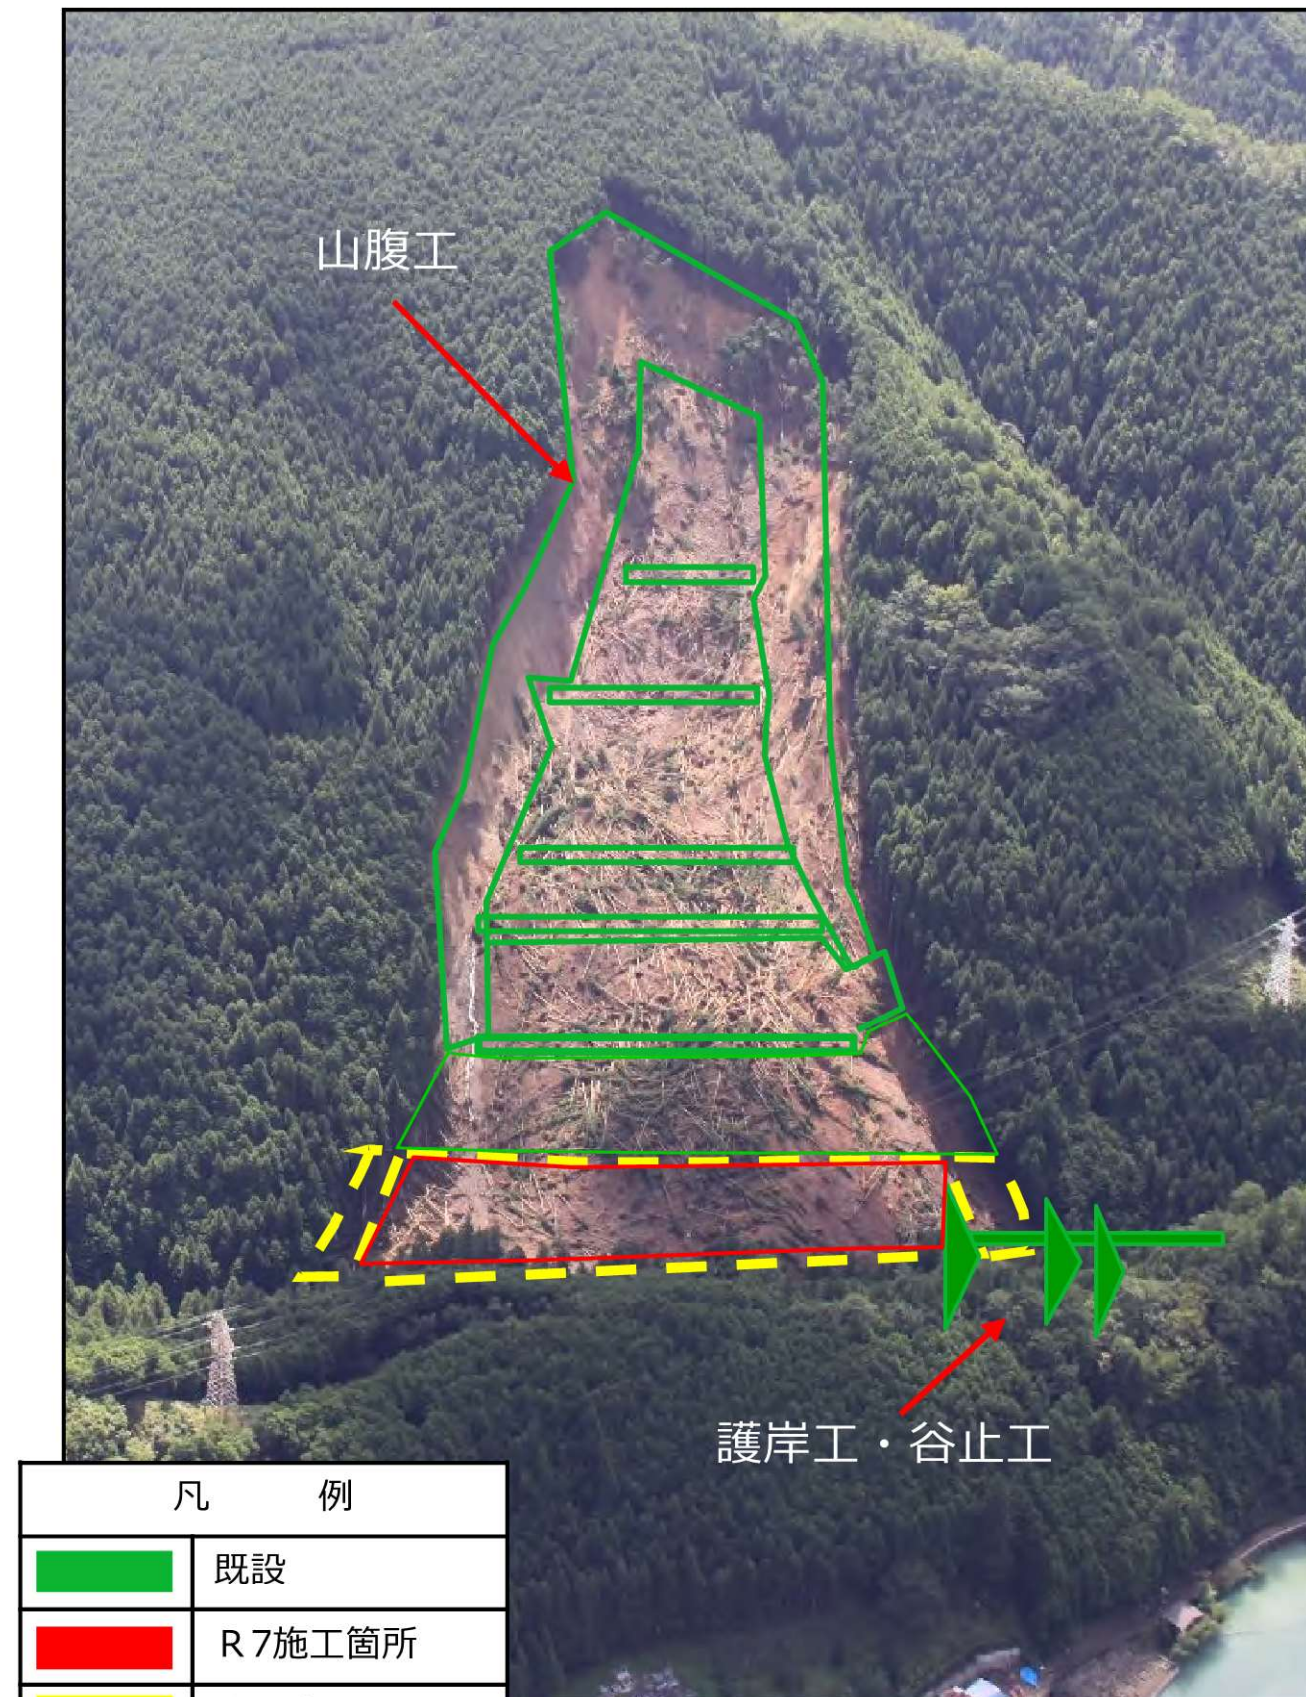

凡 例	
	既設
	R7施工箇所
	次年度以降計画

施工箇所付近（R7.10月）



R7施工 排土工

