

境界検測計画書

森林管理署名	国 有 林 名	記番	境界点番号		境 界 線		連 結 線		計	標 識 埋設本数	境界線の概況	備 考
			自	至	点 数	延 長	点 数	延 長				
盛岡森林管理署	箱ヶ森	1	337	351	35	991.75			991.75	17	周囲界	
計					35	991.75			991.75	17		

調査員官職氏名 農林水産技官 菊池千夏

調査区分	現 況 等					
森林管理署名	盛岡森林管理署					
国有林名	箱ヶ森 国有林					
所在地	岩手県盛岡市					
調査年月日	自 令和7年4月22日 至 令和7年4月24日					
図根測量	測点間平均距離		k m	観測点数		点
	造標設置点数		点	平均標高差		m
境界測量	境界延長	0.00	m	点間平均距離	0.00	m
	境界点数	0	点	測量を要する点数	0	点
	地形区分	0		平均勾配	0	度
	伐開区分	0		伐開区分の延長	0.0	k m
境界検測	境界延長	991.75	m	点間平均距離	28.34	m
	境界点数	35	点	埋設を要する点数	17	点
	地形区分	B		平均勾配	8	度
	伐開区分	b		伐開区分の延長	0.20	k m
標識加工・運搬	標識加工本数	17	本	運搬本数	17	本
	標識運搬総重量	92	kg	標識運搬距離	111.0	k m
連絡者運行距離	森林管理局から森林管理署までの距離				113	k m
	森林管理局から滞在地までの距離				112	k m
	滞在地から下車地点までの距離			境界検測	9.7	k m
				境界測量	0	k m
滞在地から 現場までの状況	下車地点から現場までの平均徒歩距離			境界検測	0.4	k m
				境界測量	0	k m
	滞在地から現場までの通勤時間			境界検測	32	分
				境界測量	0	分
宿泊地・宿泊区分	宿泊地	盛岡市		宿泊区分	ホテル	
備 考						
注1 地形区分については、境界線の平均勾配による。 A＝ 5度未満 B＝ 5度以上、15度未満 C＝15度以上、30度未満 D＝30度以上						
注2 伐開区分については、伐開する境界線の現況による。 a＝草木や灌木はあるが、総じて見通しの良い結果で、伐開区間が20%未満の境界 b＝雑草、笹類、灌木等で見通しが困難な境界で、伐開区間がおおむね20～50%未満の境界 c＝雑草、笹類、灌木等で見通しが困難な境界で、伐開区間がおおむね50～80%未満の境界 d＝雑草、笹類、灌木等で見通しが困難な境界で、伐開区間がおおむね80%以上の境界						
注3 標識運搬距離は、指定場所から現地までの距離とする。標識1本あたり重量は、本体4.5kg輪かせ0.9kg。						


令和7年度 境界検測請負事業明細表

盛岡森林管理署

国有林名	標識番号	標識種類	標識位置	現況	境界種別	視準点番号	方向角、方位角 (度、分)	水平距離	標識運搬	標識埋設	備考
箱ヶ森	337	コン	峰筋	完全	2	338	76.12	17.35			
	338	コン	峰筋	完全	2	338補1	44.43	22.76			
	338補1	小コン	峰筋		2	339	44.43	20.00	○	○	増設
	339	石標	峰筋	完全	2	339補1	31.39	30.07			
	339補1	小コン			2	339補2	31.39	30.00	○	○	増設
	339補2	小コン			2	339補3	31.39	30.00	○	○	増設
	339補3	小コン			2	339補4	31.39	30.00	○	○	増設
	339補4	小コン			2	339補5	31.39	30.00	○	○	増設
	339補5	小コン			2	340	31.39	30.00	○	○	増設
	340	小コン	旧防火線東側(斜地)	完全	2	340補1	20.57	29.17			移動の可能性有り
	340補1	小コン			2	340補2	20.57	29.00	○	○	増設
	340補2	小コン			2	340補3	20.57	29.00	○	○	増設
	340補3	小コン			2	341	20.57	29.00	○	○	増設
	341	石標	旧防火線東側(風村路脇)	完全	2	341補1	26.46	33.71			移動の可能性有り
	341補1	小コン			2	イ	26.46	30.00	○	○	増設
	341イ	小コン	旧防火線東側(風村路脇)	完全	2	341イ補1	26.56	38.07			
	341イ補1	小コン	高圧線下平地	完全	2	341イ補2	27.05	34.96			
	341イ補2	小コン			2	口	27.05	30.00	○	○	増設
	341口	小コン	高圧線下平地	不明	2	341口補1	27.05	23.65	○	○	
	341口補1	小コン	電力管理用道路脇	傾斜	2	341口補2	27.20	40.33			
	341口補2	小コン			2	342	27.20	39.00	○	○	増設
	342	コン	平地	傾斜	2	342補1	22.07	26.25			
	342補1	小コン			2	343	22.07	30.00	○	○	増設
	343	石標	旧防火線下平地	完全	2	344	64.26	41.41			
	344	小コン	旧防火線下平地	完全	2	344補1	51.25	32.50			
	344補1	小コン			2	344補2	51.25	30.00	○	○	増設
	344補2	小コン			2	345	51.25	30.00	○	○	増設
	345	盛岡市コン標	旧防火線下斜地	傾斜	1	346	324.23	27.17			
	346	小コン	平地	完全	1	347	344.31	38.92			
	347	小コン	平地	完全	1	348	314.40	17.95			
	348	小コン	平地	完全	1	349	316.25	18.72			
	349	石標	旧防火線縁	完全	1	349補1	21.39	20.74			
	349補1	小コン			1	350	21.39	20.00	○	○	増設
	350	石標	旧防火線縁	完全	1	351	312.16	32.02			
	351	小コン	旧防火線縁	完全	1						
細計	35							991.75	17	17	
合計	35							991.75	17	17	


位置図

令和7年度 境界検測請負事業
盛岡森林管理署管内
箱ヶ森国有林 縮尺1:50,000

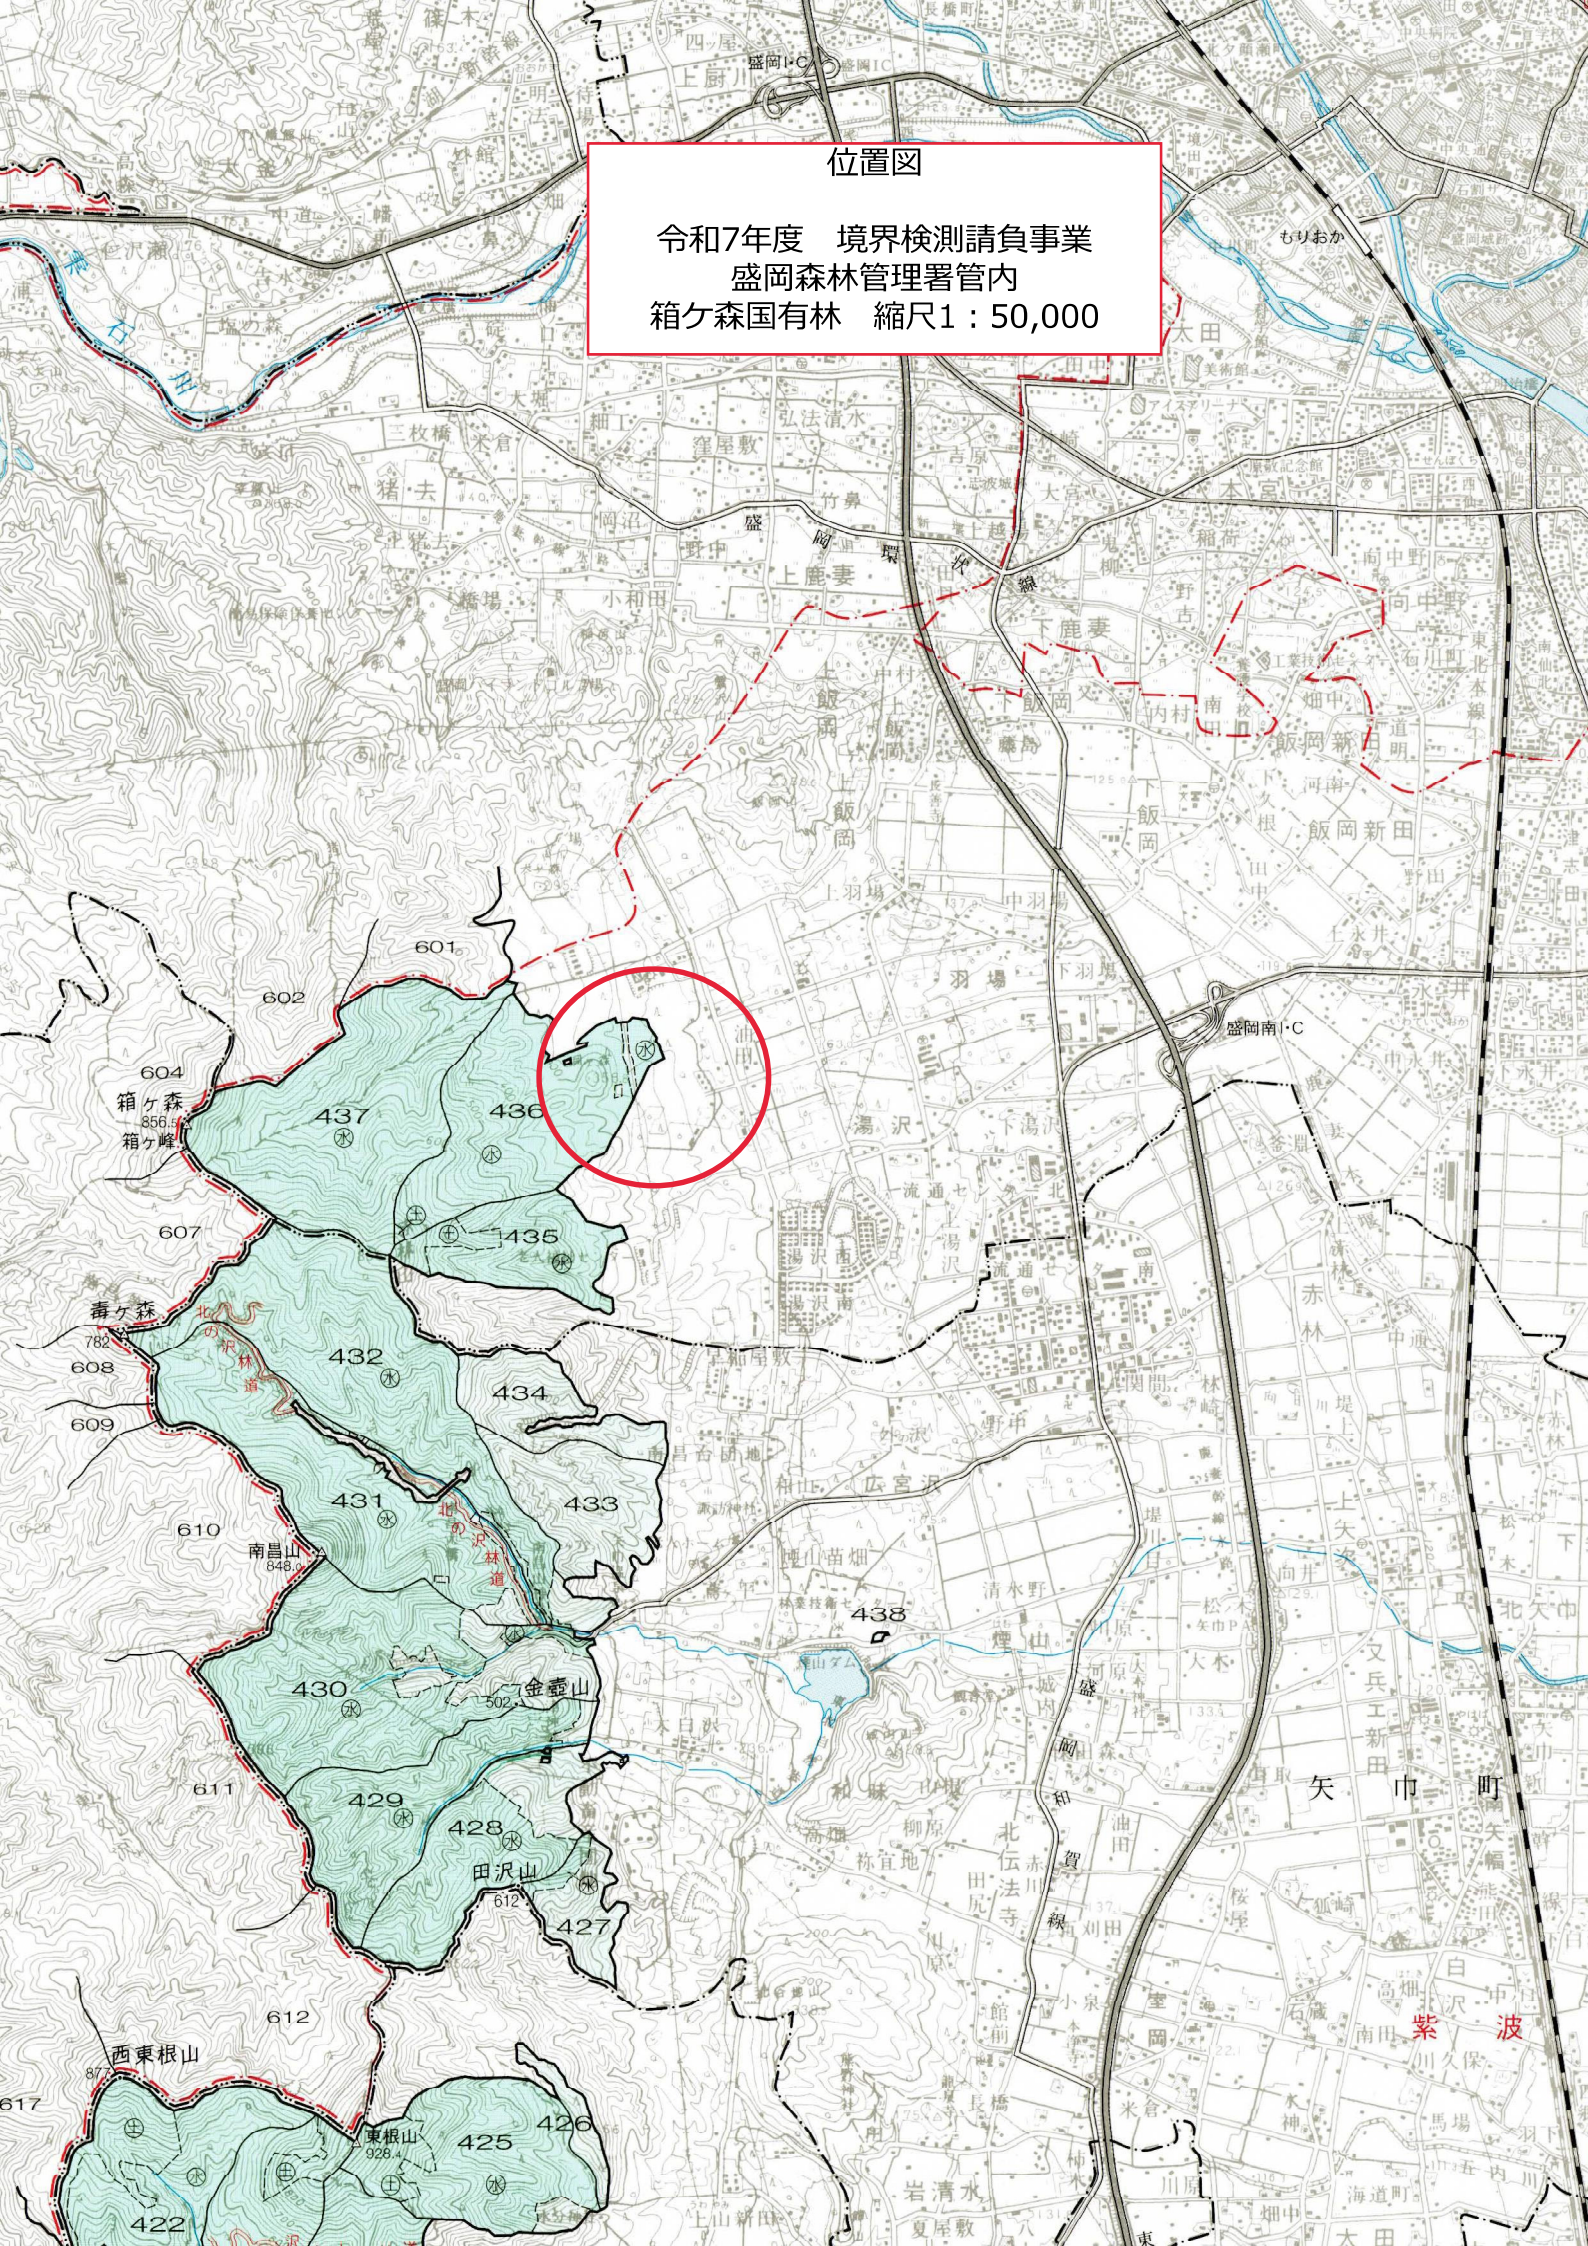

位置図

令和7年度 境界検測請負事業
盛岡森林管理署管内
箱ヶ森国有林 縮尺1:20,000

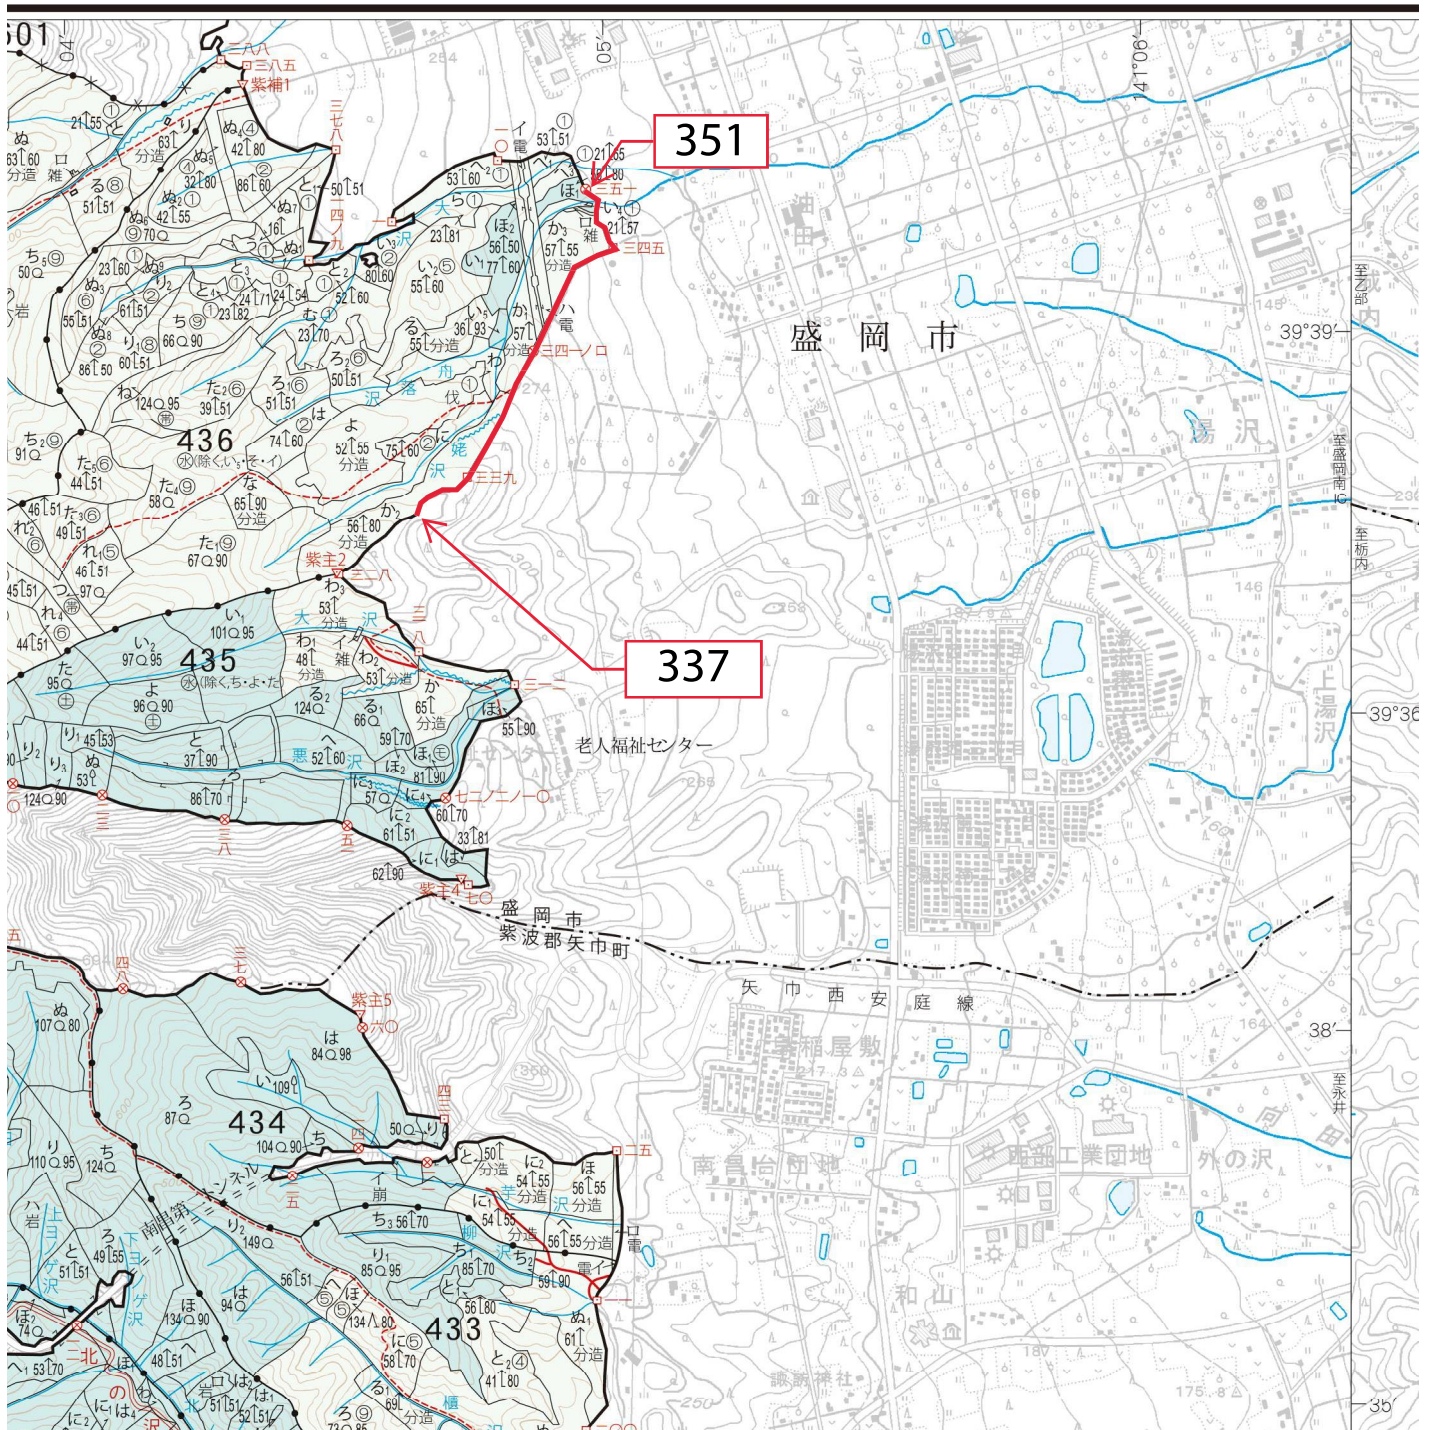

位置図

令和7年度 境界検測請負事業
盛岡森林管理署管内
箱ヶ森国有林 縮尺1:5,000

431~437

関係林小班

