

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	三陸北部森林管理署久慈支署	
物件番号	1	
物件名	森林環境保全整備事業(円館地区)	

林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢 R7	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km	備 考		
									本数	材積 m³	m³/本 m	N m³	L m³	計 m³	伐倒		集・造材		小運搬巻立						森林作業道作設		林地保全		土場 作設等 BH-0.45m h	砂利 数量 C-80 m³			薬剤 散布 (スパン イン) ℓ	鉄板 規格+枚数
															方法	数量 m³	方式	数量 m³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m³	クラッフル付きトラック 片道運搬距離 m	数量 m³	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種 編欄 m	緑化 m²								
114ろ1	水涵保	アカマツ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	2.58	25	20	553	168	0.30	40	60	100	全木	168	プロセッサ	100	378	100	10,300	100	緩									久慈市役所 山根支所	9.5	小運搬先 木売内中間土場
114ろ2	水涵保	アカマツ	51	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.99	25	20	1,501	455	0.30	111	165	276	全木	455	プロセッサ	276	201	276	10,300	276	緩									久慈市役所 山根支所	9.8	小運搬先 木売内中間土場
114ろ3	水涵保	カラマツ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	7.30	25	20	1,608	606	0.38	365	3	368	全木	606	プロセッサ	368	575	368	14,500	368	緩									久慈市役所 山根支所	9.8	小運搬先 白湯沢山元土場
114ろ4	水涵保	カラマツ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	8.14	25	20	1,802	676	0.38	407	3	410	全木	676	プロセッサ	410	813	410	14,500	410	緩									久慈市役所 山根支所	9.8	小運搬先 白湯沢山元土場
114ろ5	水涵保	カラマツ	48	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.96	25	20	1,537	578	0.38	344	2	346	全木	578	プロセッサ	346	753	346	10,300	346	緩									久慈市役所 山根支所	9.8	小運搬先 木売内中間土場
114ろ7	水涵保	カラマツ	49	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.42	25	20	1,199	450	0.38	268	2	270	全木	450	プロセッサ	270	1,202	270	10,300	270	緩									久慈市役所 山根支所	9.8	小運搬先 木売内中間土場
合計						37.39			8,200	2,933	0.36	1,535	235	1,770		2,933		1,770		1,770		1,770		1,170		34	円館林道 20m3 白湯沢林道 30m3	3m×2枚 155日						

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20° 未満、中:20° ～30° 未満、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編欄および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

検知業務作業内訳書

素材検知業務

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1	一般材	(1) の業務	499	合板材
	一般材	(2) の業務	171	一般材
	低質材	(5) の業務	1,100	低質材
	計		1,770	


素材検知（作業内容）

- （１）の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- （２）の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- （３）の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- （４）の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- （５）の業務 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

位置図

森林環境保全整備事業（円館地区）

（縮尺 1 : 20,000）

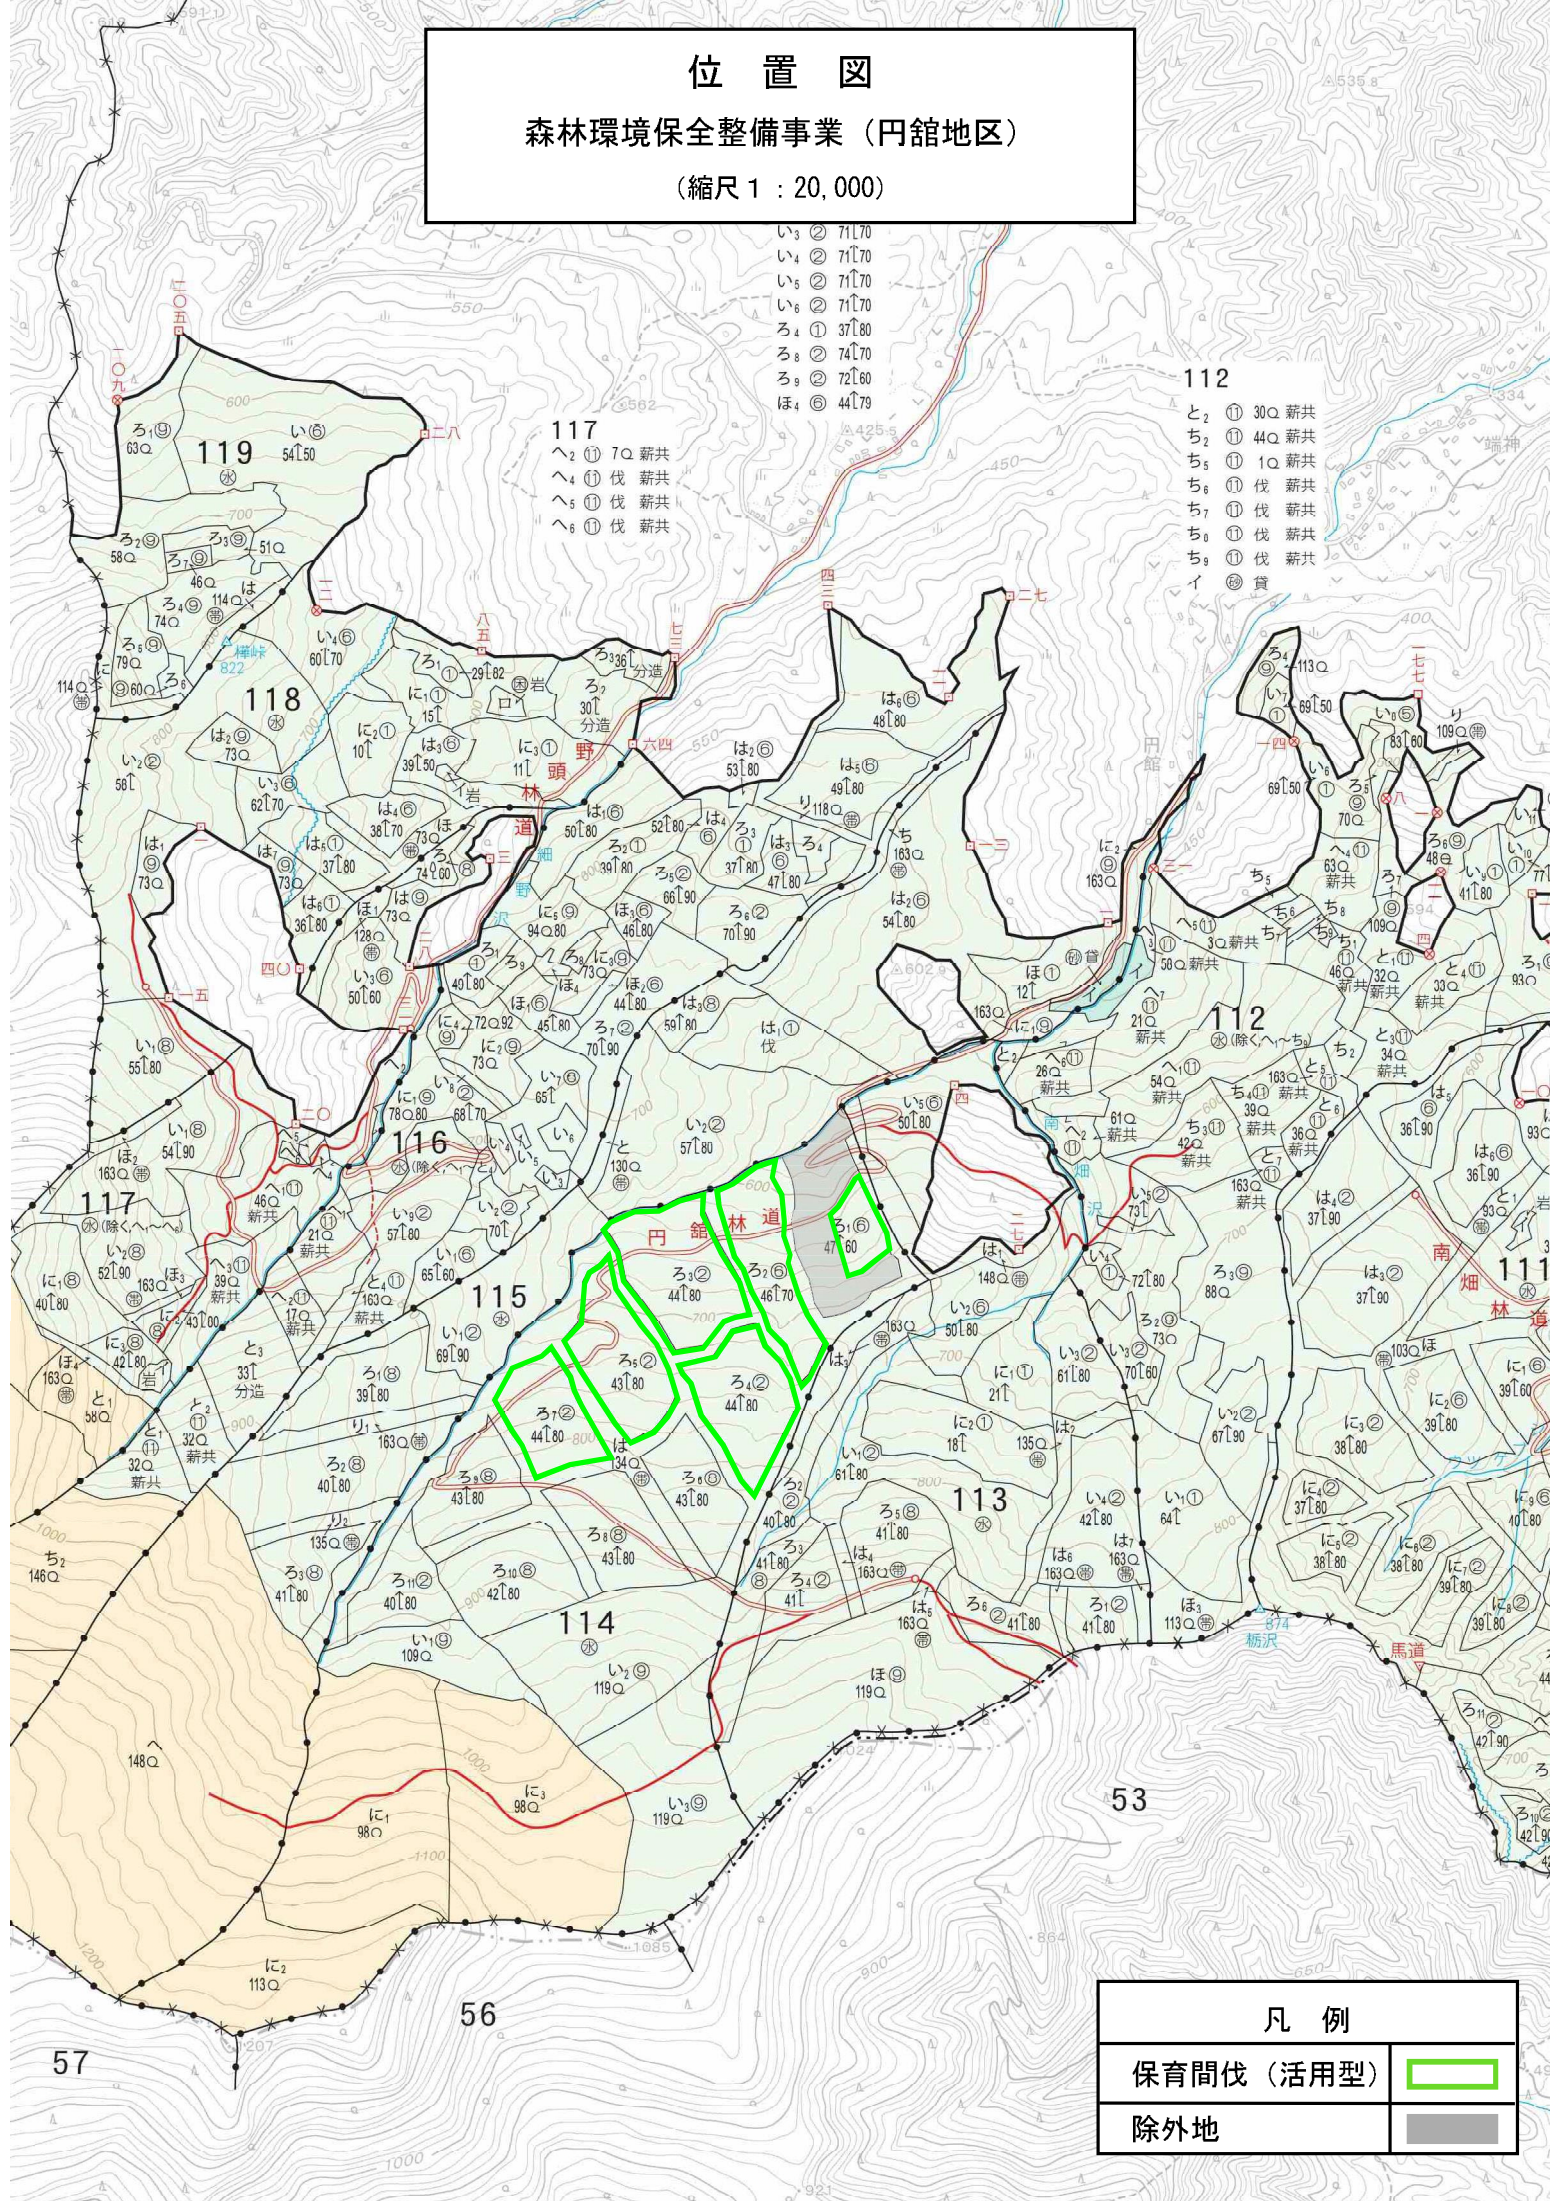

- い₃ ② 71ㄥ70
- い₄ ② 71ㄥ70
- い₅ ② 71ㄥ70
- い₆ ② 71ㄥ70
- ろ₄ ① 37ㄥ80
- ろ₈ ② 74ㄥ70
- ろ₉ ② 72ㄥ60
- ほ₄ ⑥ 44ㄥ79

- 117
- へ₂ ① 7ㄥ 薪共
- へ₄ ① 伐 薪共
- へ₅ ① 伐 薪共
- へ₆ ① 伐 薪共


- 112
- と₂ ① 30ㄥ 薪共
- ち₂ ① 44ㄥ 薪共
- ち₃ ① 1ㄥ 薪共
- ち₆ ① 伐 薪共
- ち₇ ① 伐 薪共
- ち₈ ① 伐 薪共
- ち₉ ① 伐 薪共
- イ ⑥ 貸

凡 例	
保育間伐（活用型）	
除外地	

位置図

森林環境保全整備事業（円館地区）

（縮尺 1 : 20,000）

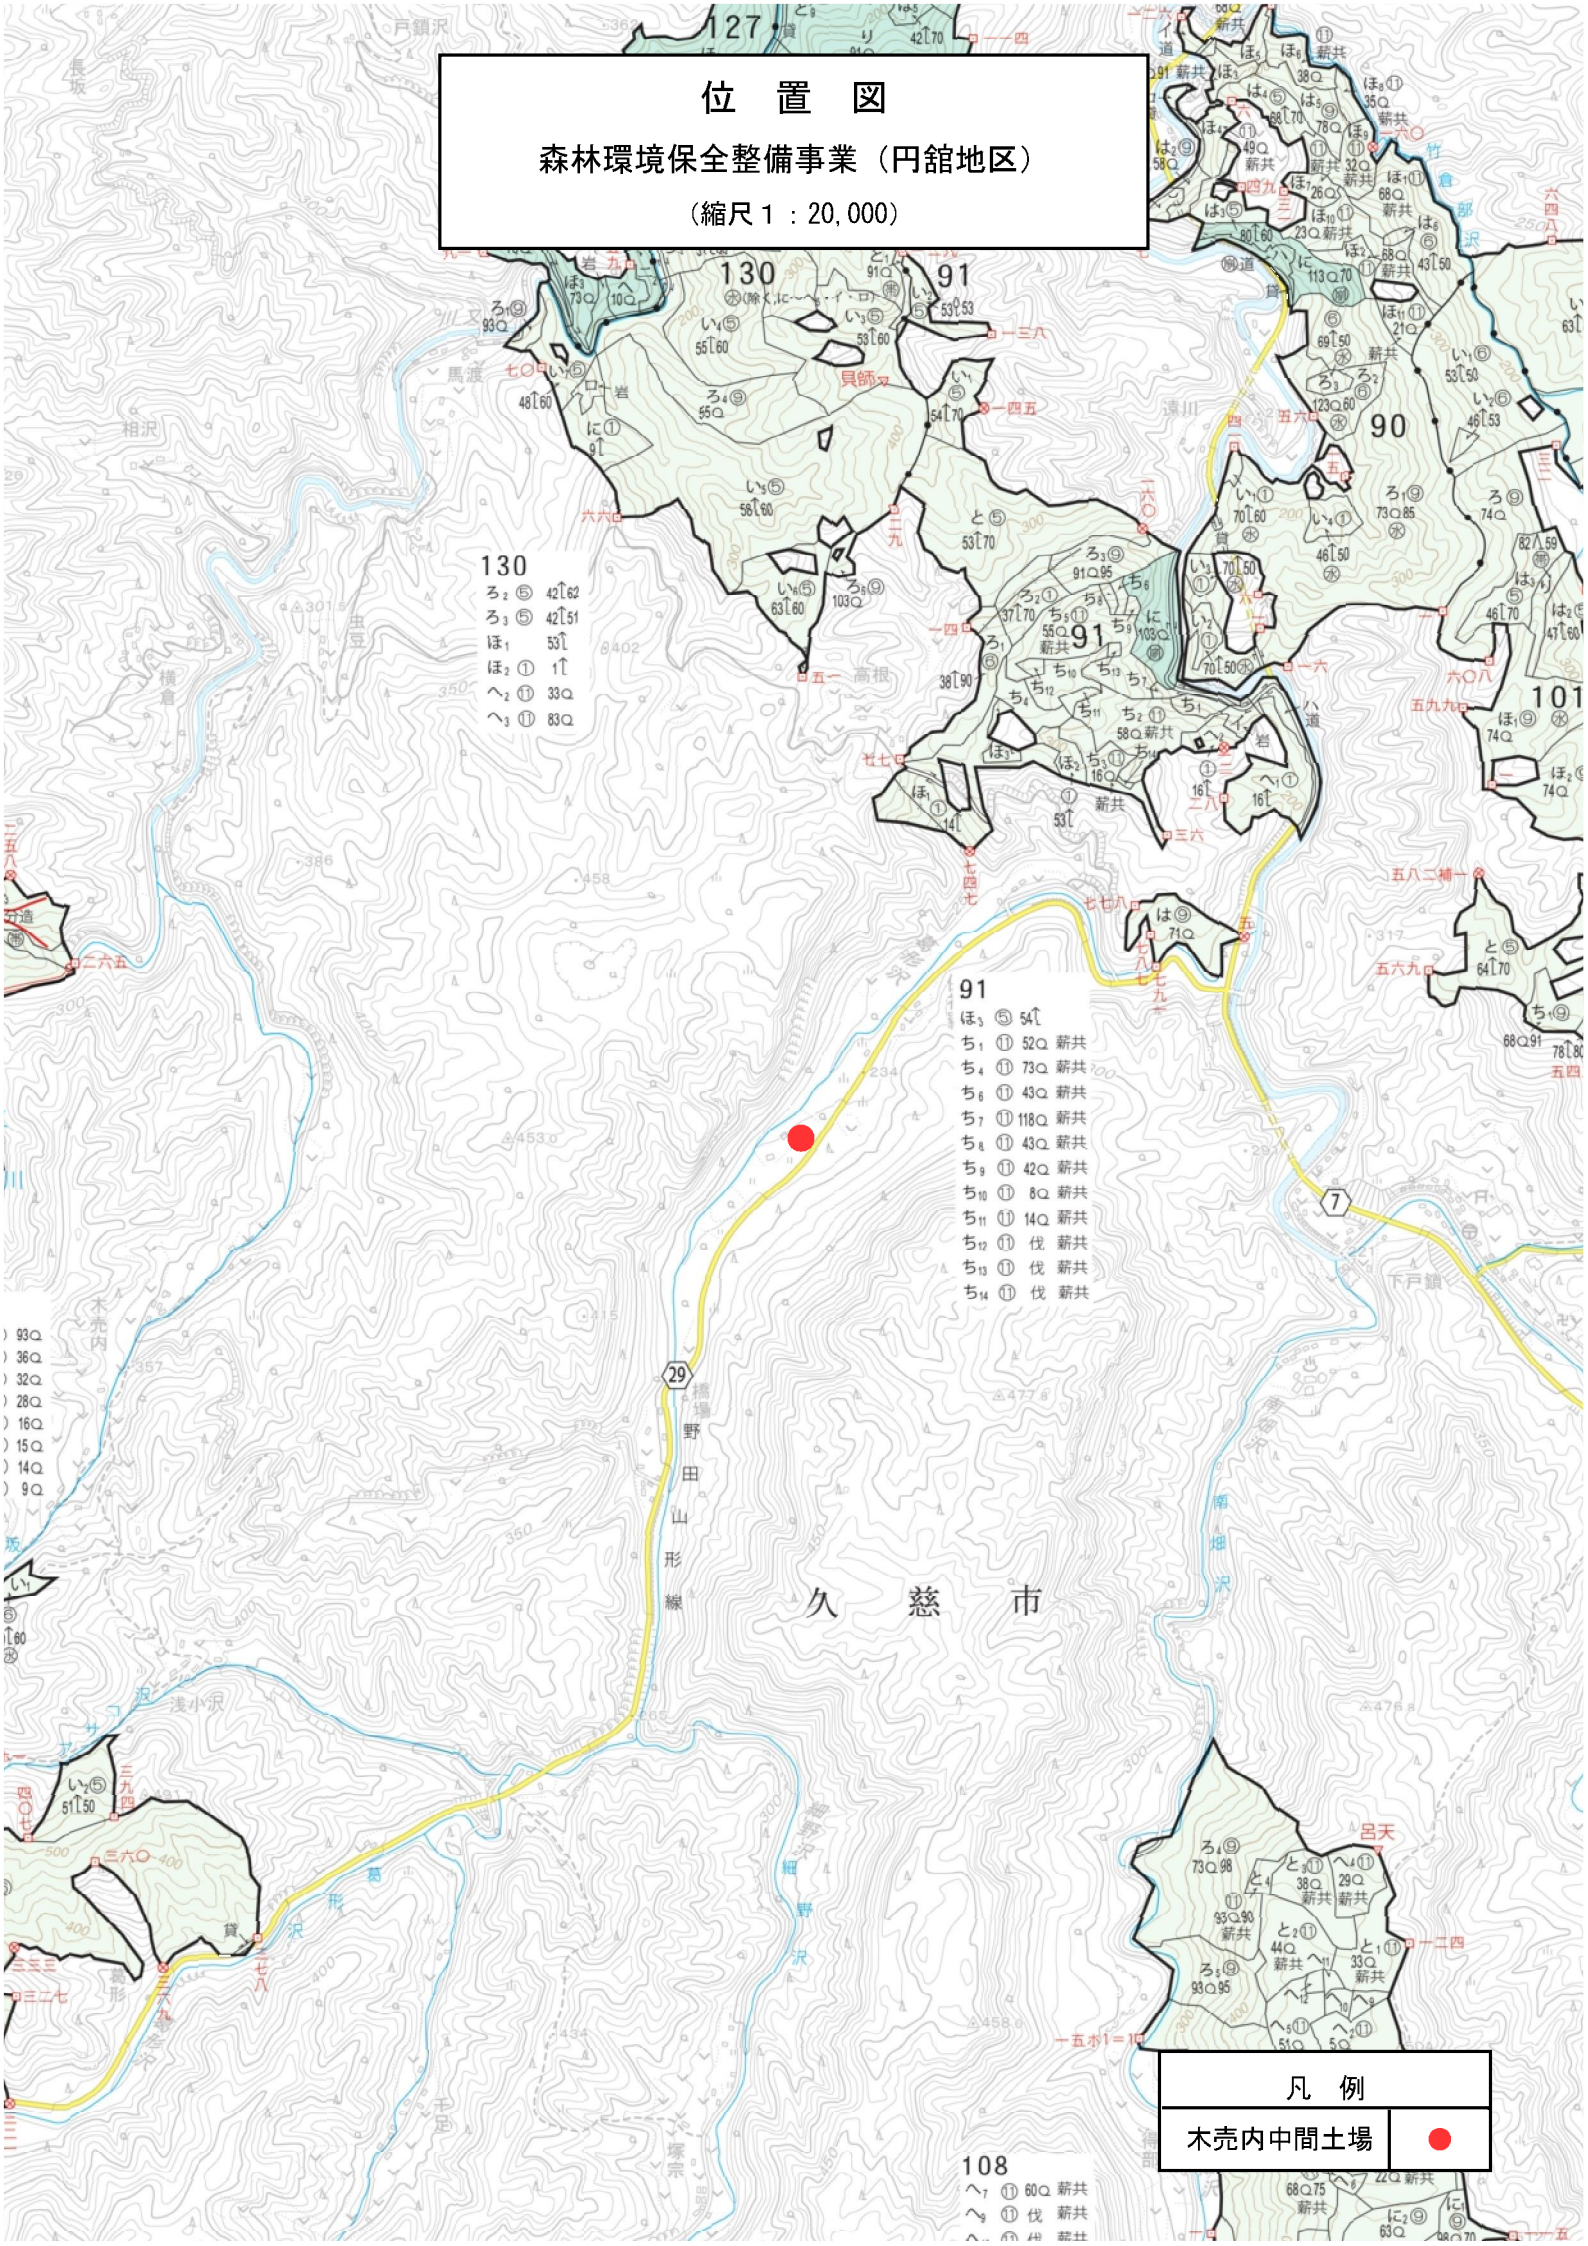


位置図

森林環境保全整備事業（円館地区）

（縮尺 1 : 20,000）

は4 ④ 3Q新共
は7 ⑦ 2Q新共
は10 ⑩ 伐薪共
は11 ⑪ 伐薪共
は12 ⑫ 伐薪共
は13 ⑬ 伐薪共

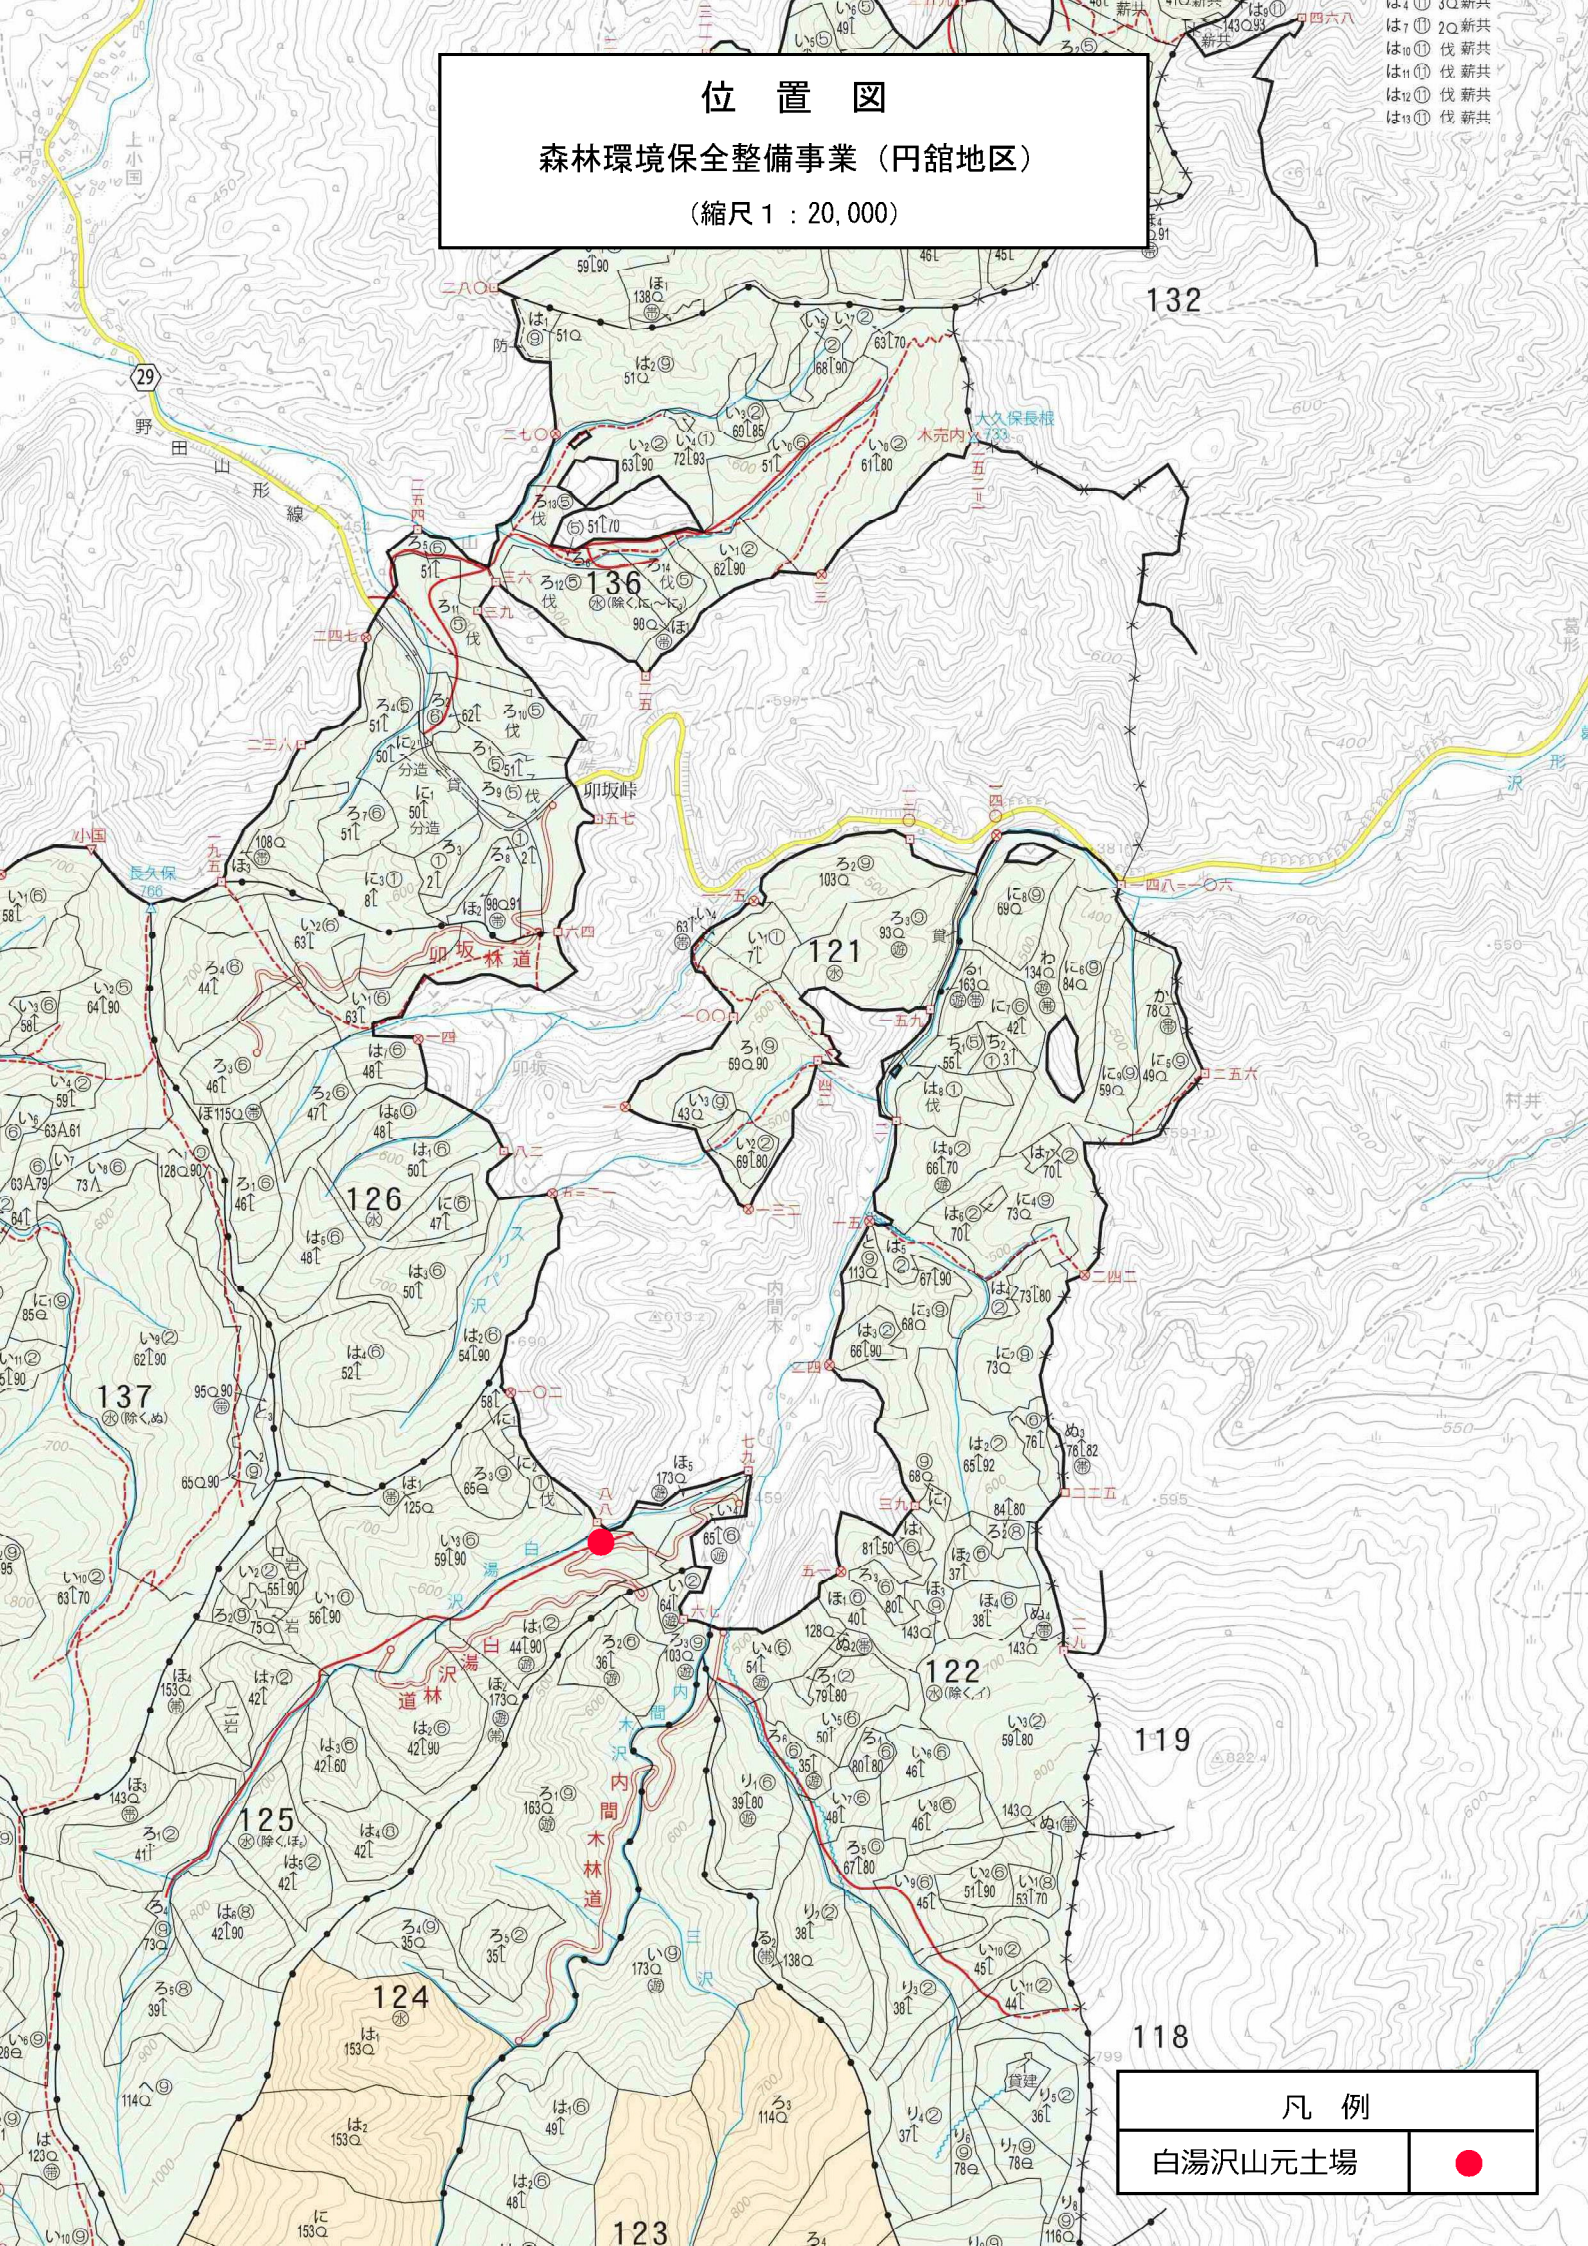


凡例

白湯沢山元土場



作業計画図
森林環境保全整備事業（円館地区）
（縮尺 1 : 5,000）

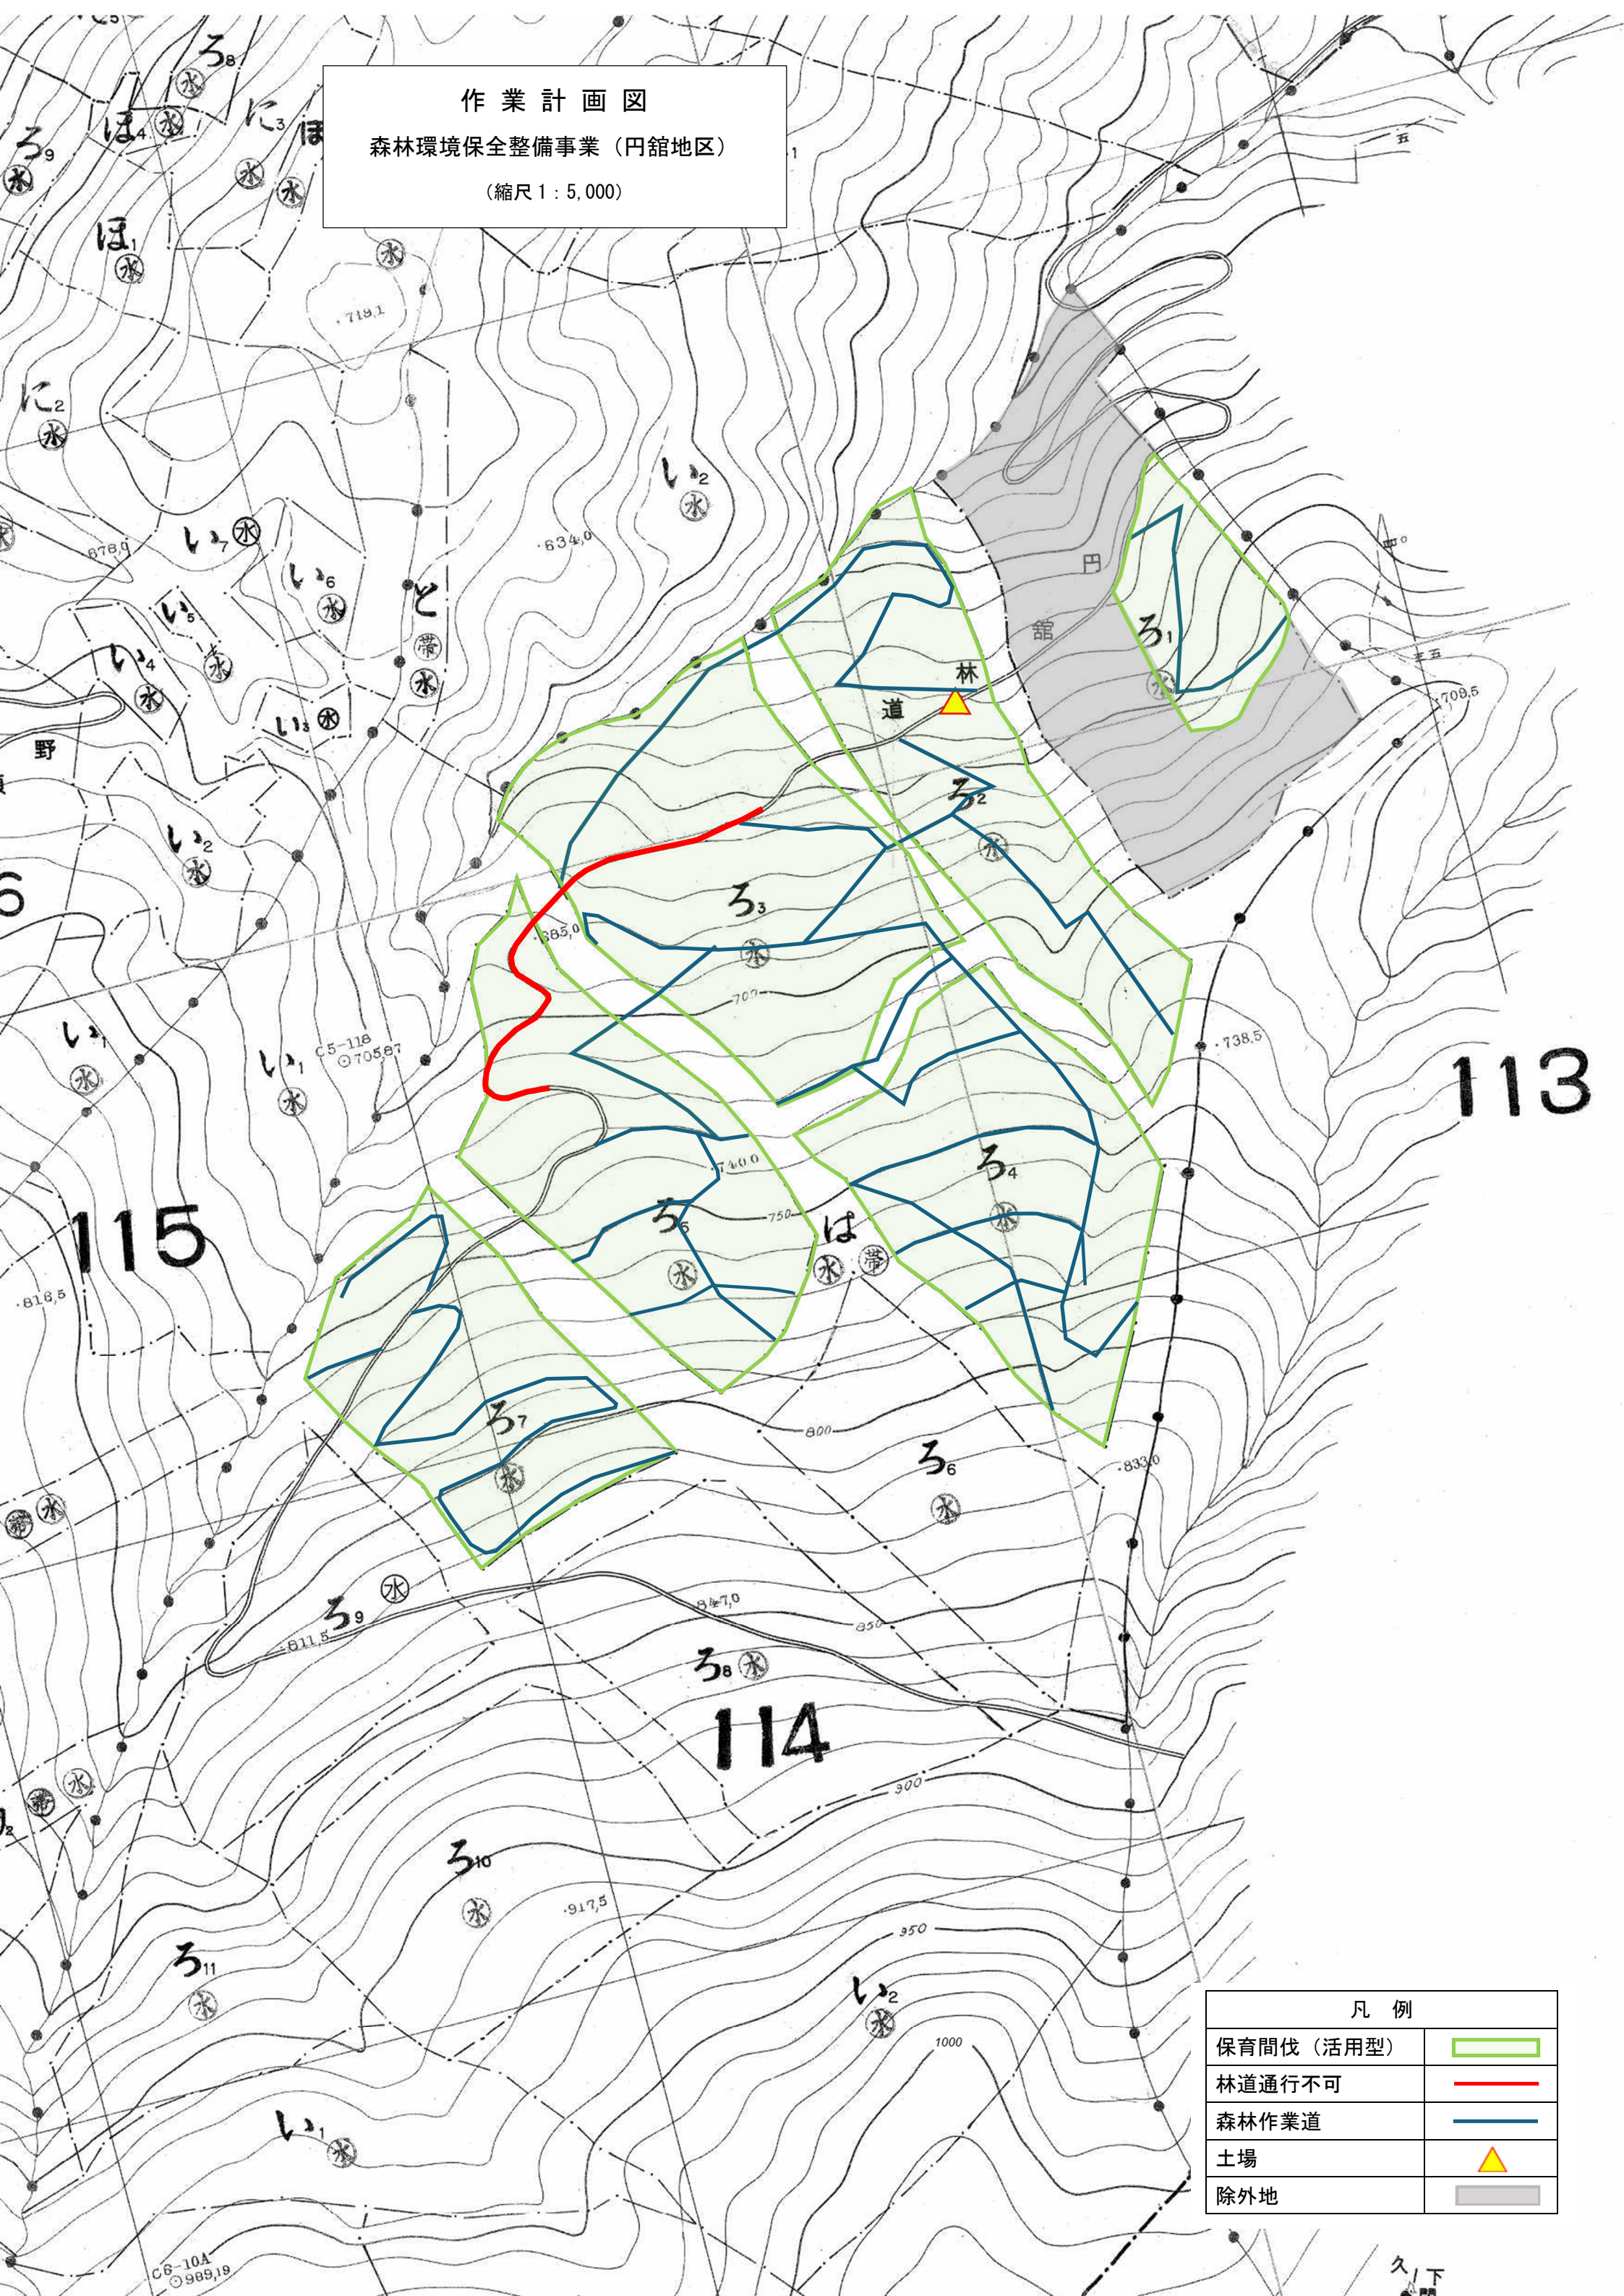

凡 例	
保育間伐（活用型）	
林道通行不可	
森林作業道	
土場	
除外地	
