

(様式6)

令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	三陸中部森林管理署	
物件番号	1	
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(橋野第二国有林外)	


林小班	保安林 種別等	主要樹種	林 齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐 採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量													最寄り市町村 からの距離 km	備 考				
									本数	材積 m ³	m ³ /本 m ³	N m ³	L m ³	計 m ³	伐倒		集・造材		小運搬巻立					森林作業道作設		林地保全				土場 作設等 h	砂利 数量 m ³	薬剤 散布 (アセバ イ)	鉄板 規格*枚数
															方法	数量 m ³	方式	数量 m ³	フォワーダ 片道運搬距離 m	数量 m ³	クラップル付きトラク 片道運搬距離 m	数量 m ³	林地傾斜 緩・中・急 m	延長 m	2種 編柵 m	緑化 m ²							
403は1	水涵保	トドマツ	80	一般	皆伐	4.47	100	24	2,284	977	0.43	352	259	611	全木	977	プロセッサ	611	258	611			中				BH0.45 40	RC-80 100			大槌町 役場	18.7	樋付:カラコン9250本(2200本/ha)
368は1	水涵保	スギ	81	保護伐	定性間伐	4.71	33	20	2,210	777	0.35	392	28	420	全木	777	プロセッサ	420	323	420	5,300	420	緩				RC-80 50			大槌町 役場	27.9		
368は3	水涵保	スギ	81	保護伐	定性間伐	1.78	33	20	837	293	0.35	158	0	158	全木	293	プロセッサ	158	601	158	5,300	158	中										
368は4	水涵保	スギ	31	保護伐	定性間伐	0.47	33	16	359	74	0.21	39	0	39	全木	74	プロセッサ	39	769	39	5,300	39	緩										
合計						11.43			5,690	2,121	0.37	941	287	1,228		2,121		1,228		1,228		617		2,750		40	150						

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩:0° ～20°、中:20° ～30°、急:30° 以上
4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
5 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編柵および沢については、作業計画図に図示する。
7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。



製品生産及び森林環境保全整備事業（橋野第二国有林外）

位置図

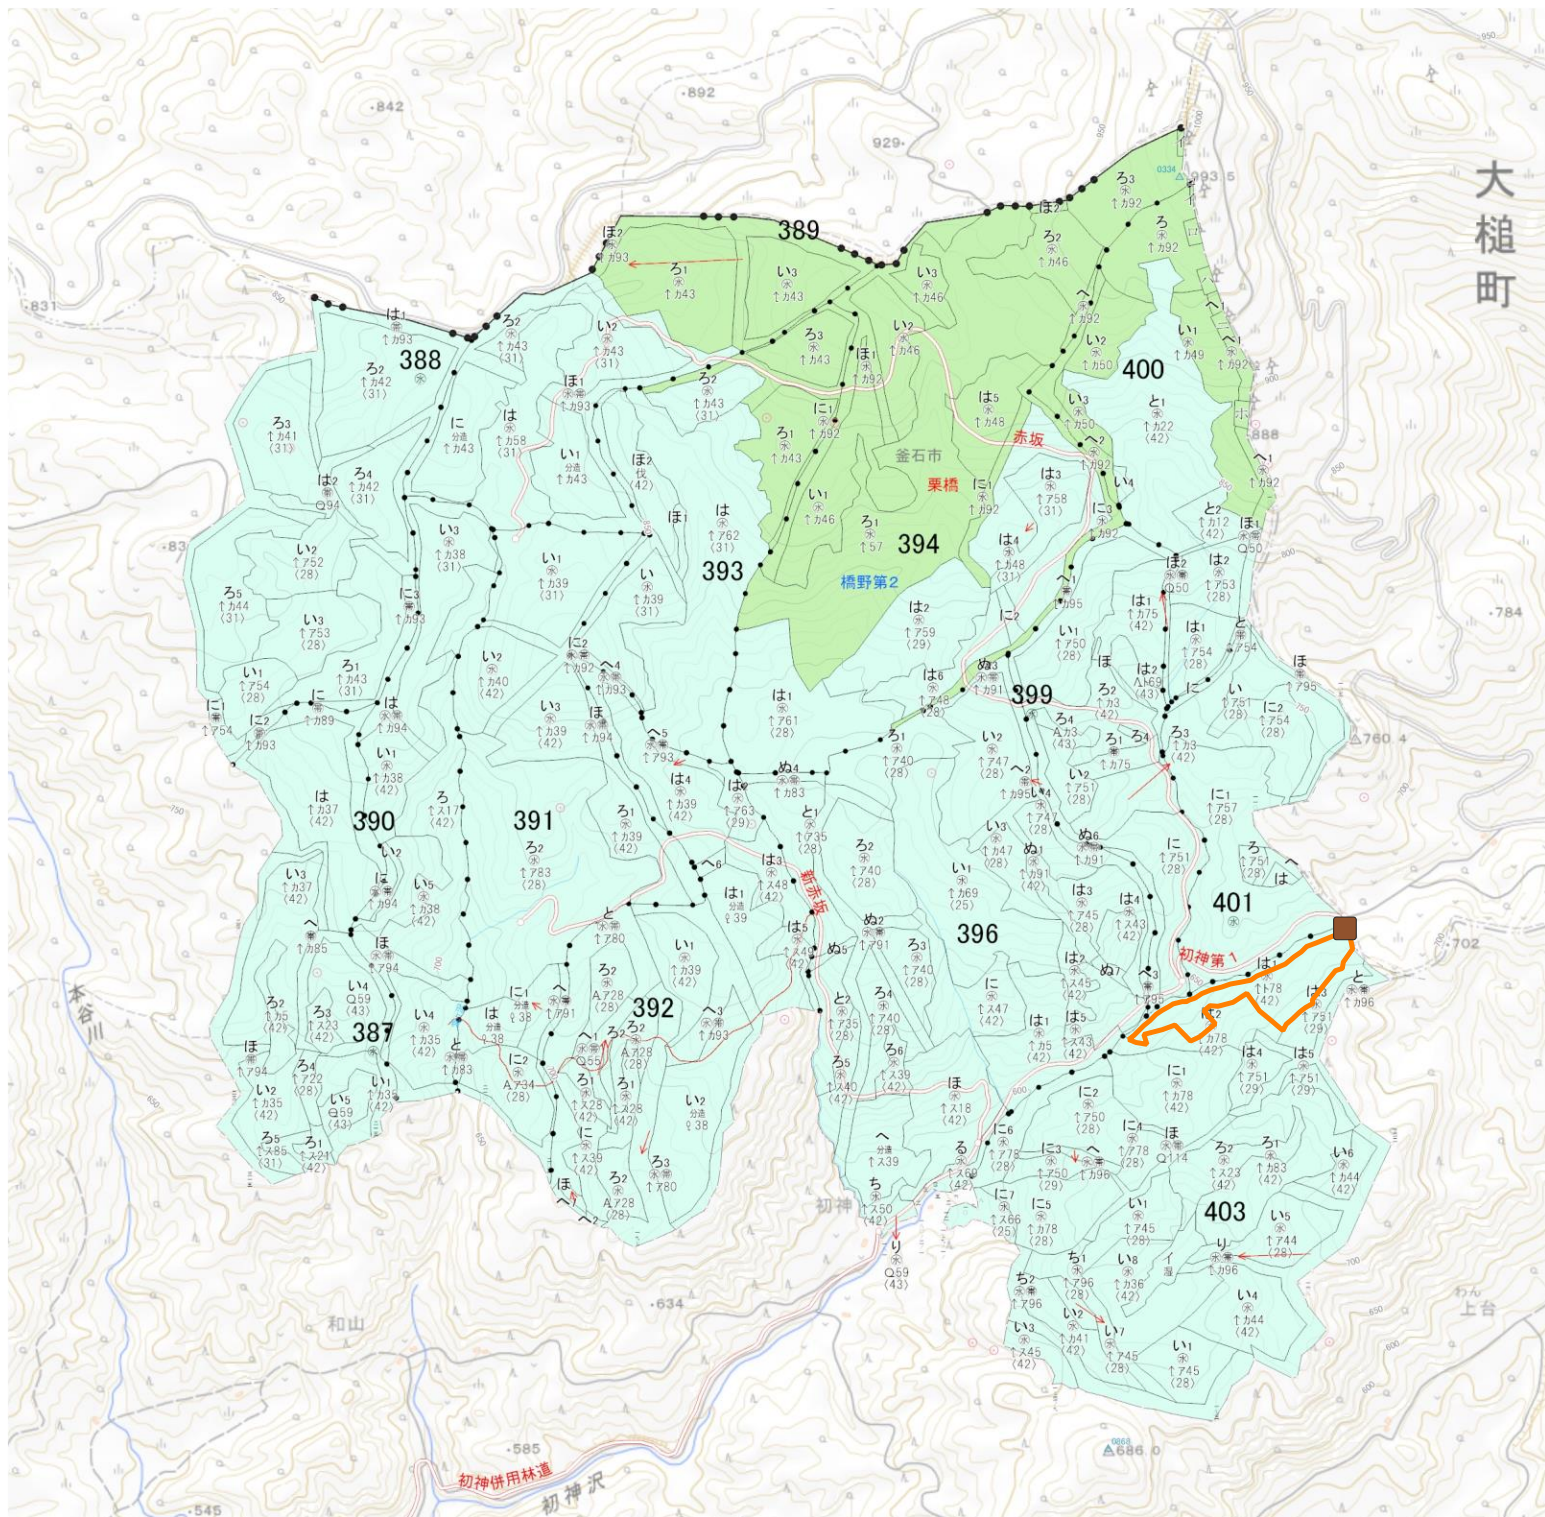


凡例

- 皆伐
- 間伐（保護伐）
- 土場

0 250 500 m

製品生産及び森林環境保全整備事業（橋野第二国有林外）

位置図

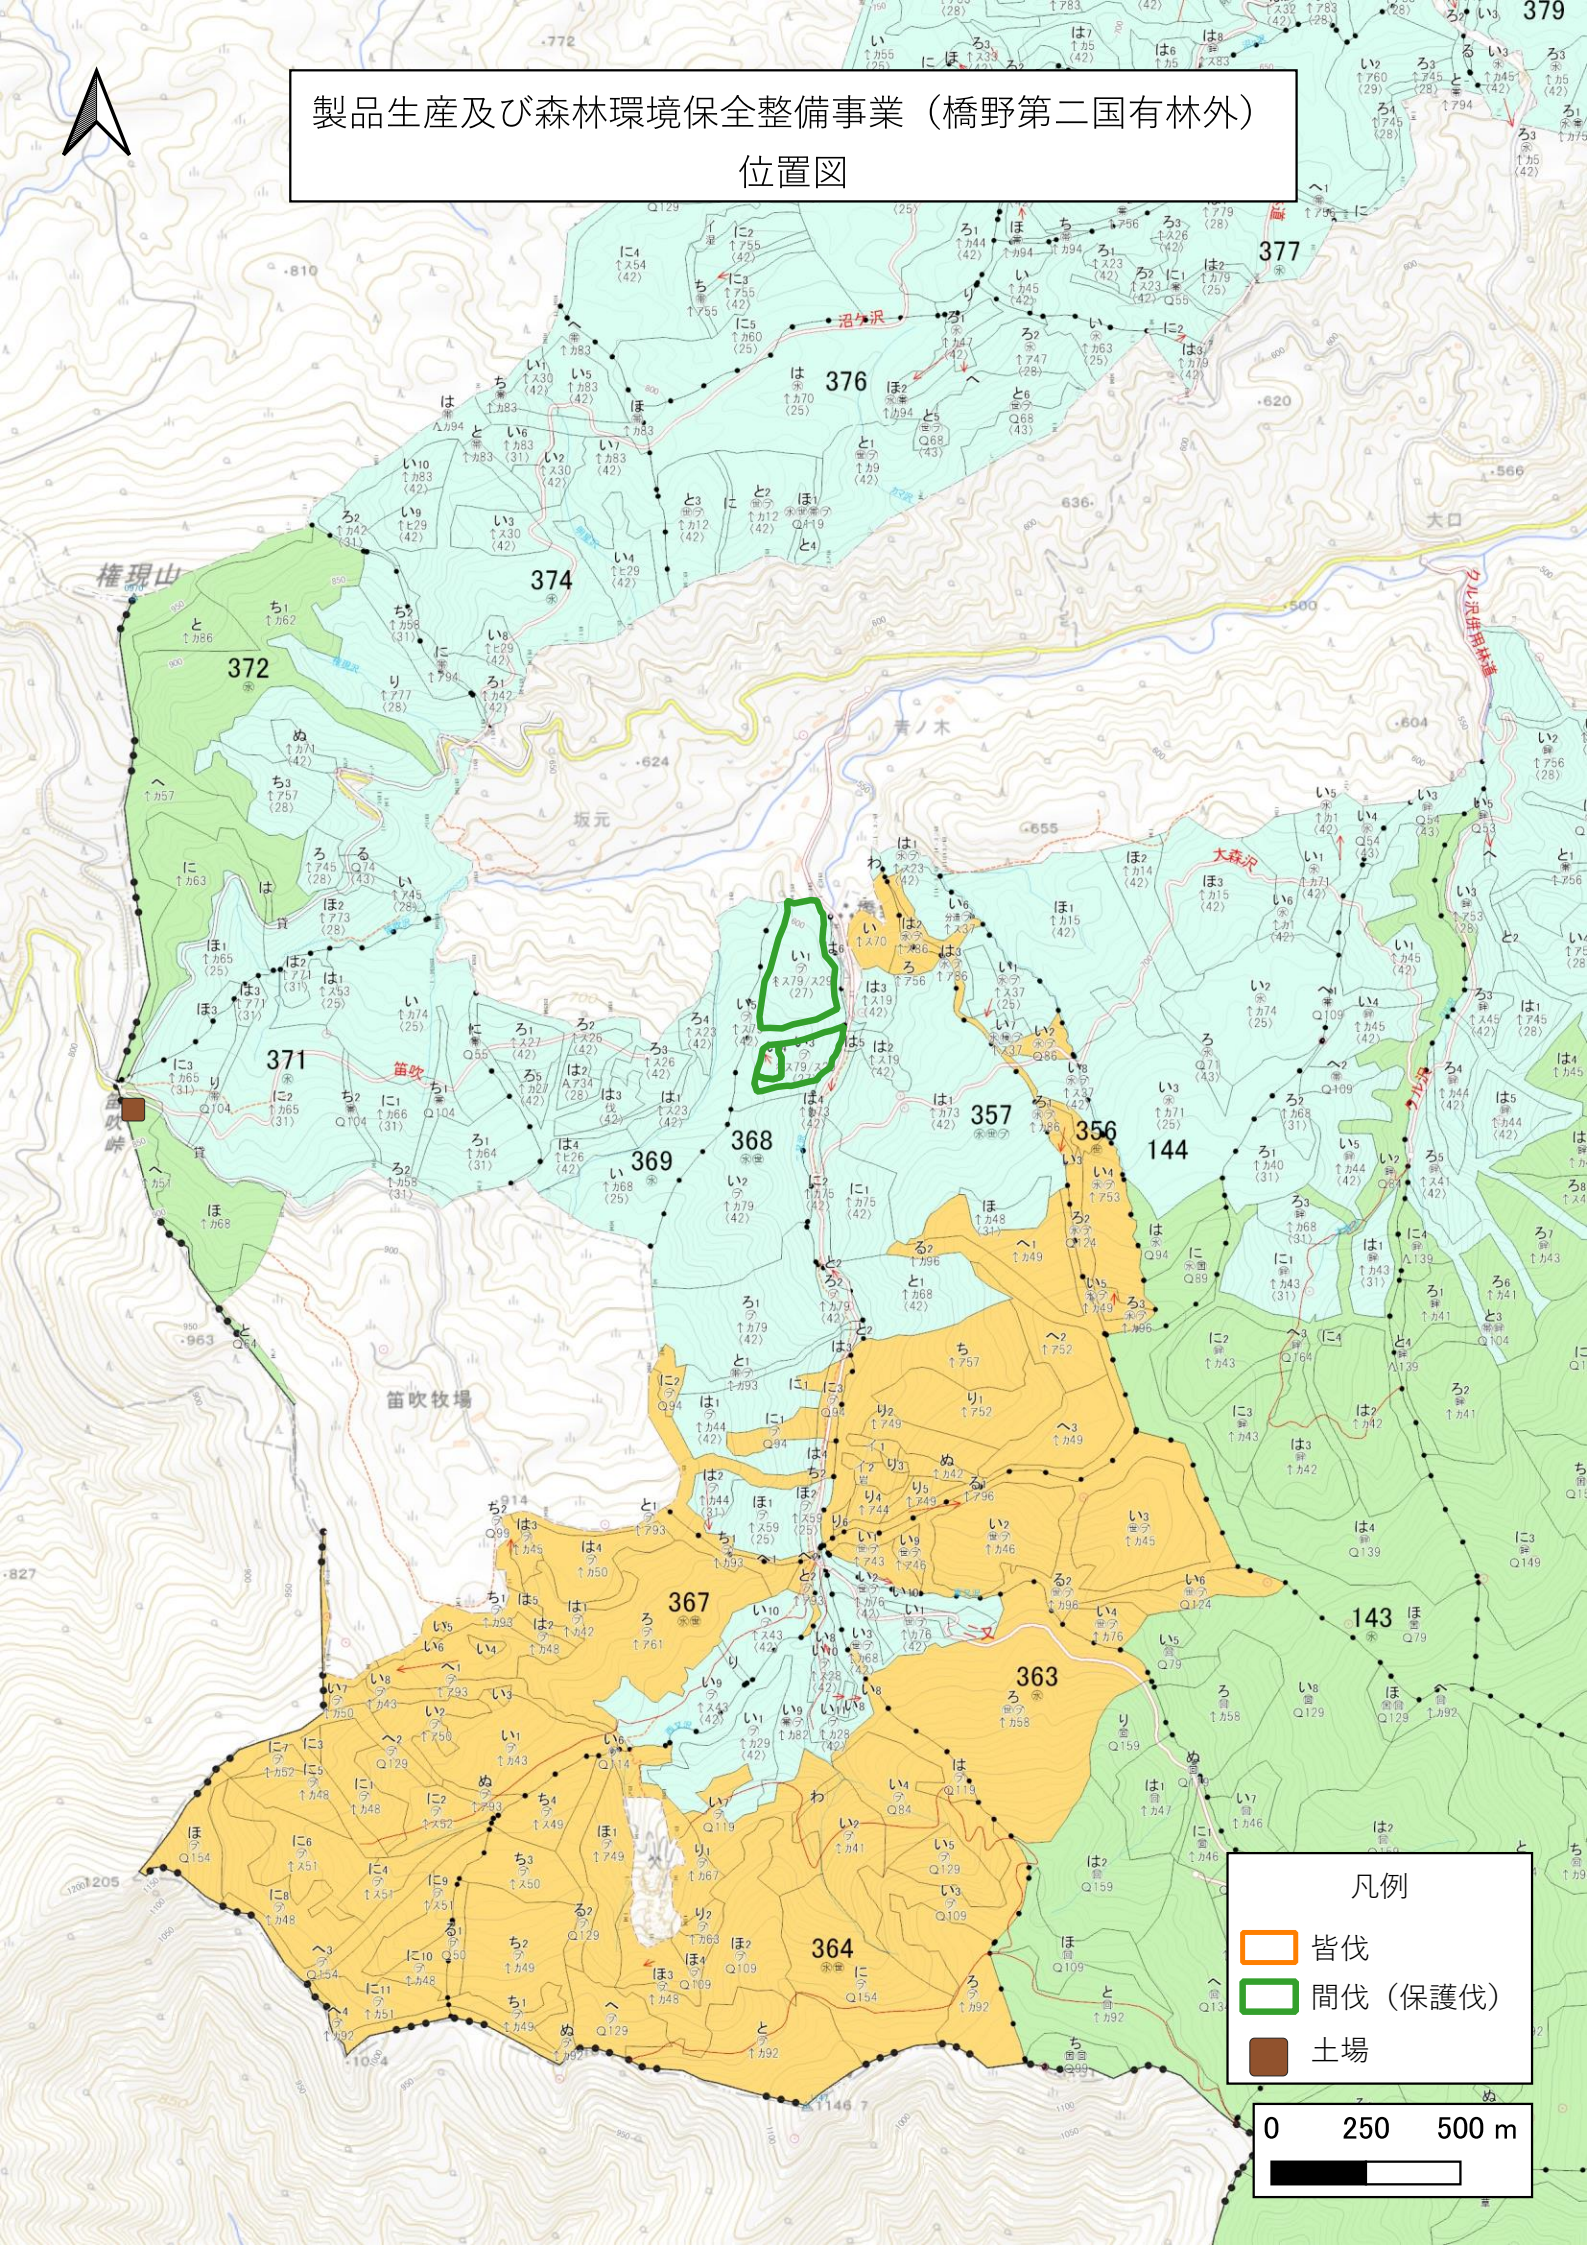


凡例

- 皆伐
- 間伐（保護伐）
- 土場

0 250 500 m

森林環境保全整備事業（橋野第二国有林外）
作業計画図

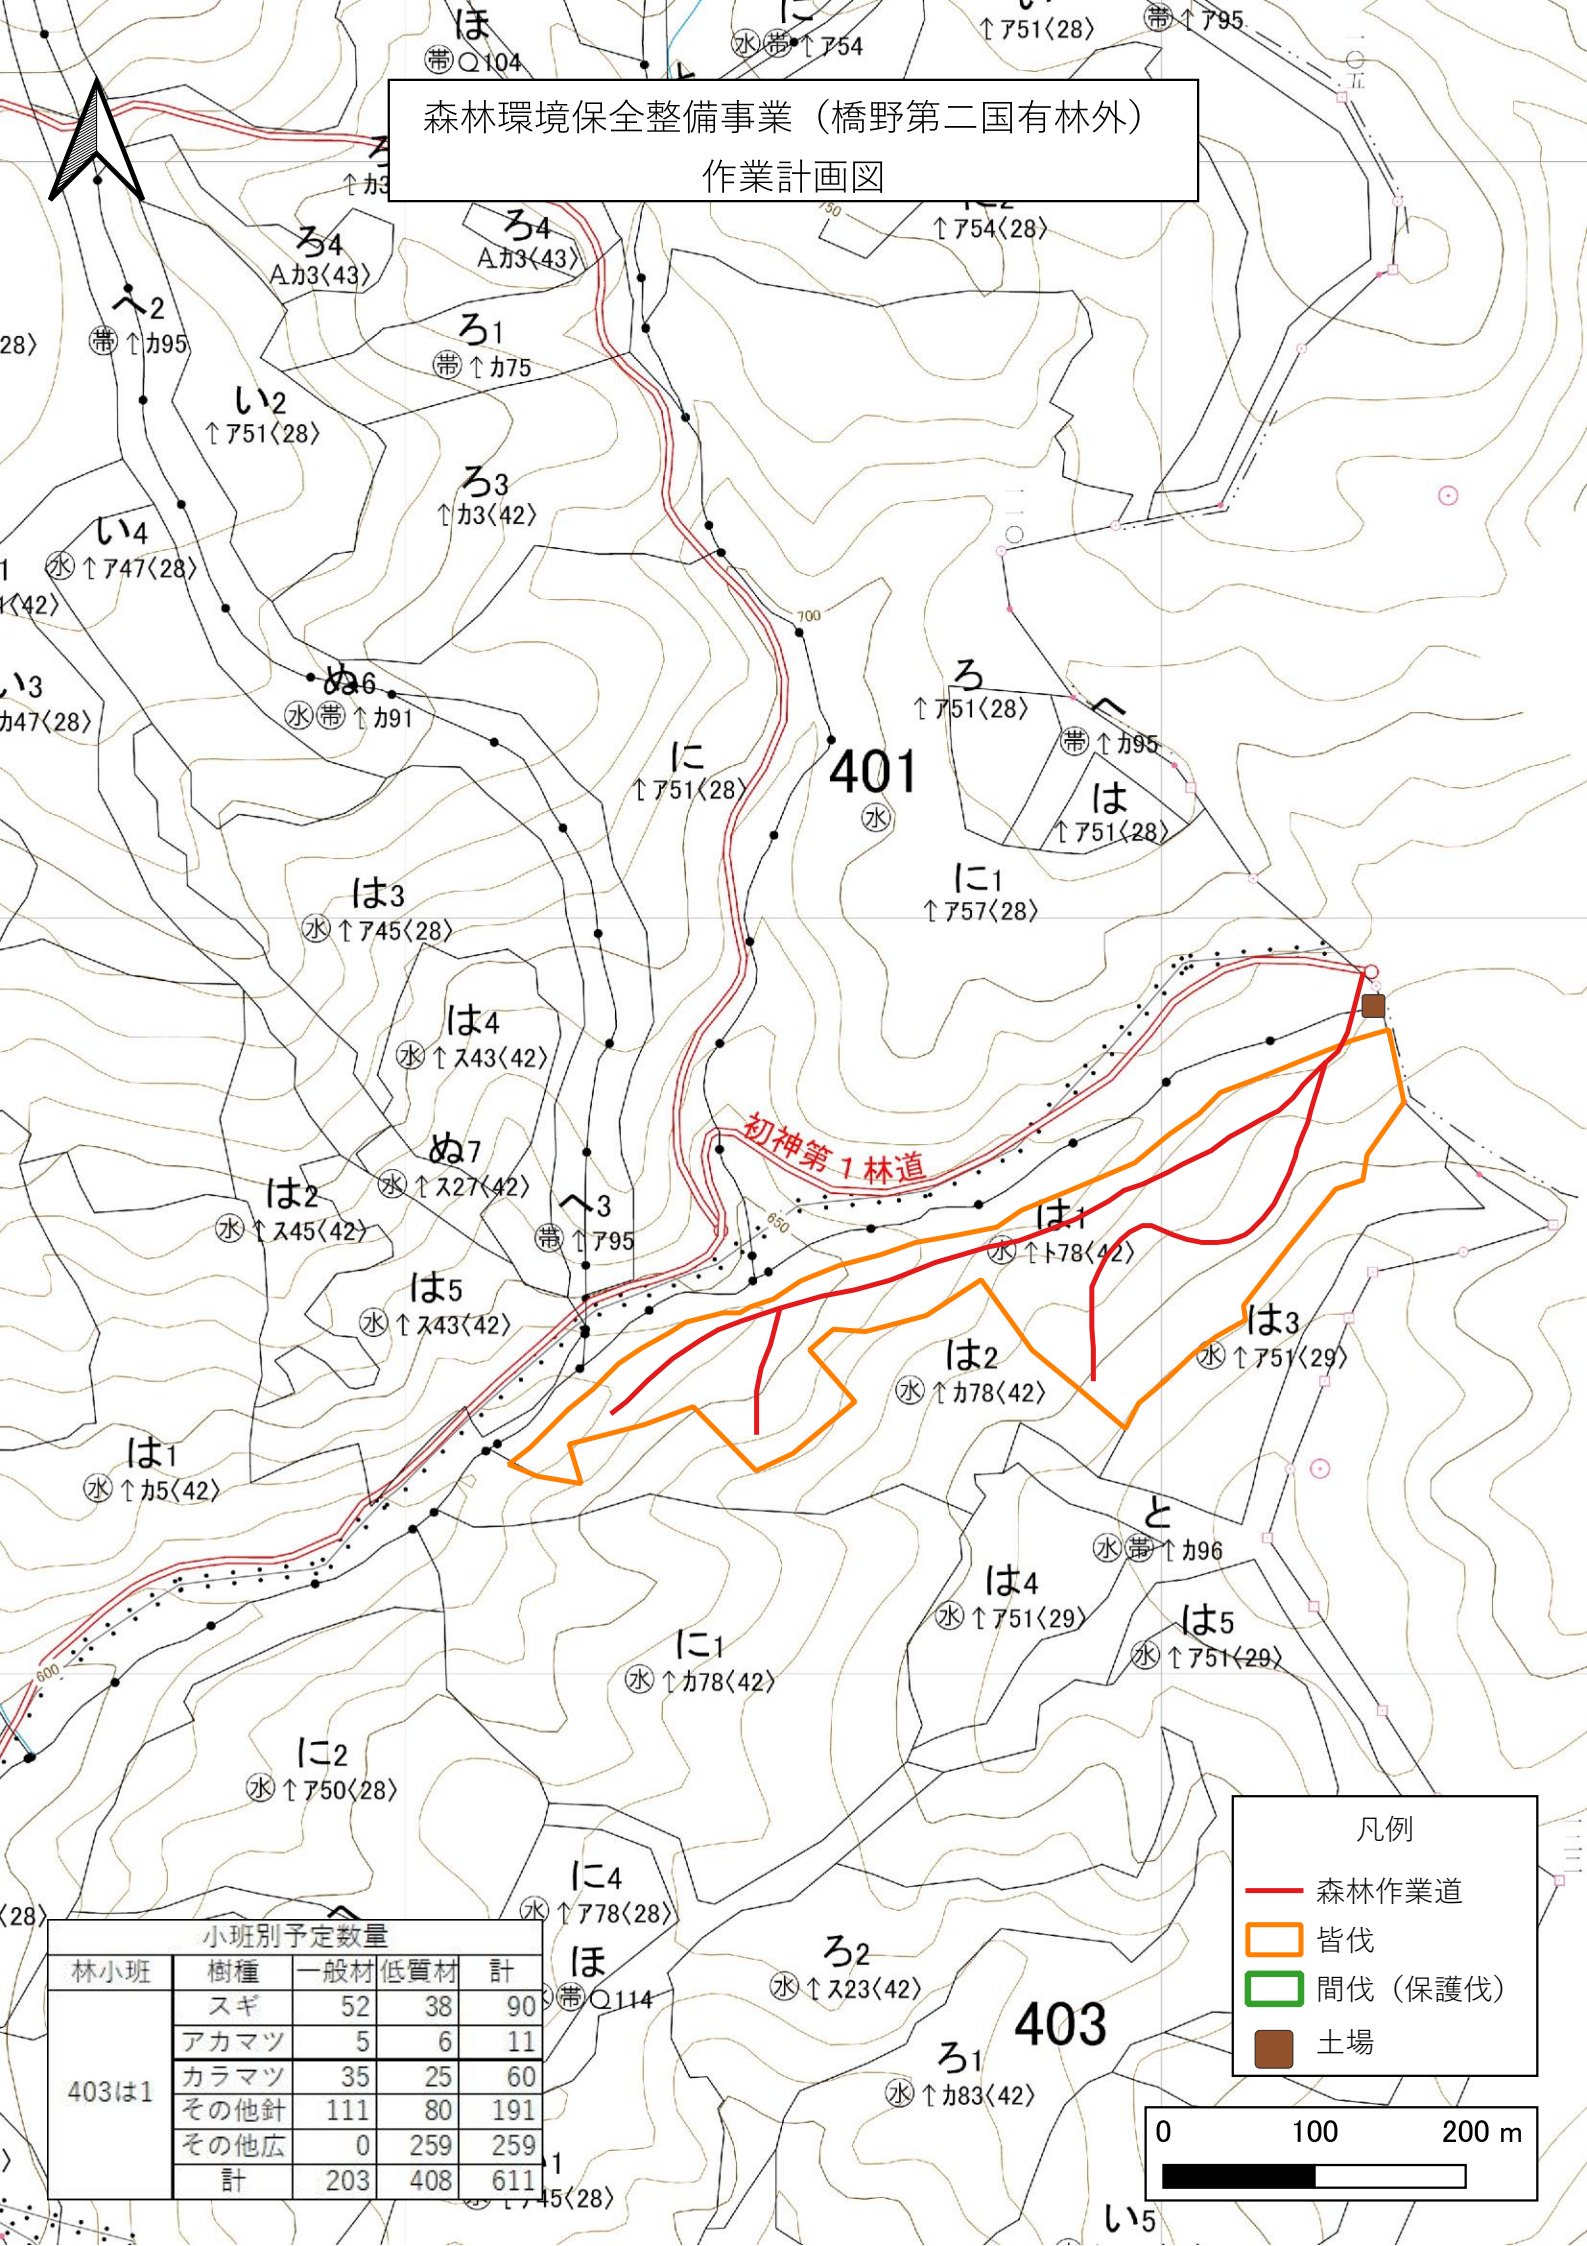



小班別予定数量				
林小班	樹種	一般材	低質材	計
403は1	スギ	52	38	90
	アカマツ	5	6	11
	カラマツ	35	25	60
	その他針	111	80	191
	その他広	0	259	259
	計	203	408	611

凡例

- 森林作業道
 皆伐
 間伐（保護伐）
 土場

0 100 200 m



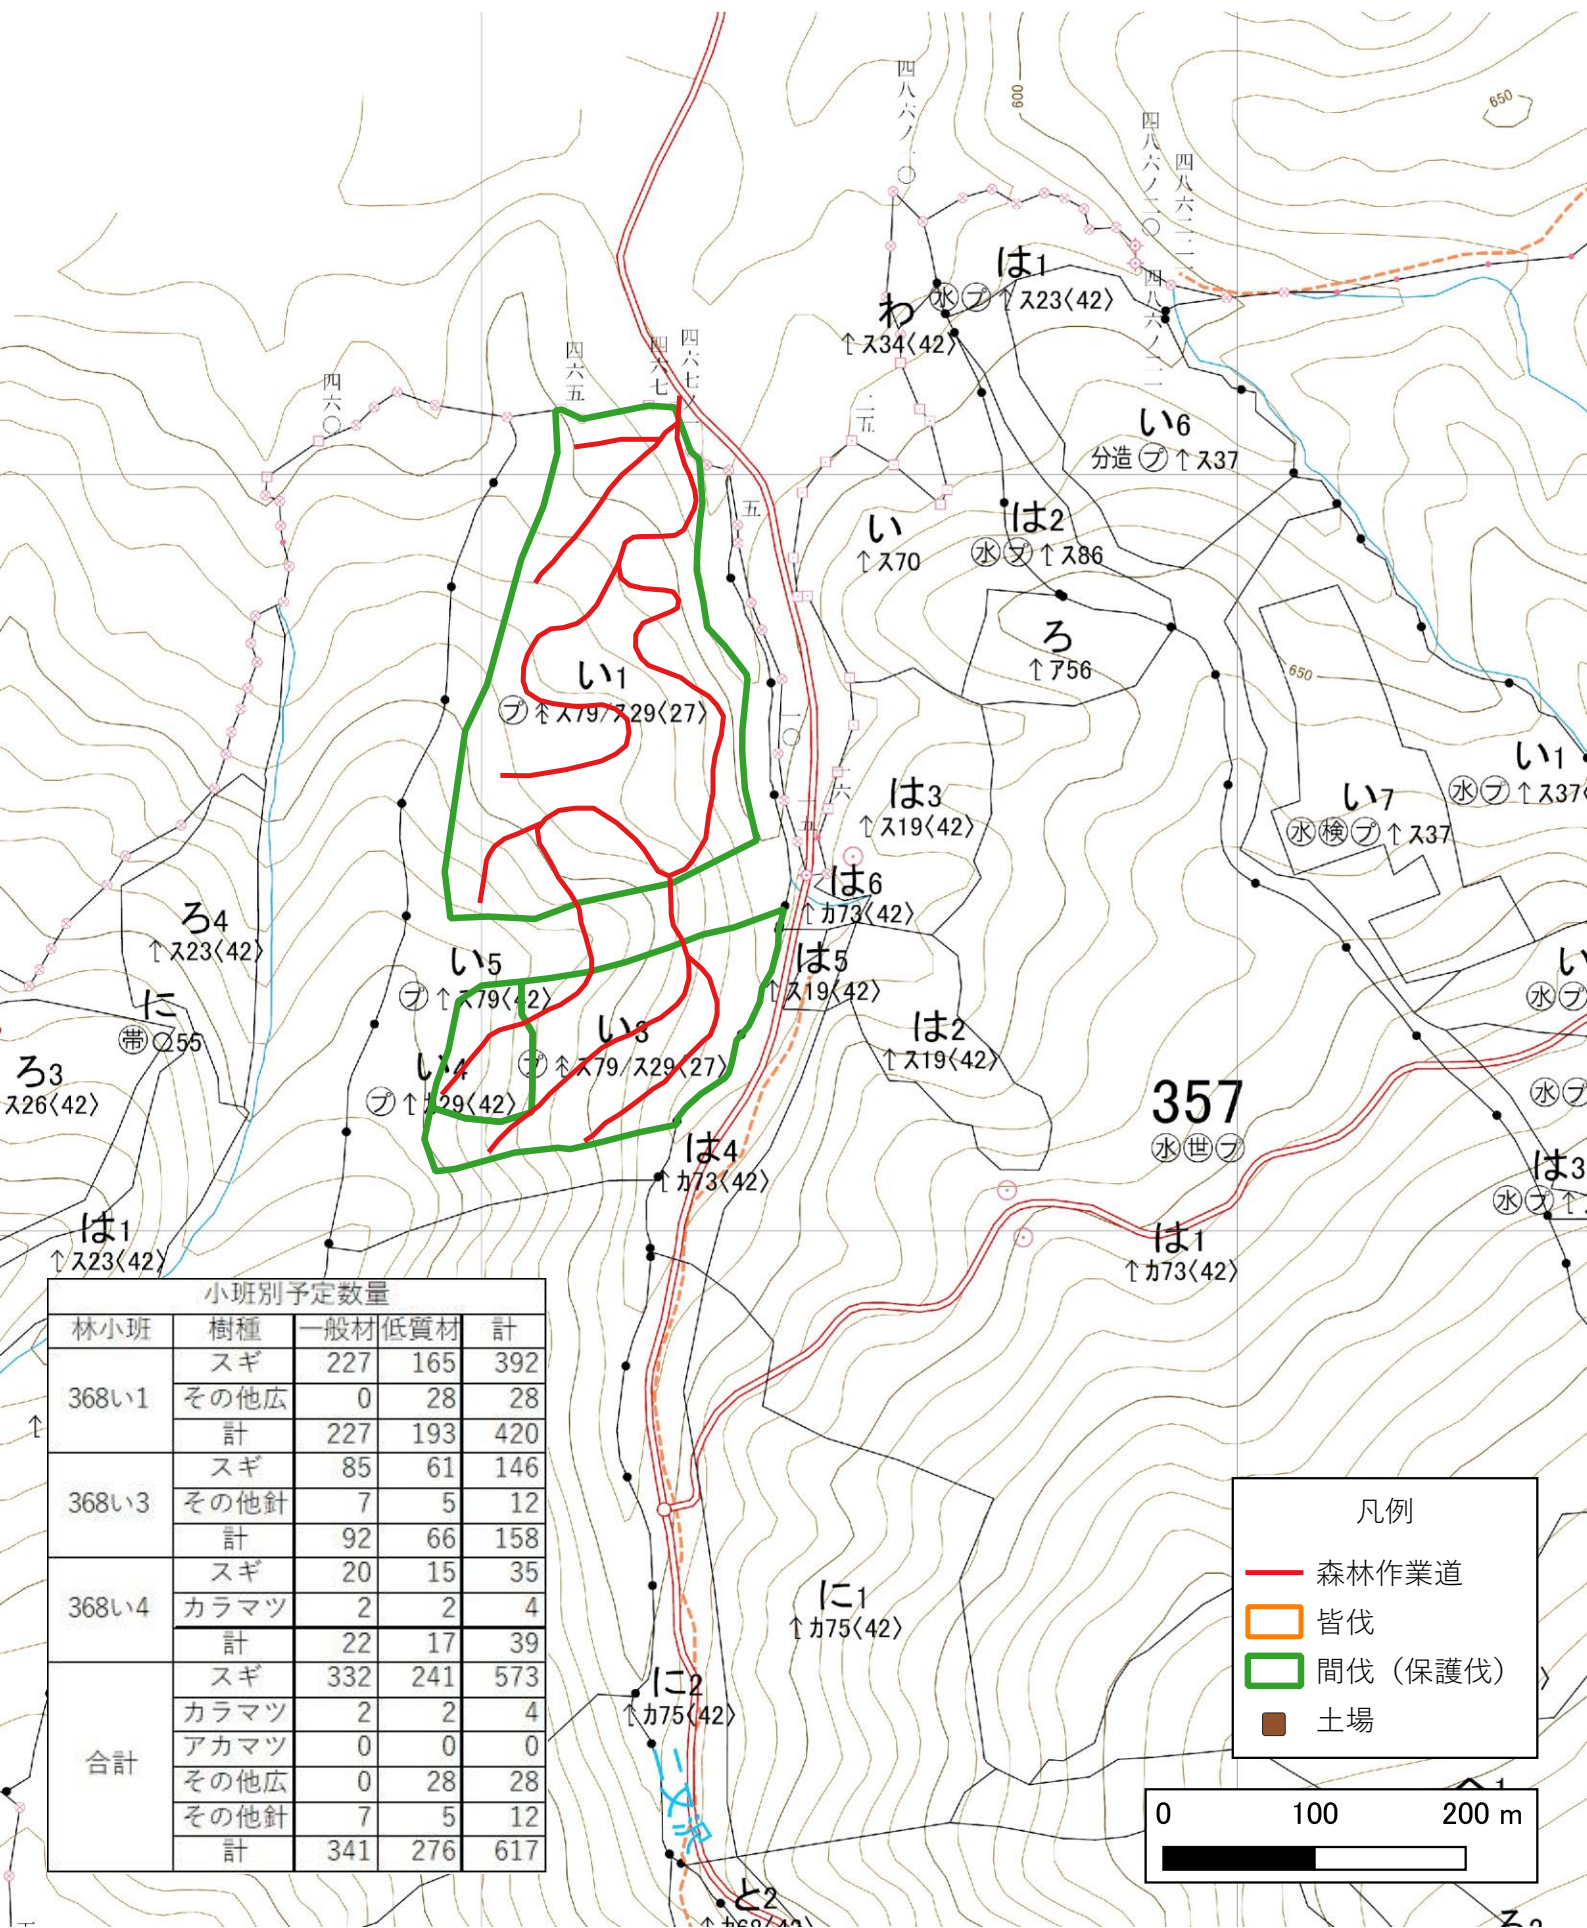

検知業務請負作業内訳書

単位：m³

物件番号	材種	作業工程	予定数量	備考
1号	素材	(1)の業務	368	
		(2)の業務	176	
		(3)の業務	0	
		(4)の業務	0	
		(5)の業務	684	
		計	1228	

注1 各物件の内訳数量を、検知業務請負契約の作業内容毎に基づき記載すること。

検知業務請負（作業内容）

- (1)の業務 素材の長級・径級を測定、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (2)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行い、指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (3)の業務 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示を行う作業、トラック運材の積み込み本数を確認し送状に記載・交付する作業、及び最終貯木土場において指定野帳に記入し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。
- (4)の作業 素材の長級・径級を測定、品等格付け、木口表示、材積計算を行い、送状（概算引渡物件明細書）を交付し、スプレーの塗布を行う作業。
- (5)の作業 低質材及び低評価一般材の層積検知（縦、横、高さを測る）を行い指定野帳に記載し、巻立標示板の貼り付け、スプレーの塗布を行う作業。

◎ 機械地拵条件因子表

[illegible]

◎ 植付条件因子表

[illegible]
