



令和7年度 林分条件調査表

森林管理署	岩手南部森林管理署遠野支署
物件番号	1
物件名	森林環境保全整備事業(西恩徳国有林外)


林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均胸高直径 cm	立木資材量			生産量			予定作業量														最寄り市町村からの距離 km	備考												
									材積			計			伐倒		集・造材		小運搬巻立				森林作業道作設		林地保全		土壌作設等				薬剤散布 (スミ)	鉄板規格・枚数										
									本数	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> /本	N	L	計	方法	数量	方式	数量	フォワーダ片道運搬距離 m	数量	トラブル付きトラック片道運搬距離 m	数量	林地傾斜 緩・中・急	延長 m	2種編組 緑化	m	h	砂利数量 m <sup>3</sup>														
58へ1	水涵保	アカマツ	61	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	13.48	33	22	2,431	1,075	0.44	344	346	690	全木	1,075	プロセッサ	690	684	690	2,600	690	緩														設置・撤去(3m×36枚)	遠野市役所	20.0			
58へ2	水涵保	スギ	60	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	11.26	33	22	2,212	1,090	0.49	474	286	760	全木	1,090	プロセッサ	760	1,063	760	2,600	760	中																遠野市役所	20.0		
58へ3	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.78	33	24	281	152	0.54	75	25	100	全木	152	プロセッサ	100	1,031	100	2,600	100	急																遠野市役所	20.0		
58へ4	水涵保	カラマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	1.20	33	20	282	106	0.38	70		70	全木	106	プロセッサ	70	1,206	70	2,600	70	中																遠野市役所	20.0		
58へ5	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.02	33	20	941	459	0.49	309	1	310	全木	459	プロセッサ	310	1,256	310	2,600	310	中																遠野市役所	20.0		
247L1	水涵保	スギ	60	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	9.41	25	22	2,021	1,058	0.52	631	19	650	全木	1,058	プロセッサ	650	448	650	2,100	650	緩													設置・撤去(3m×36枚)	遠野市役所	12.6	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり			
247L2	水涵保	スギ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	5.18	25	22	1,116	585	0.52	331	9	340	全木	585	プロセッサ	340	300	340	2,100	340	中																遠野市役所	12.6	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり	
247L3	水涵保	アカマツ	58	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	1.41	25	18	443	125	0.28	62	3	65	全木	125	プロセッサ	65	500	65	2,100	65	中																遠野市役所	12.6	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり	
249L2	水涵保	スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	6.89	25	18	2,972	919	0.31	554	16	570	全木	919	プロセッサ	570	392	570	2,100	570	緩																遠野市役所	12.6	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり	
249L4	水涵保	アカマツ	59	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	17.23	25	20	3,801	1,704	0.45	900	35	935	全木	1,704	プロセッサ	935	368	935	2,100	935	緩																遠野市役所	12.6	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり	
249は	水涵保	スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.23	25	24	72	38	0.53	25		25	全木	38	プロセッサ	25	173	25	2,100	25	中																遠野市役所	12.6		
249に	水涵保	スギ	40	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.27	25	24	83	45	0.54	30		30	全木	45	プロセッサ	30	98	30	2,100	30	中																遠野市役所	12.6		
249ほ	水涵保	スギ	41	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.44	25	24	135	73	0.54	50		50	全木	73	プロセッサ	50	469	50	2,100	50	中																遠野市役所	12.6		
249へ1	水涵保	アカマツ	36	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐3残)	0.42	25	20	101	34	0.34	10		10	全木	34	プロセッサ	10	618	10	2,100	10	緩															遠野市役所	12.6	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり		
704は2		スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.26	33	18	2,202	736	0.33	414	21	435	全木	736	プロセッサ	435	148	435																設置・撤去(3m×36枚)	大迫支所	10.5	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり			
704は3		スギ	38	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.56	33	22	1,100	483	0.44	330		330	全木	483	プロセッサ	330	144	330	900	330	中																大迫支所	10.5		
704は4		スギ	45	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.64	33	20	1,058	398	0.38	268	2	270	全木	398	プロセッサ	270	129	270	900	270	緩																大迫支所	10.5	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり	
704は6		スギ	38	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	3.6	33	22	1,553	680	0.44	465		465	全木	680	プロセッサ	465	185	465	1,100	465	中																大迫支所	10.5		
704に2		スギ	37	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.10	33	22	905	396	0.44	270		270	全木	396	プロセッサ	270	171	270																			大迫支所	10.5		
705ほ1		アカマツ	52	保護伐	列状間伐(1伐2残)	2.92	33	14	1,139	165	0.14	53	37	90	全木	165	プロセッサ	90	277	90																			大迫支所	10.5	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり	
705ほ3		スギ	56	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.34	33	24	1,870	962	0.51	636	24	660	全木	962	プロセッサ	660	135	660																			大迫支所	10.5		
705ほ4		スギ	54	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	2.40	33	28	641	437	0.68	216	89	305	全木	437	プロセッサ	305	91	305																			大迫支所	10.5		
705へ1		スギ	53	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	11.21	33	24	3,255	1,799	0.55	1,093	112	1,205	全木	1,799	プロセッサ	1,205	308	1,205																			大迫支所	10.5	アカマツの伐採制限(6月~9月)あり 参照:別添林相区画図のとおり	
705へ2		スギ	52	保育間伐(活用型)	列状間伐(1伐2残)	5.38	33	20	1,720	824	0.48	523	42	565	全木	824	プロセッサ	565	92	565																			大迫支所	10.5		
																																								バックホウ(0.45m3)		
																																								砕石(C-80)		
																																								砕石(岩ズリ)		
																																								希釈後の薬剤散布数量 (原液数量、150倍希釈)		
合計						115.83				32,334	14,343	0.44	8,133	1,067	9,200																							3m×36枚 240日				

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。  
2 面積は伐採面積とする。  
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。  
緩:0°~20°、中:20°~30°、急:30°以上  
4 最寄りの市町村役場(支所含む)からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。  
5 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線(既設集材路含む)、編組および沢については、作業計画図に図示する。  
6 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。



森林環境保全整備事業(西恩徳国有林外)  
林相区画図①(長洞第一国有林)  
58林班へ1小班外23

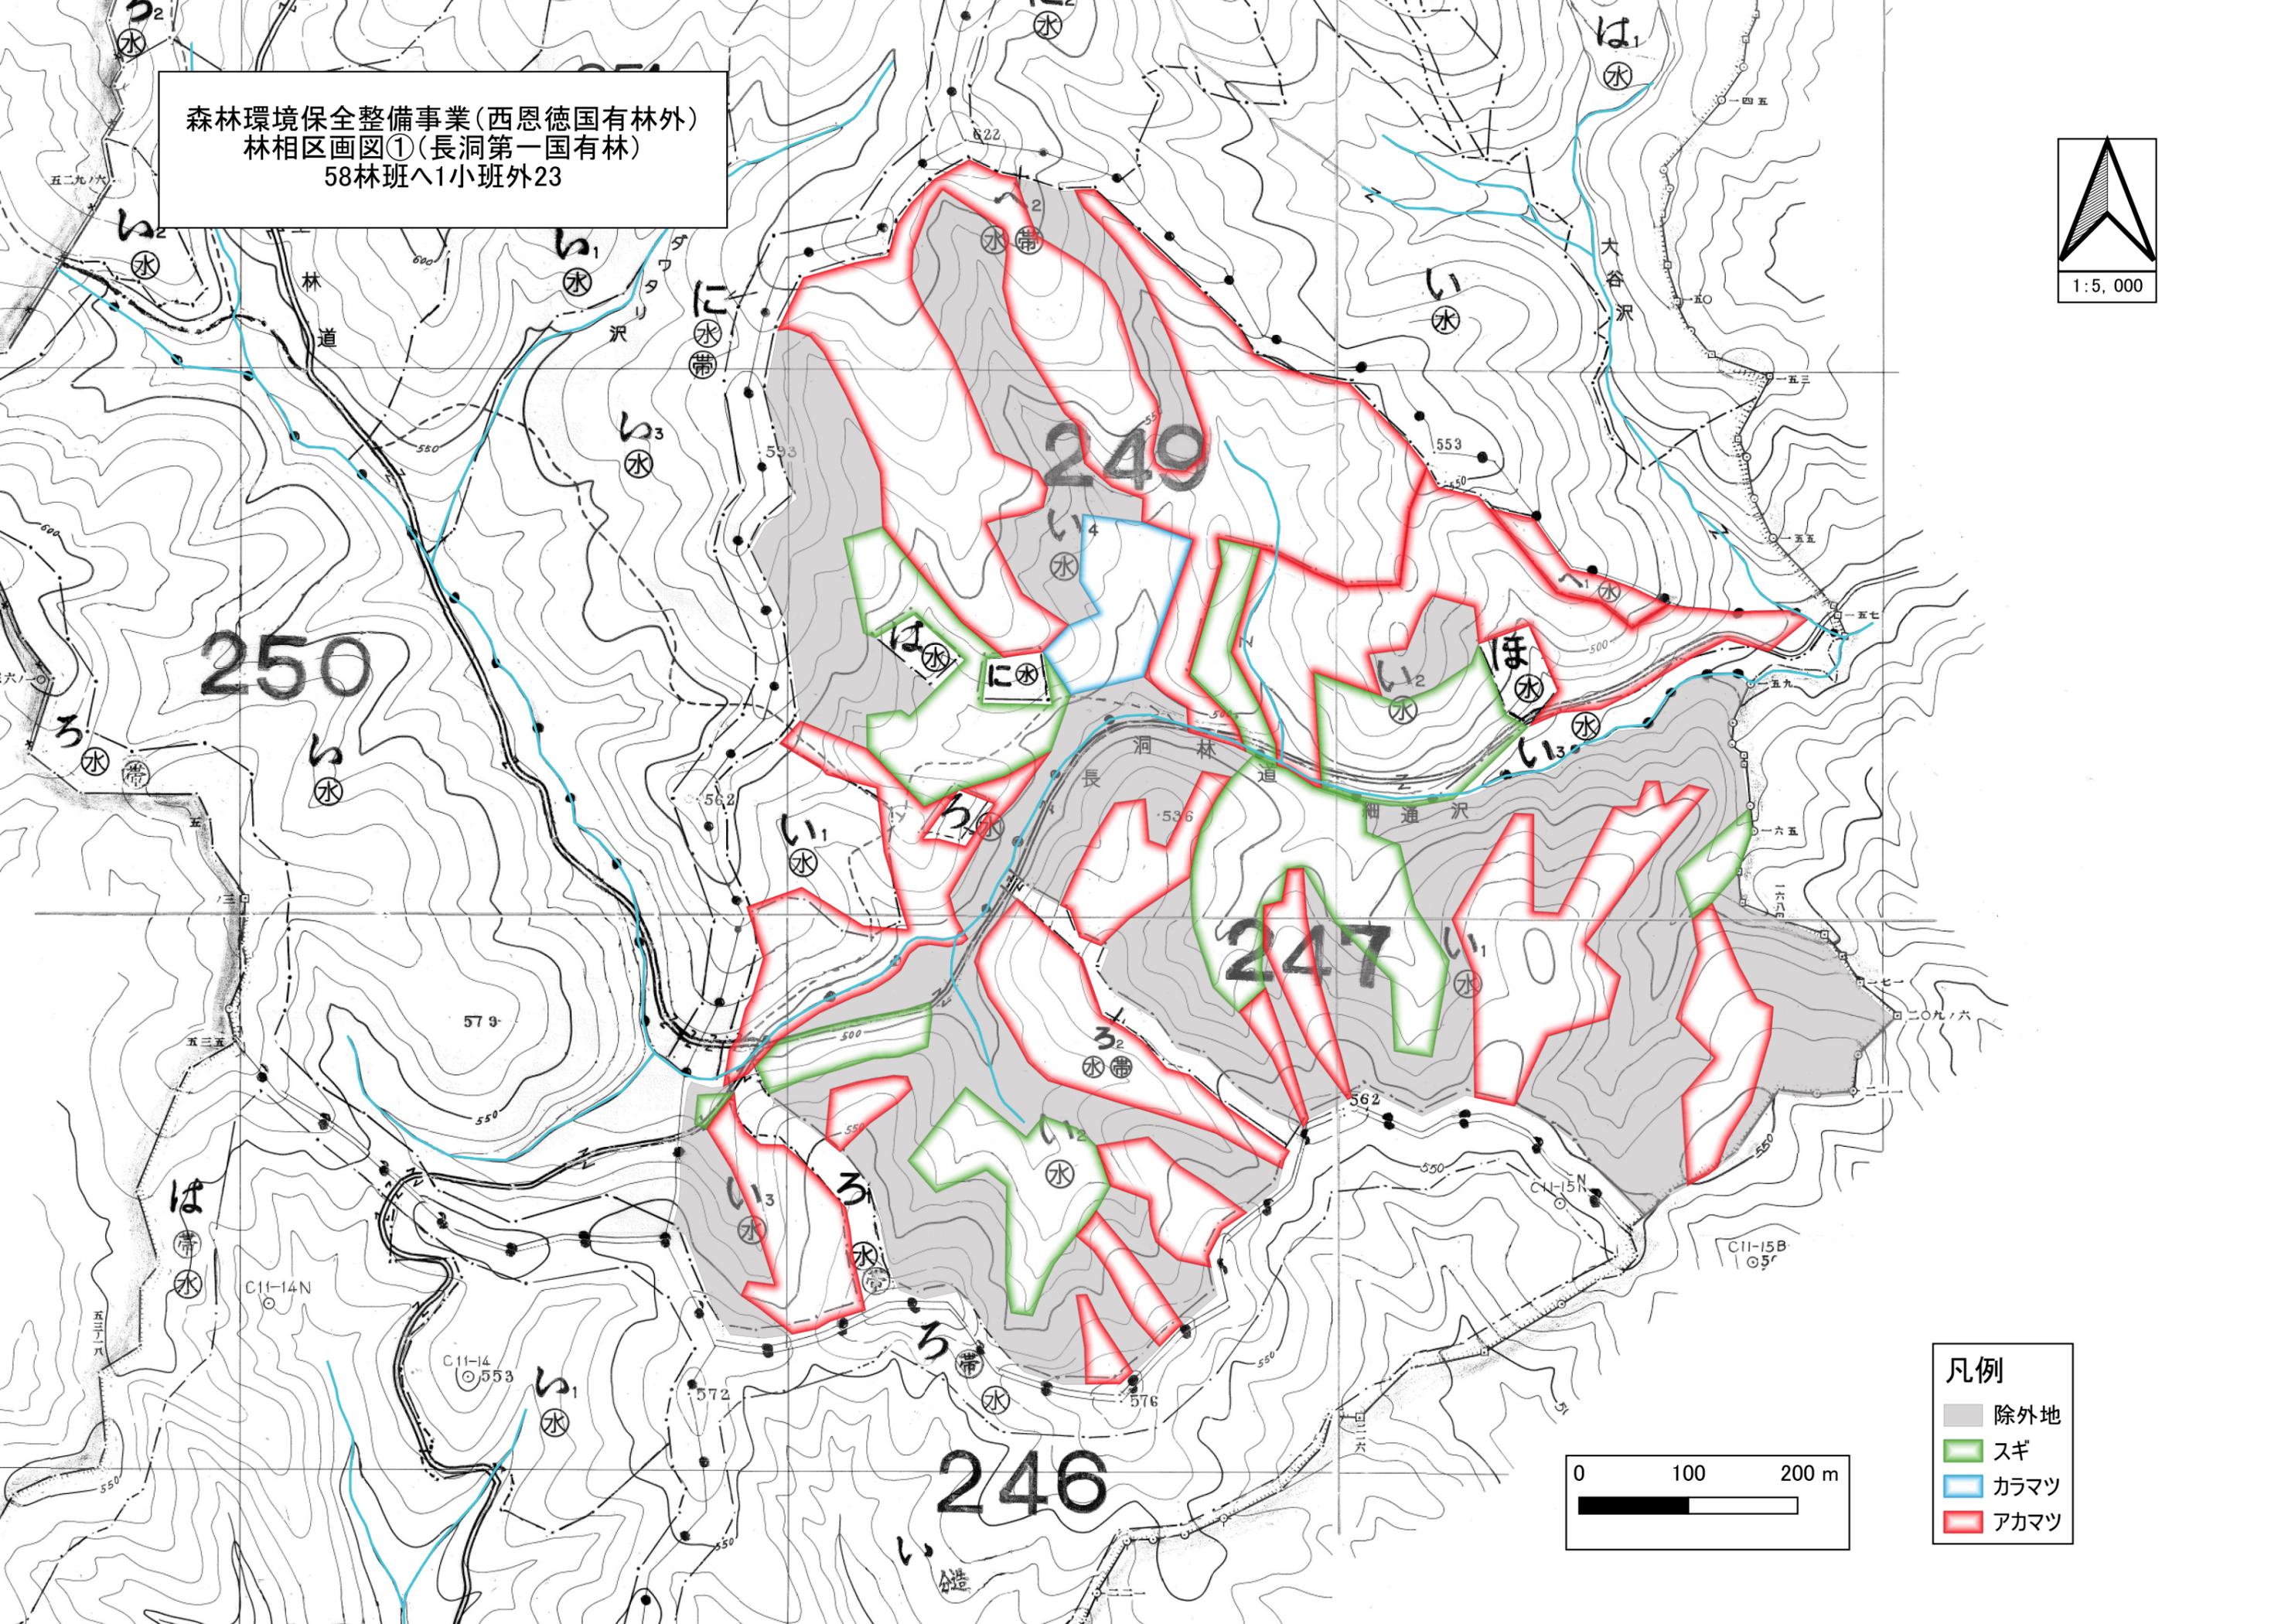


- 凡例
- 除外地
  - スギ
  - カラマツ
  - アカマツ



森林環境保全整備事業(西恩徳国有林外)  
林相区画図②(大沢山国有林)  
58林班へ1小班外23

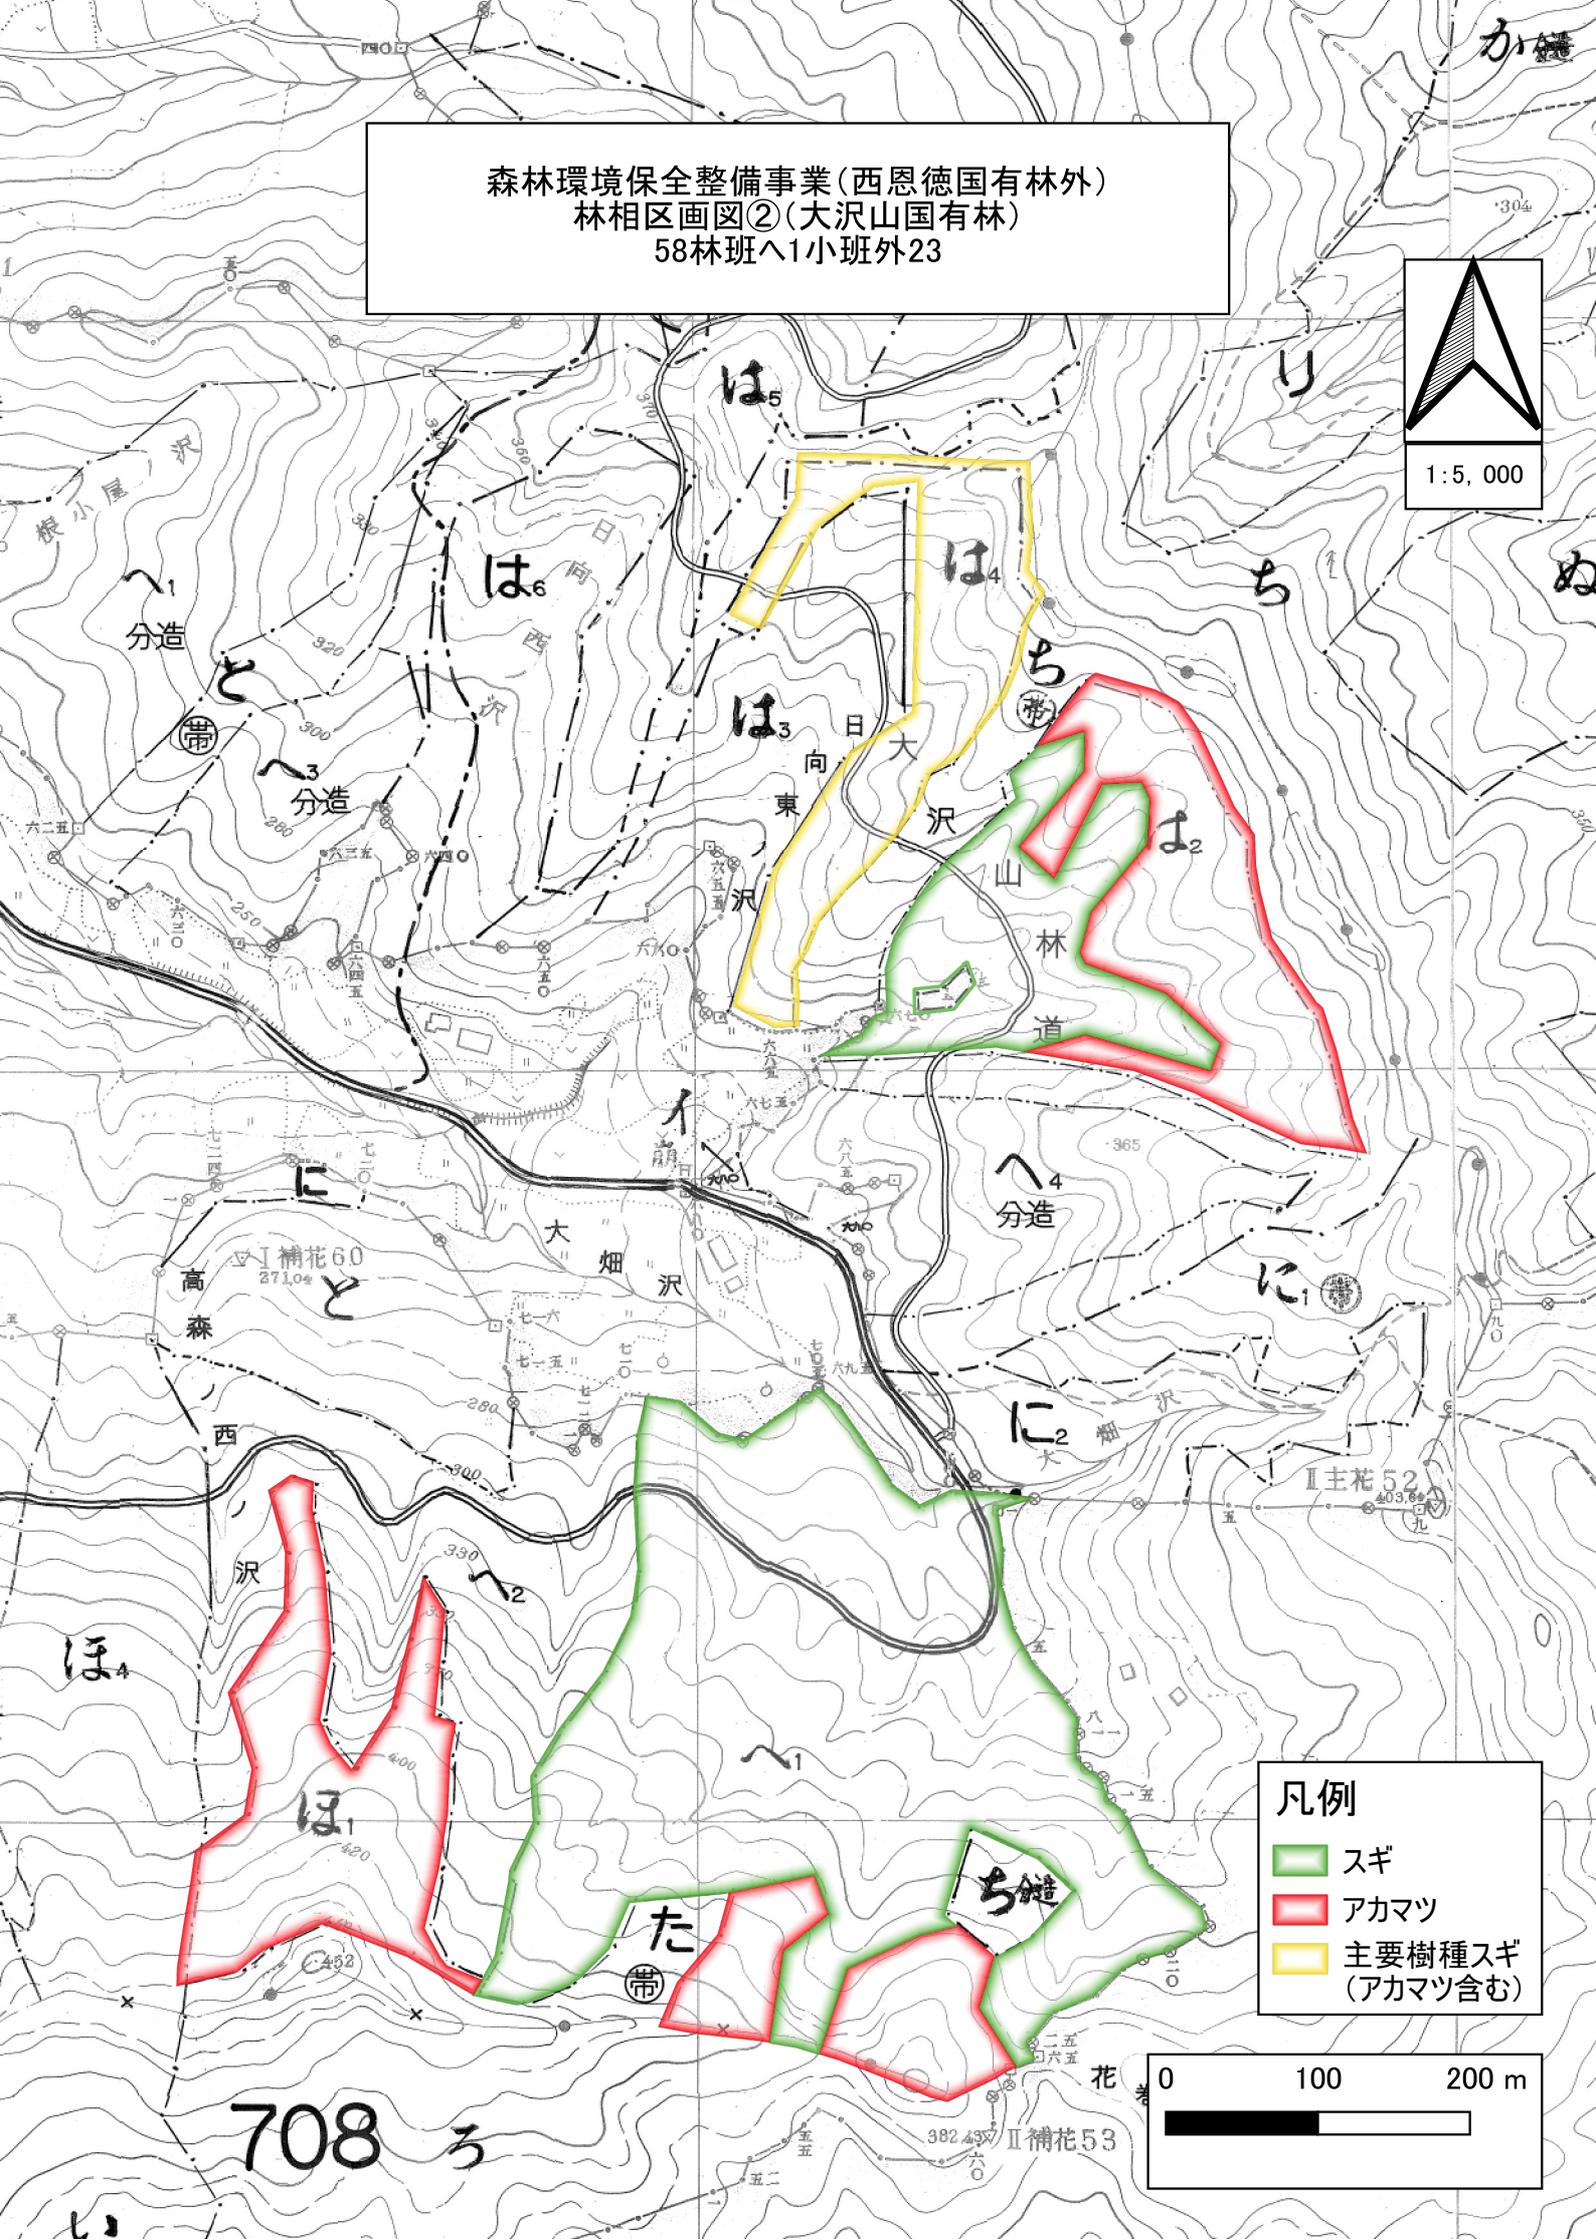

- 凡例
- スギ
  - アカマツ
  - 主要樹種スギ (アカマツ含む)



708 ち
