

(様式6)

令和7年度 森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	5号	事業期間	契約締結日の翌日	～ R7.12.19
物件名	森林環境保全整備事業(馬場目沢外2国有林Ⅰ)			

林小班	保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量														最寄り市町村 からの距離 km		一貫作業	備 考					
									本数 本	材積 m³	立木 1本当り 材積 m³/本	N m	L m	計 m	伐倒		集・造材		小運搬				巻立	森林作業道作設		林地保全		土場 作設等					砂利 数量	薬剤 散布	鉄板 規格×枚数 (日数)		
															方法	数量 m	方式	数量 m	フォワーダ 付トラック 片道運搬距離 m	数量	グラップル 付トラック 片道運搬距離 m	数量	数量	林地 傾斜 度・中・急	延長 m	編組 m	緑化 m	バッチ 0.45 h	C-80 m	スミ バイン g							
1	2037い	水源保	スギ	56	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	11.24	25	28	2,574	2,190	0.85	953	55	1,008	全木	2,190	ブタヤ	1,008	694	1,008	9,800	808	808	中					30	100		6m×40枚 (90日間)	五城目町役場	21.4		直送あり
2	2042い	水源保	スギ	57	誘導伐	複層伐(等・群)	5.05	38	24	4,333	2,439	0.56	1,058	113	1,171	全木	1,171	ブタヤ	1,171	233	1,171	8,100	971	971	中								五城目町役場	21.0	地帯・植付 (5.05ha) スギコン花粉10100本	直送あり	
3	2042ち	水源保	スギ	56	誘導伐	複層伐(等・群)	0.20	41	32	101	111	1.10	50	1	51	全木	51	ブタヤ	51	389	51	6,600	51	51	中								五城目町役場	21.5	地帯・植付 (0.2ha) スギコン花粉400本		
4	2042わ	水源保	スギ	56	誘導伐	複層伐(等・群)	2.12	40	24	2,011	1,281	0.64	535	54	589	全木	589	ブタヤ	589	934	589	6,600	489	489	中								五城目町役場	21.5	地帯・植付 (2.12ha) スギコン花粉4250本	直送あり	
5	2042る	水源保	スギ	53	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.54	25	30	898	806	0.90	358	13	371	全木	806	ブタヤ	371	609	371	6,600	271	271	中								五城目町役場	21.5		直送あり	
6	2042よ	水源保	スギ	51	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	5.33	25	26	1,171	788	0.67	317	14	331	全木	788	ブタヤ	331	1579	331	7,200	231	231	緩								五城目町役場	22.1		直送あり	
7	2042お1	水源保	スギ	116	育成受光伐	複層伐(天)	0.65	16	38	66	96	1.46	54		54	全木	54	ブタヤ	54	1012	54	7,200	54	54	中								五城目町役場	22.1			
8	2042は	水源保	スギ	75	誘導伐	複層伐(等・群)	0.32	32	48	78	202	2.59	113		113	全木	113	ブタヤ	113	82	113	8,100	113	113	中								五城目町役場	21.0	地帯・植付 (0.32ha) スギコン花粉650本		
9	2042に	水源保	スギ	55	誘導伐	複層伐(等・群)	1.16	35	28	1,055	848	0.80	364	25	389	全木	389	ブタヤ	389	221	389	6,600	389	389	中				90	600		6m×100枚 (150日間)	五城目町役場	21.5	地帯・植付 (1.16ha) スギコン花粉2350本		
10	2042ほ	水源保	スギ	75	誘導伐	複層伐(等・群)	0.13	36	40	53	104	1.96	48	11	59	全木	59	ブタヤ	59	393	59	8,100	59	59	中								五城目町役場	21.0	地帯・植付 (0.13ha) スギコン花粉300本		
11	2042ほ1	水源保	スギ	75	育成受光伐	複層伐(天)	1.59	23	34	191	217	1.14	120	1	121	全木	121	ブタヤ	121	293	121	8,100	121	121	中								五城目町役場	21.0			
12	2042へ	砂拾指	スギ	123	育成受光伐	複層伐(天)	0.98	12	28	134	103	0.77	57		57	全木	57	ブタヤ	57	381	57	8,100	57	57	中								五城目町役場	21.0			
13	2042ち	水源保	スギ	54	誘導伐	複層伐(等・群)	0.54	34	38	222	312	1.40	139	4	143	全木	143	ブタヤ	143	488	143	7,200	143	143	中								五城目町役場	22.1	地帯・植付 (0.54ha) スギコン花粉1100本		
14	2042こ	砂拾指	スギ	75	育成受光伐	複層伐(天)	0.29	16	40	32	47	1.48	26		26	全木	26	ブタヤ	26	525	26	8,100	26	26	緩								五城目町役場	21.0			
15	2042ぬ	水源保	スギ	55	誘導伐	複層伐(等・群)	0.72	33	34	503	585	1.16	260	9	269	全木	269	ブタヤ	269	243	269	6,600	269	269	中								五城目町役場	21.5	地帯・植付 (0.72ha) スギコン花粉1450本		
16	2042ふ	水源保	スギ	52	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	4.47	25	30	722	650	0.90	289	10	299	全木	650	ブタヤ	299	1045	299	7,200	199	199	緩								五城目町役場	22.1		直送あり	
17	2042リ	水源保	スギ	54	誘導伐	複層伐(等・群)	0.82	39	32	464	562	1.21	257	1	258	全木	258	ブタヤ	258	275	258	6,600	258	258	中								五城目町役場	21.5	地帯・植付 (0.82ha) スギコン花粉1650本		
18	2042そ	水源保	スギ	53	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.30	25	26	318	224	0.70	98	5	103	全木	224	ブタヤ	103	620	103	7,200	103	103	中								五城目町役場	22.1			
19	2042つ	水源保	スギ	54	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.93	25	26	229	160	0.70	70	4	74	全木	160	ブタヤ	74	285	74	7,200	74	74	中								五城目町役場	22.1			
20	2042お	水源保	スギ	38	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.23	25	22	377	195	0.52	65	5	70	全木	195	ブタヤ	70	878	70	7,200	70	70	中								五城目町役場	22.1			
21	2042く	水源保	スギ	51	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.64	25	26	1,046	716	0.68	287	14	301	全木	716	ブタヤ	301	243	301	7,200	201	201	中								五城目町役場	22.1		直送あり	
22	2042ラ	水源保	スギ	53	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.20	25	26	545	379	0.70	167	8	175	全木	379	ブタヤ	175	148	175	7,200	175	175	中								五城目町役場	22.1			
23	2042の	水源保	スギ	52	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	2.86	25	28	718	547	0.76	237	15	252	全木	547	ブタヤ	252	253	252	7,200	152	152	中								五城目町役場	22.1		直送あり	
24	2042ね	水源保	スギ	54	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.35	25	26	331	233	0.70	102	5	107	全木	233	ブタヤ	107	200	107	7,200	107	107	中								五城目町役場	22.1			
25	2042む	水源保	スギ	54	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	0.50	25	26	155	86	0.56	38	2	40	全木	86	ブタヤ	40	122	40	7,200	40	40	緩								五城目町役場	22.1			
小計						55.16				18,327	13,881		6,062	369	6,431		10,274		6,431		6,431		5,431	5,431					120	700							
合計						57.82				18,885	14,339		6,275	376	6,651		10,687		6,651		6,651		5,651	5,651					120	700	65			【地帯・植付】11.06 ha 【苗木】22250 本			

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編組および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。


(様式6)

令和7年度 森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署				
物件番号	5号	事業期間	契約締結日の翌日	～	R7.12.19
物件名	森林環境保全整備事業(馬場目沢外2国有林Ⅰ)				

[illegible]

- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道設けの林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩： $0^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 、中： $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 、急： 30° 以上
- 4 森林作業道設けの土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支庁含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位めとする。
- 6 伐採箇所、土壌、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編欄および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

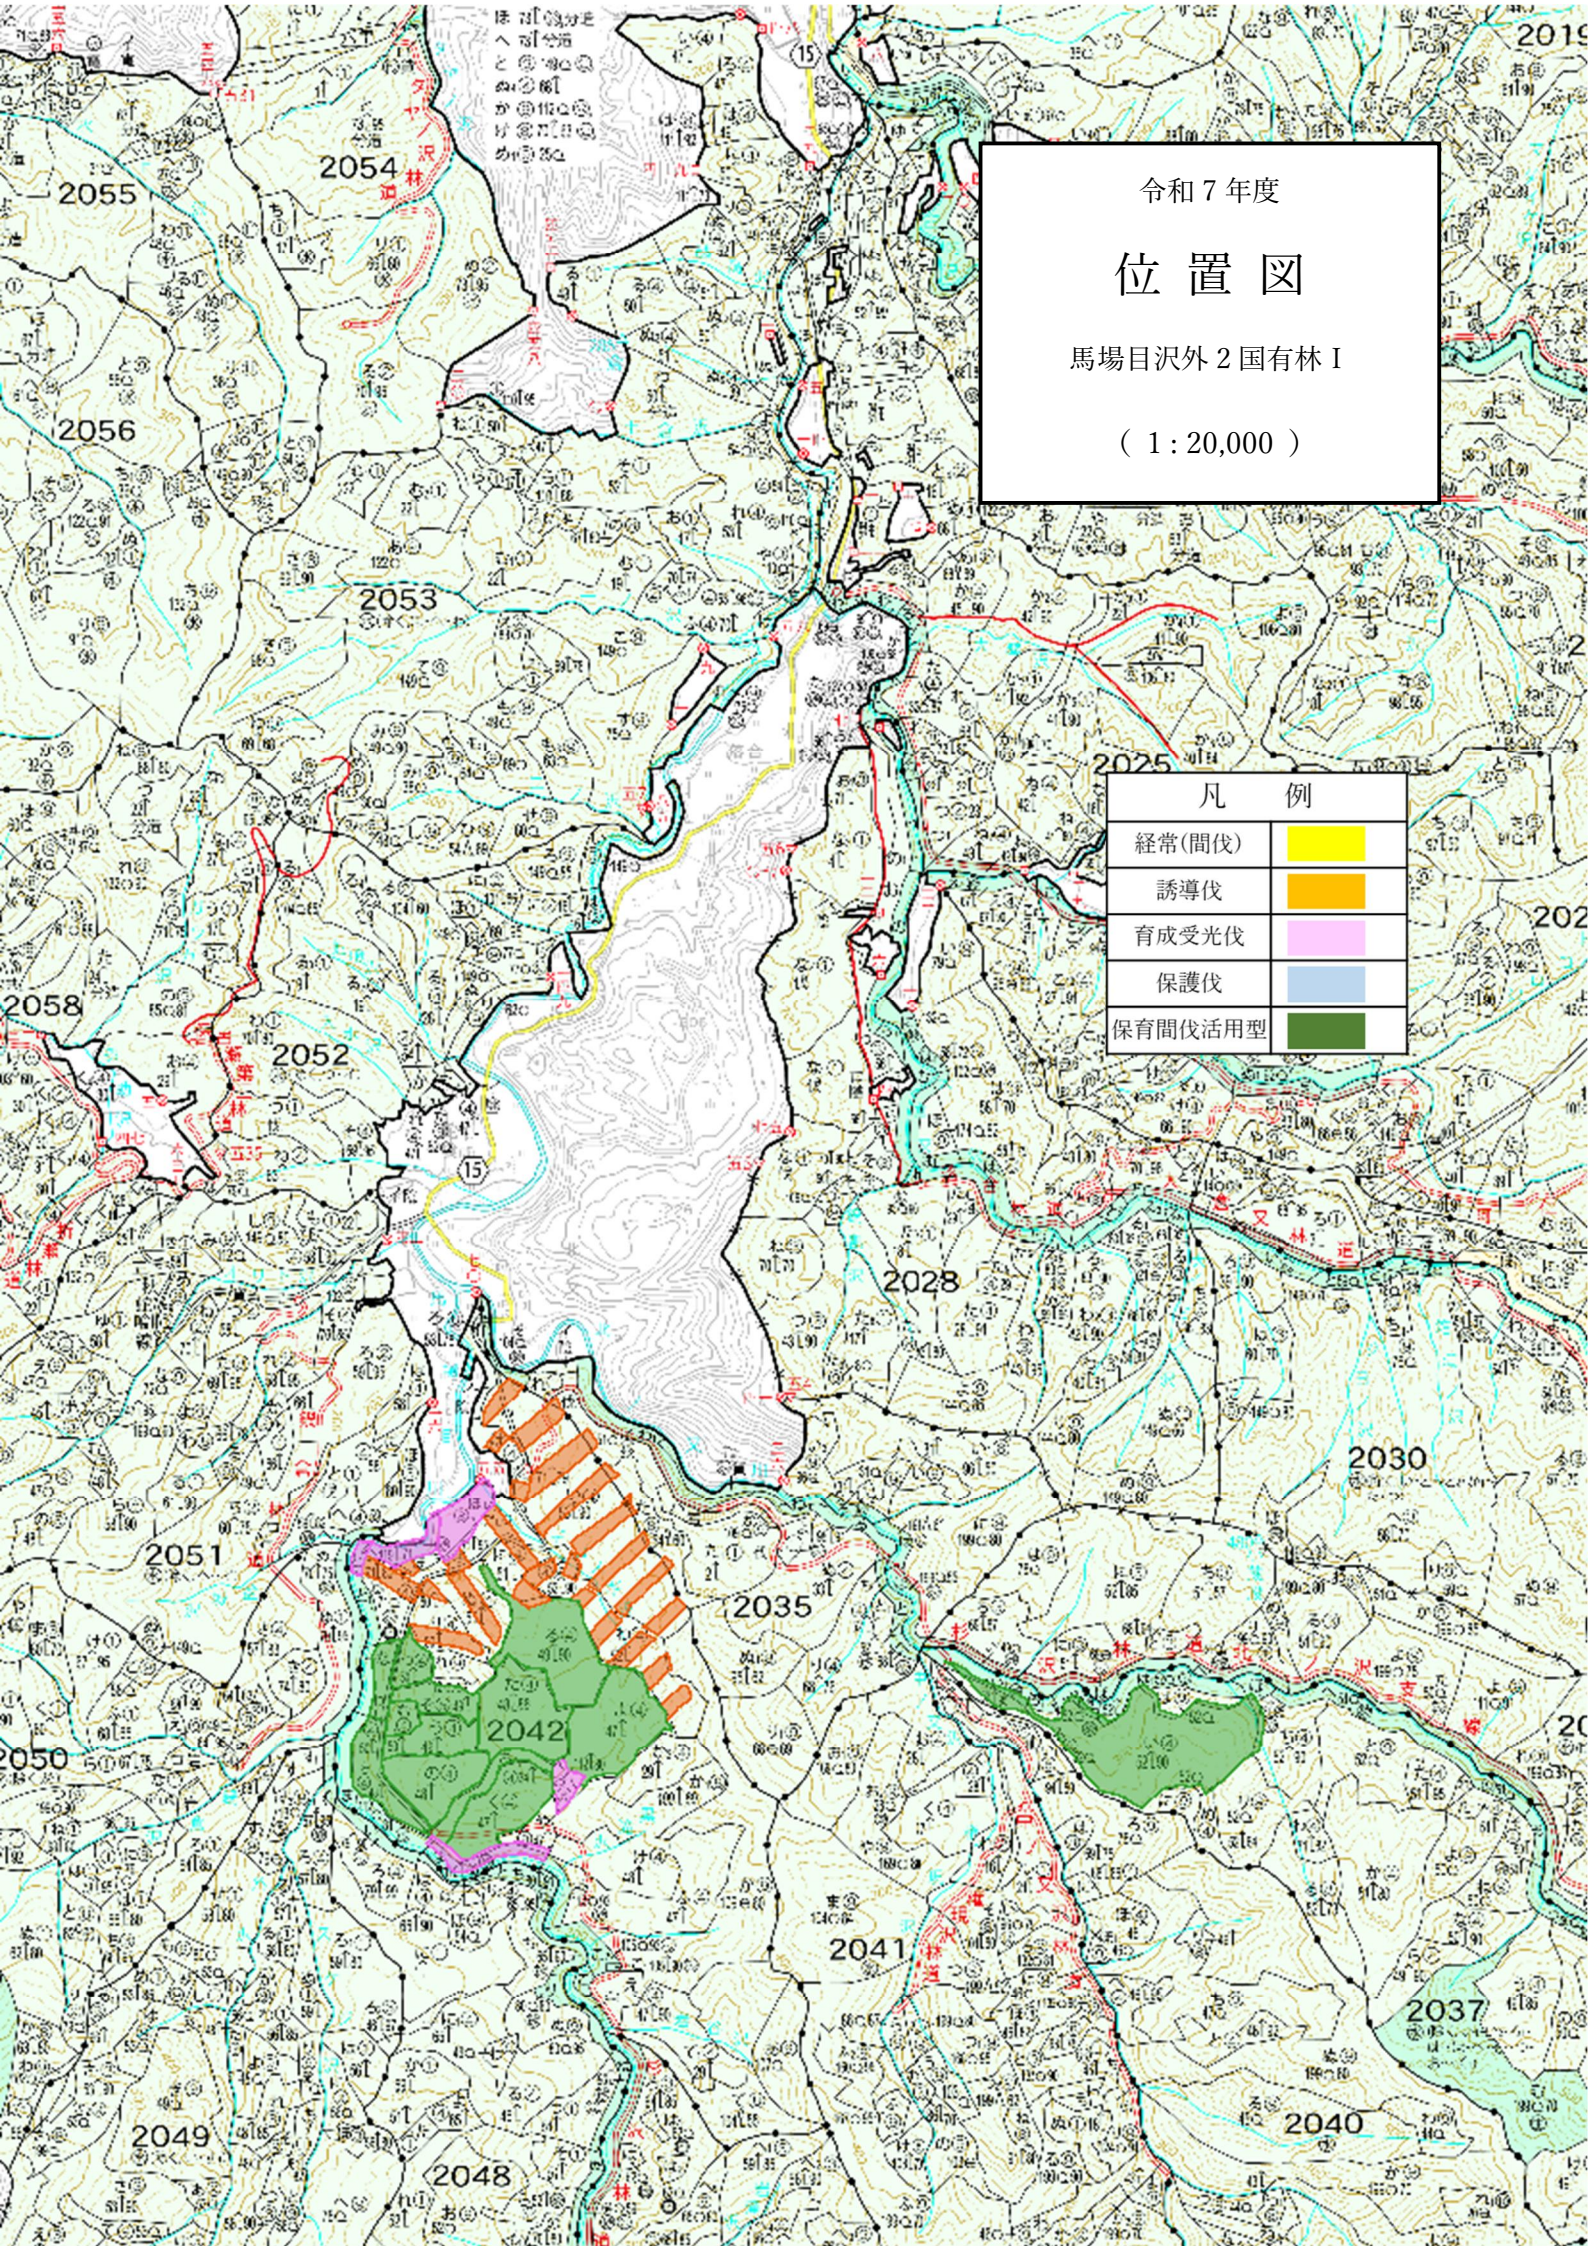

令和7年度

位置図

馬場目沢外2国有林I

(1 : 20,000)

凡 例

経常(間伐)



誘導伐



育成受光伐



保護伐




保育間伐活用型



(1 : 5,000)

凡	例
經常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	

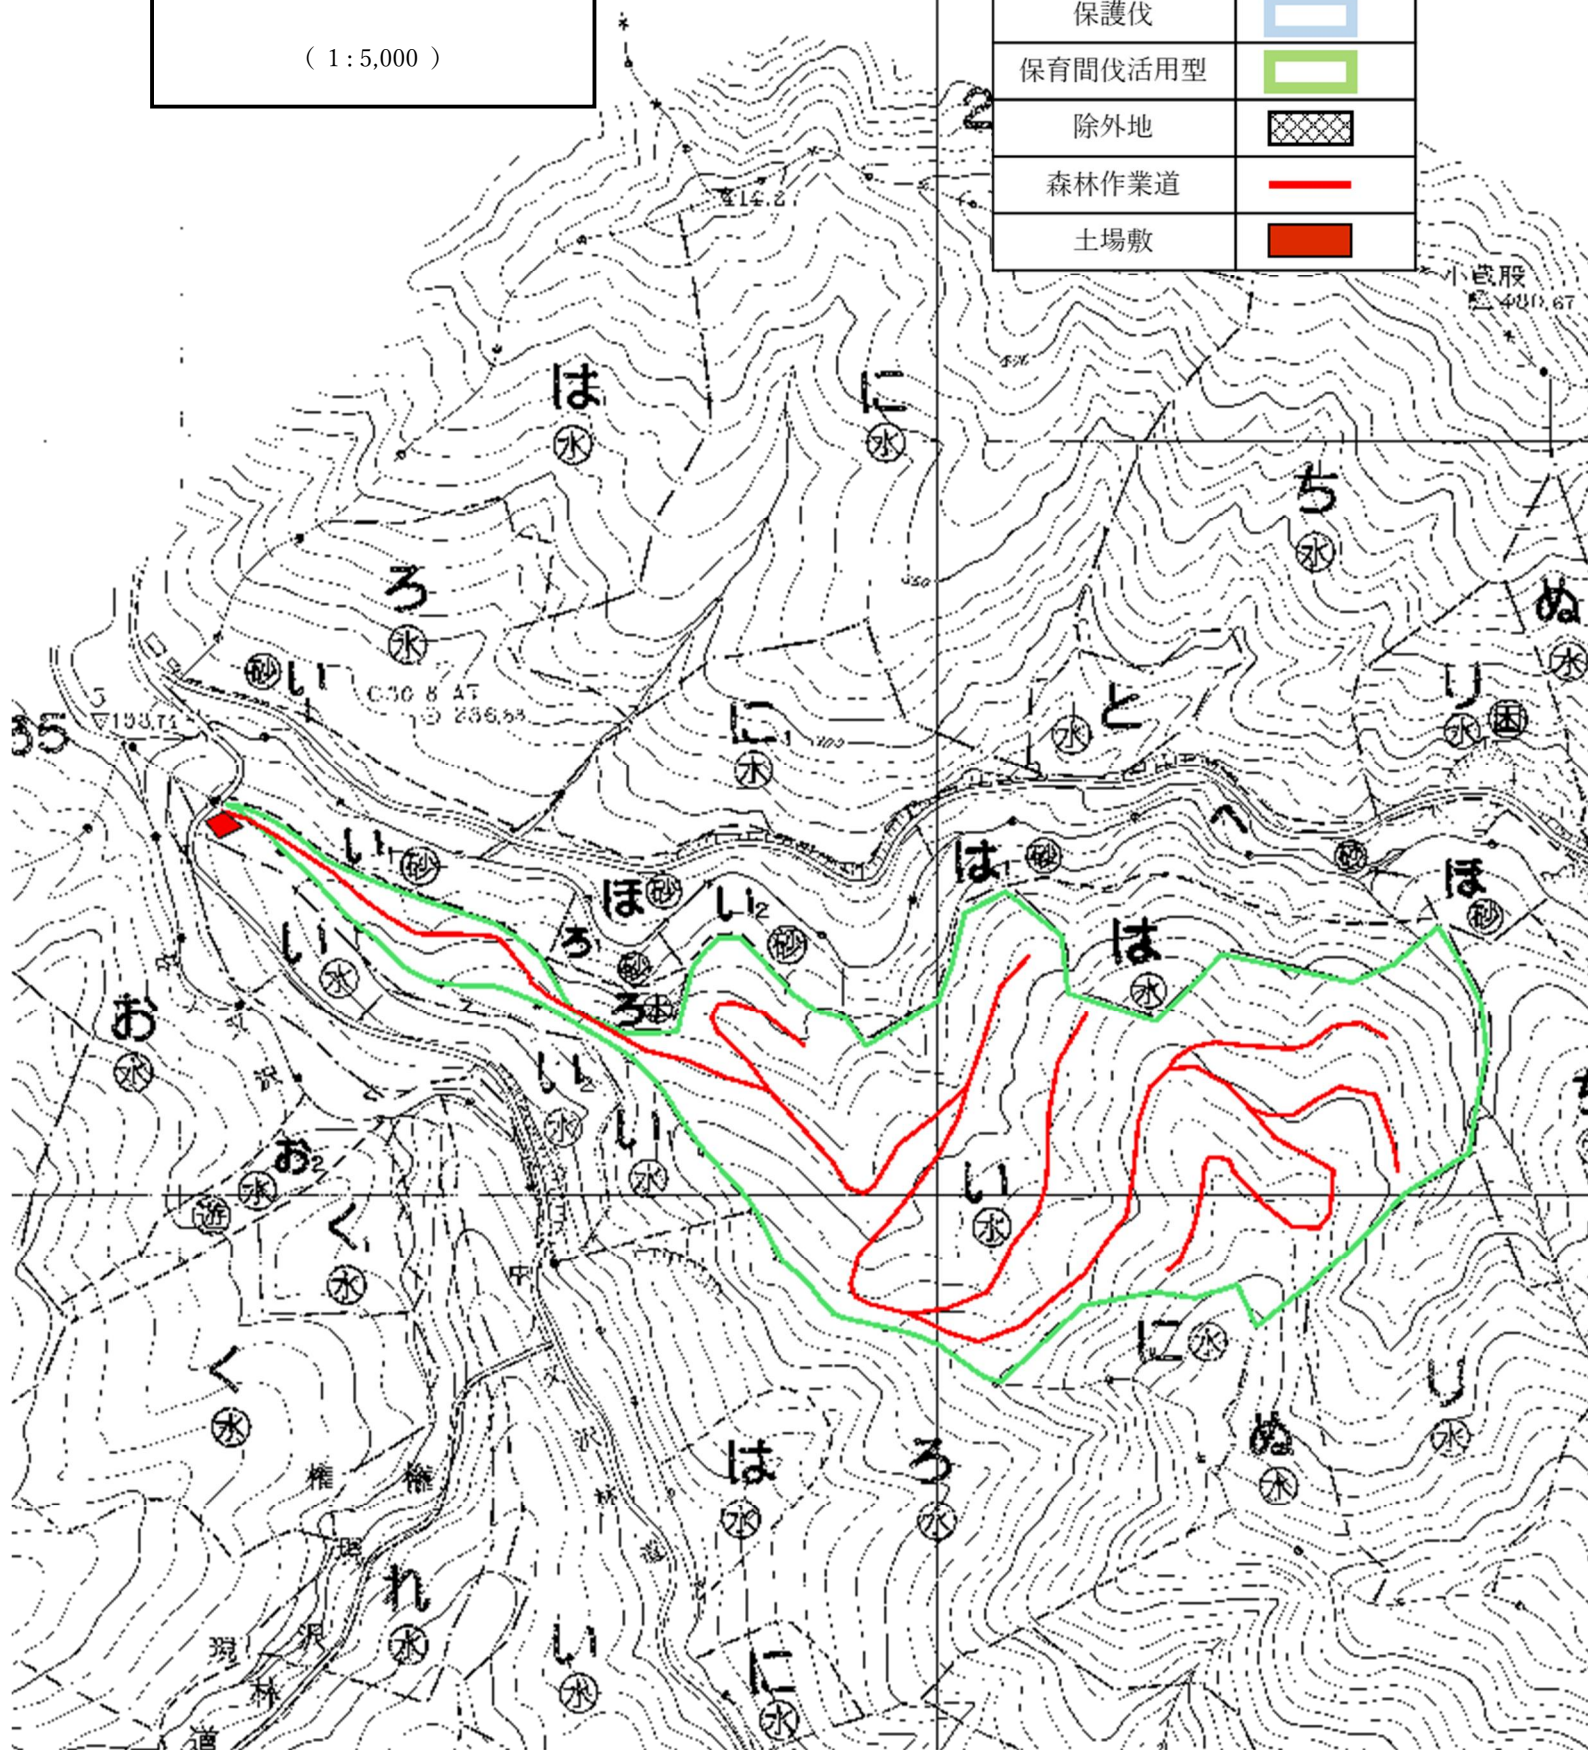

(1 : 5,000)

凡 例	
經常(間伐)	
誘導伐	
育成受光伐	
保護伐	
保育間伐活用型	
除外地	
森林作業道	
土場敷	
