

(様式6)


令和8年度 製品生産及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

森林管理署	米代西部森林管理署			
物件番号	4号	事業期間	契約締結日の翌日	～ R8.12.18
物件名	製品生産及び森林環境保全整備事業(真瀬沢国有林)			

林小班	保安林 種別等	主要 樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積 ha	伐採 率 %	平均 胸高 直径 cm	立木資材量			予定生産量			予定作業量																最寄り市町村 からの距離 km		一貫作業	備 考			
									本数 本	材積 ㎡	立木 1本当り 材積 ㎡/本	N ㎡	L ㎡	計 ㎡	伐倒		集・造材		小運搬				巻立		森林作業道作設		林地保全		土場 作設等	砂利 数量					薬剤 散布	鉄板 規格×枚数 (日数)	
															方法	数量 ㎡	方式	数量 ㎡	フォワーダ 片道運搬 距離 m	数量 ㎡	グラブブル 付きトラック 片道運搬距離 m	数量 ㎡	数量 ㎡	林地 傾斜 緩・中・急	延長 m	編棚 m	緑化 ㎡	バッチ 0.45 h	C-80 ㎡	スミ バイン ℓ							
1	168rl	水源保	スギ	115	経常	複層伐(等・群)	1.67	26	28	2,144	1,607	0.75	736	67	803	全木	803	ブ0時	803	535	803	400	803	803	中									八幡町役場	16.4	地帯・植付(1.67ha) スギコン小花粉3,350本	
2	168rl1	砂防指	スギ	115	経常	複層伐(等・群)	0.28	39	44	99	263	2.65	129	2	131	全木	131	ブ0時	131	365	131	400	131	131	中									八幡町役場	16.4	地帯・植付(0.28ha) スギコン小花粉600本	
3	168rl2	水源保	スギ	39	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.30	25	24	1,325	484	0.37	184		184	全木	484	ブ0時	184	263	184	400	184	184	中									八幡町役場	16.4		
4	168rl3	水源保	スギ	38	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.03	25	24	1,218	444	0.36	169		169	全木	444	ブ0時	169	165	169	400	169	169	中									八幡町役場	16.4		
5	168rl4	水源保	スギ	37	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	3.24	25	24	1,303	475	0.36	190		190	全木	475	ブ0時	190	359	190	400	190	190	緩									八幡町役場	16.4		
6	168rl5	水源保	スギ	115	経常	複層伐(等・群)	1.03	27	42	520	1,018	1.96	501	9	510	全木	510	ブ0時	510	250	510	400	510	510	急				100	100		6mm×80枚 (150日間)		八幡町役場	16.4	地帯・植付(1.03ha) スギコン小花粉2,500本	
7	168rl6	水源保	スギ	36	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.93	25	24	774	283	0.37	108		108	全木	283	ブ0時	108	162	108	100	108	108	緩									八幡町役場	19.0		
8	168rl8	水源保	スギ	35	保育間伐活用型	列状間伐(1伐3残)	1.18	25	24	474	173	0.37	66		66	全木	173	ブ0時	66	358	66	400	66	66	中									八幡町役場	16.4		
9	168rl5	水源保	スギ	72	誘導伐	複層伐(等・群)	3.28	31	38	1,939	2,687	1.39	1,383	15	1,398	全木	1,398	ブ0時	1,398	370	1,398			998	中				100	200		6mm×70枚 (90日間)		八幡町役場	19.0	地帯・植付(3.28ha) スギコン小花粉6,600本	直送あり
10	169ll	水源保	スギ	71	保護伐	皆伐	1.39	100	44	627	1,132	1.81	574	15	589	全木	589	ブ0時	589	97	589	100	589	389	中									八幡町役場	17.8	地帯・植付(1.39ha) スギコン小花粉3,350本	直送あり
11	169rl	水源保	スギ	76	保護伐	皆伐	0.83	100	56	209	746	3.57	353	5	358	全木	358	ブ0時	358	169	358	100	358	258	緩									八幡町役場	17.8	地帯・植付(0.83ha) スギコン小花粉1,700本	直送あり
12	169rl	砂防指	スギ	76	誘導伐	複層伐(等・群)	0.86	39	56	210	659	3.14	313	3	316	全木	316	ブ0時	316	150	316	100	316	216	緩									八幡町役場	17.8	地帯・植付(0.86ha) スギコン小花粉1,750本	直送あり
13	169rl	水源保	スギ	95	育成受光伐	複層伐(天)	4.71	34	54	368	957	2.60	478		478	全木	478	ブ0時	478	246	478		278	中									八幡町役場	19.0		直送あり	
14																																					
15																																					
16																																					
17																																					
18																																					
19																																					
20																																					
21																																					
22																																					
23																																					
24																																					
25																																					
小計						26.73				11,210	10,929		5,184	116	5,300		6,443	5,300		5,300		3,424	4,300					200	300								
合計						26.73				11,210	10,929		5,184	116	5,300		6,443	5,300		5,300		3,424	4,300		5,697			200	300	17				【地帯・植付】9.34 ha 【苗木】19,850 本	直送1,000㎡		


- 1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
- 2 面積は伐採面積とする。
- 3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
緩：0°～20°、中：20°～30°、急：30°以上
- 4 森林作業道作設の土質等欄は、作設に当たり特に留意する必要がある場合に記載する。
- 5 最寄りの市町村役場（支所含む）からの距離欄は、物件番号毎の代表箇所について市町村役場を記入し、距離は単位以下第1位止めとする。
- 6 伐採箇所、土場、森林作業道作設予定線（既設集材路含む）、編棚および沢については、作業計画図に図示する。
- 7 その他必要な項目があれば備考欄に記載する。

令和8年度
位置図
真瀬沢国有林
(1:20,000)

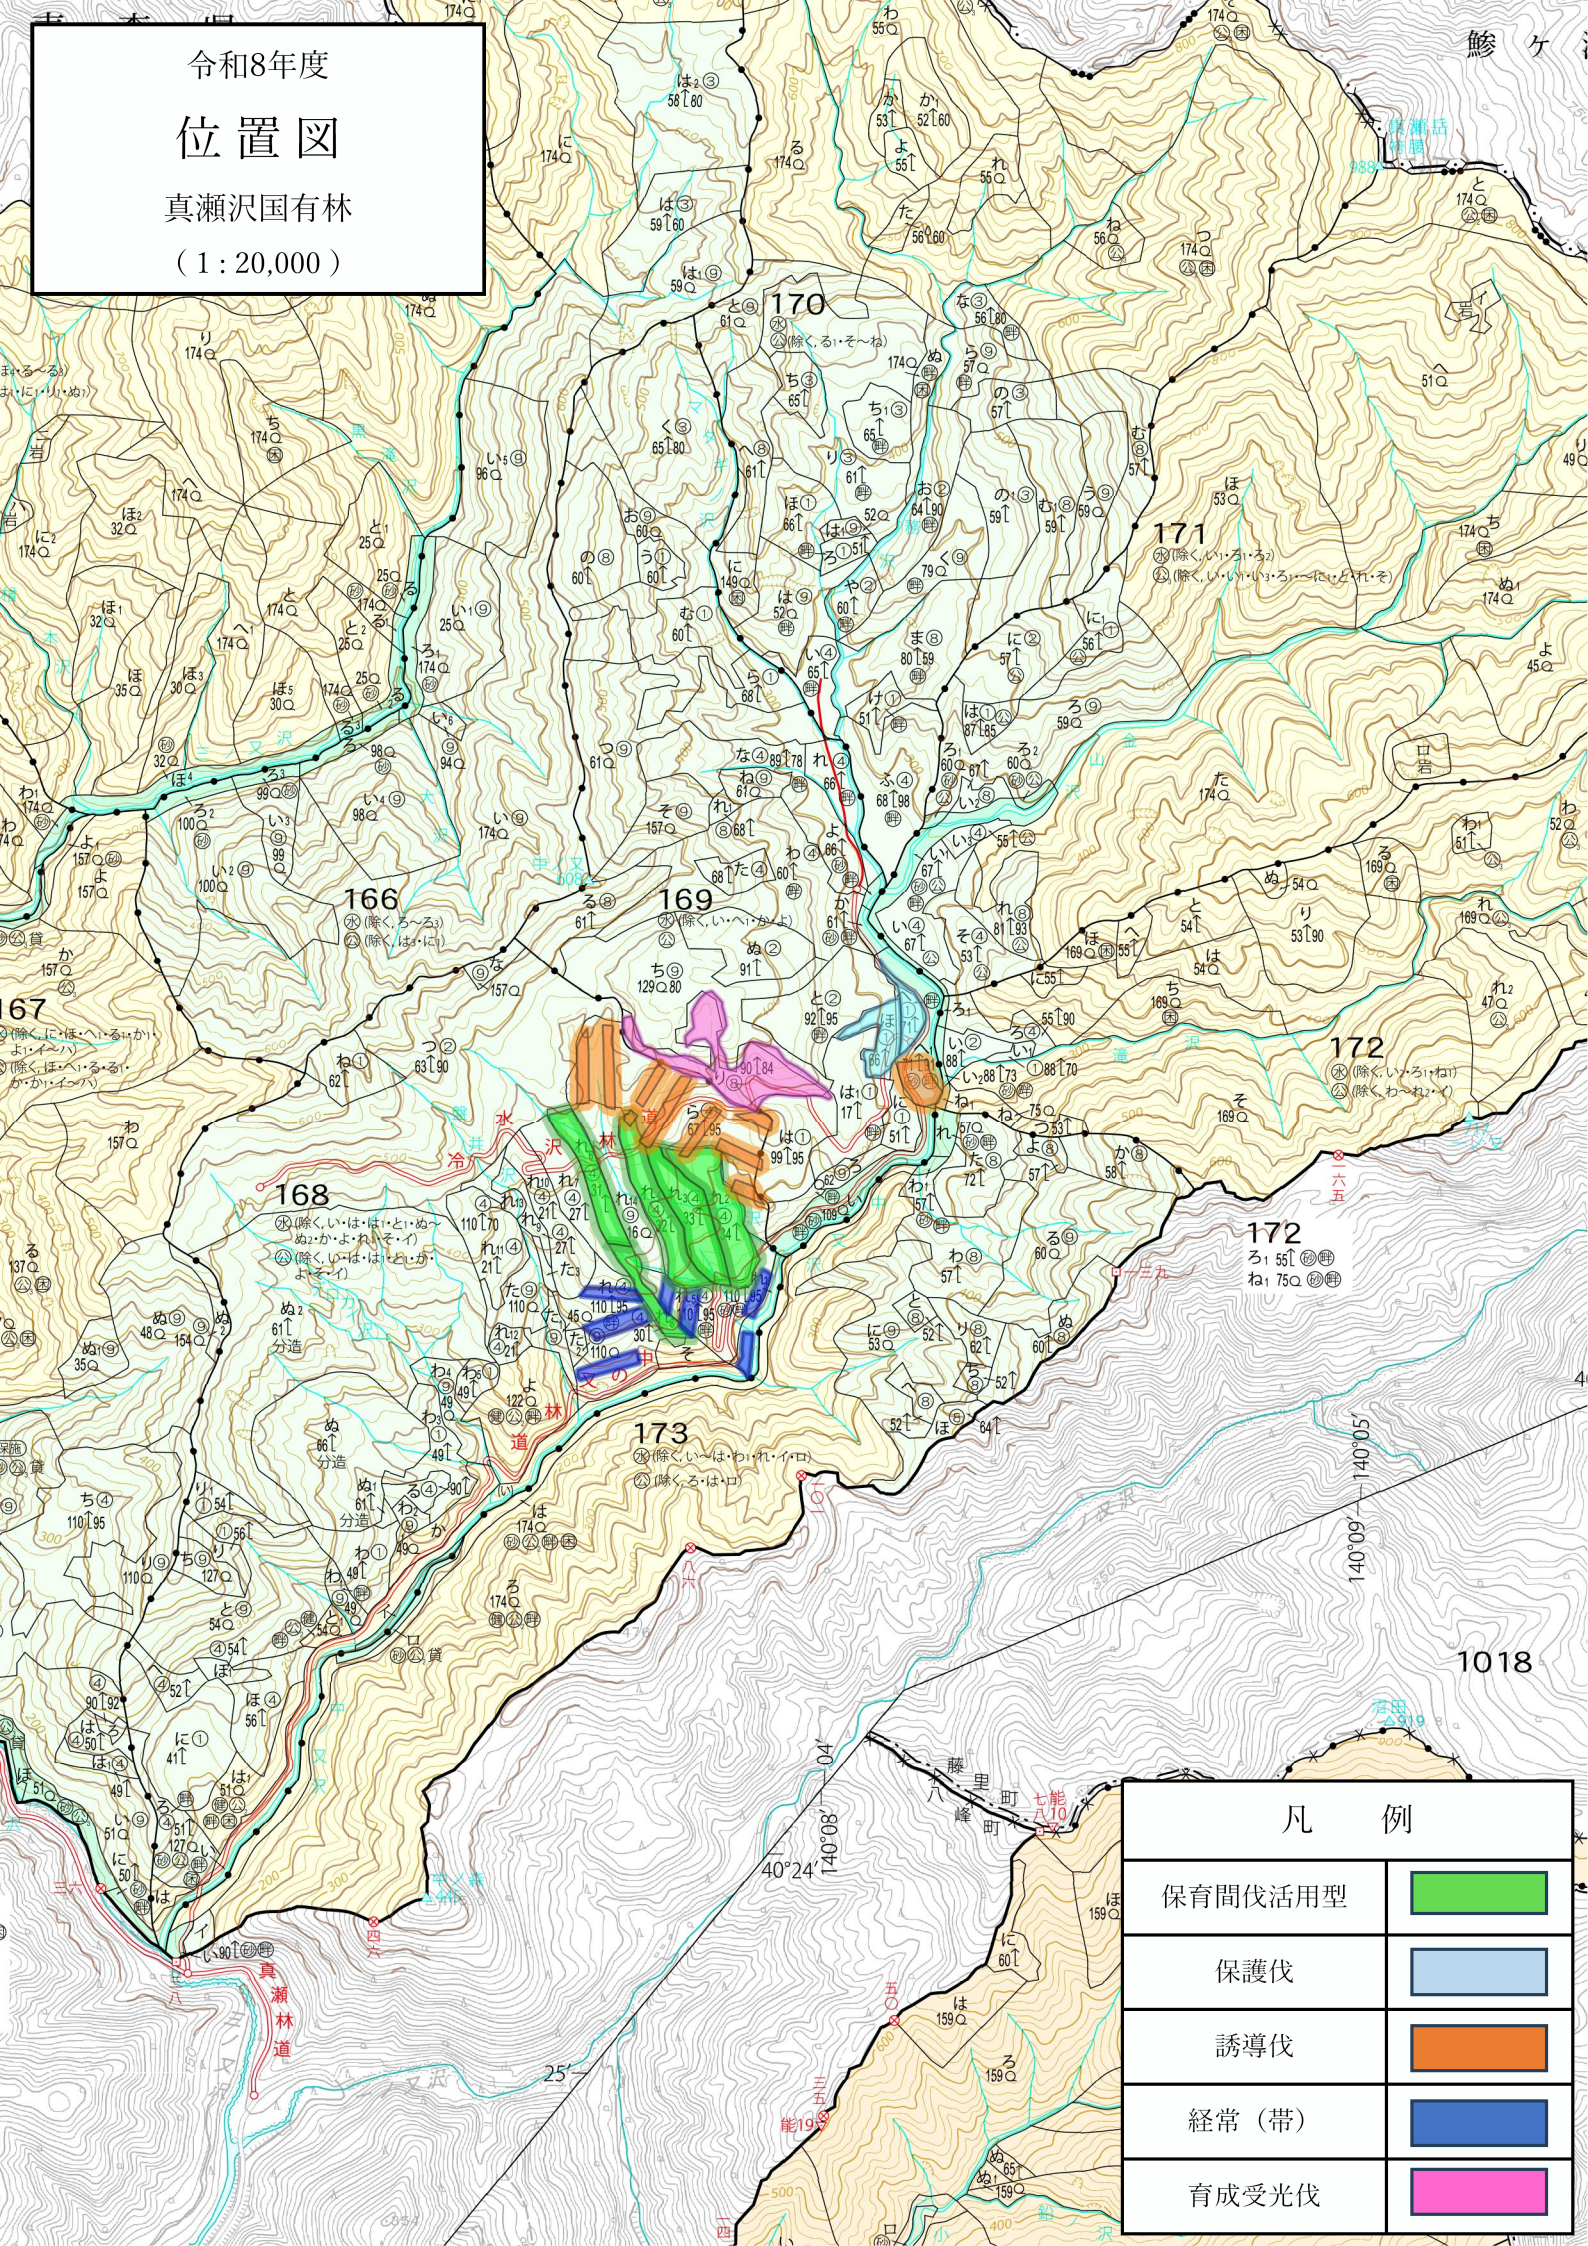


凡 例	
保育間伐活用型	
保護伐	
誘導伐	
経常(帯)	
育成受光伐	

令和8年度
作業計画図
真瀬沢国有林
(1:5,000)

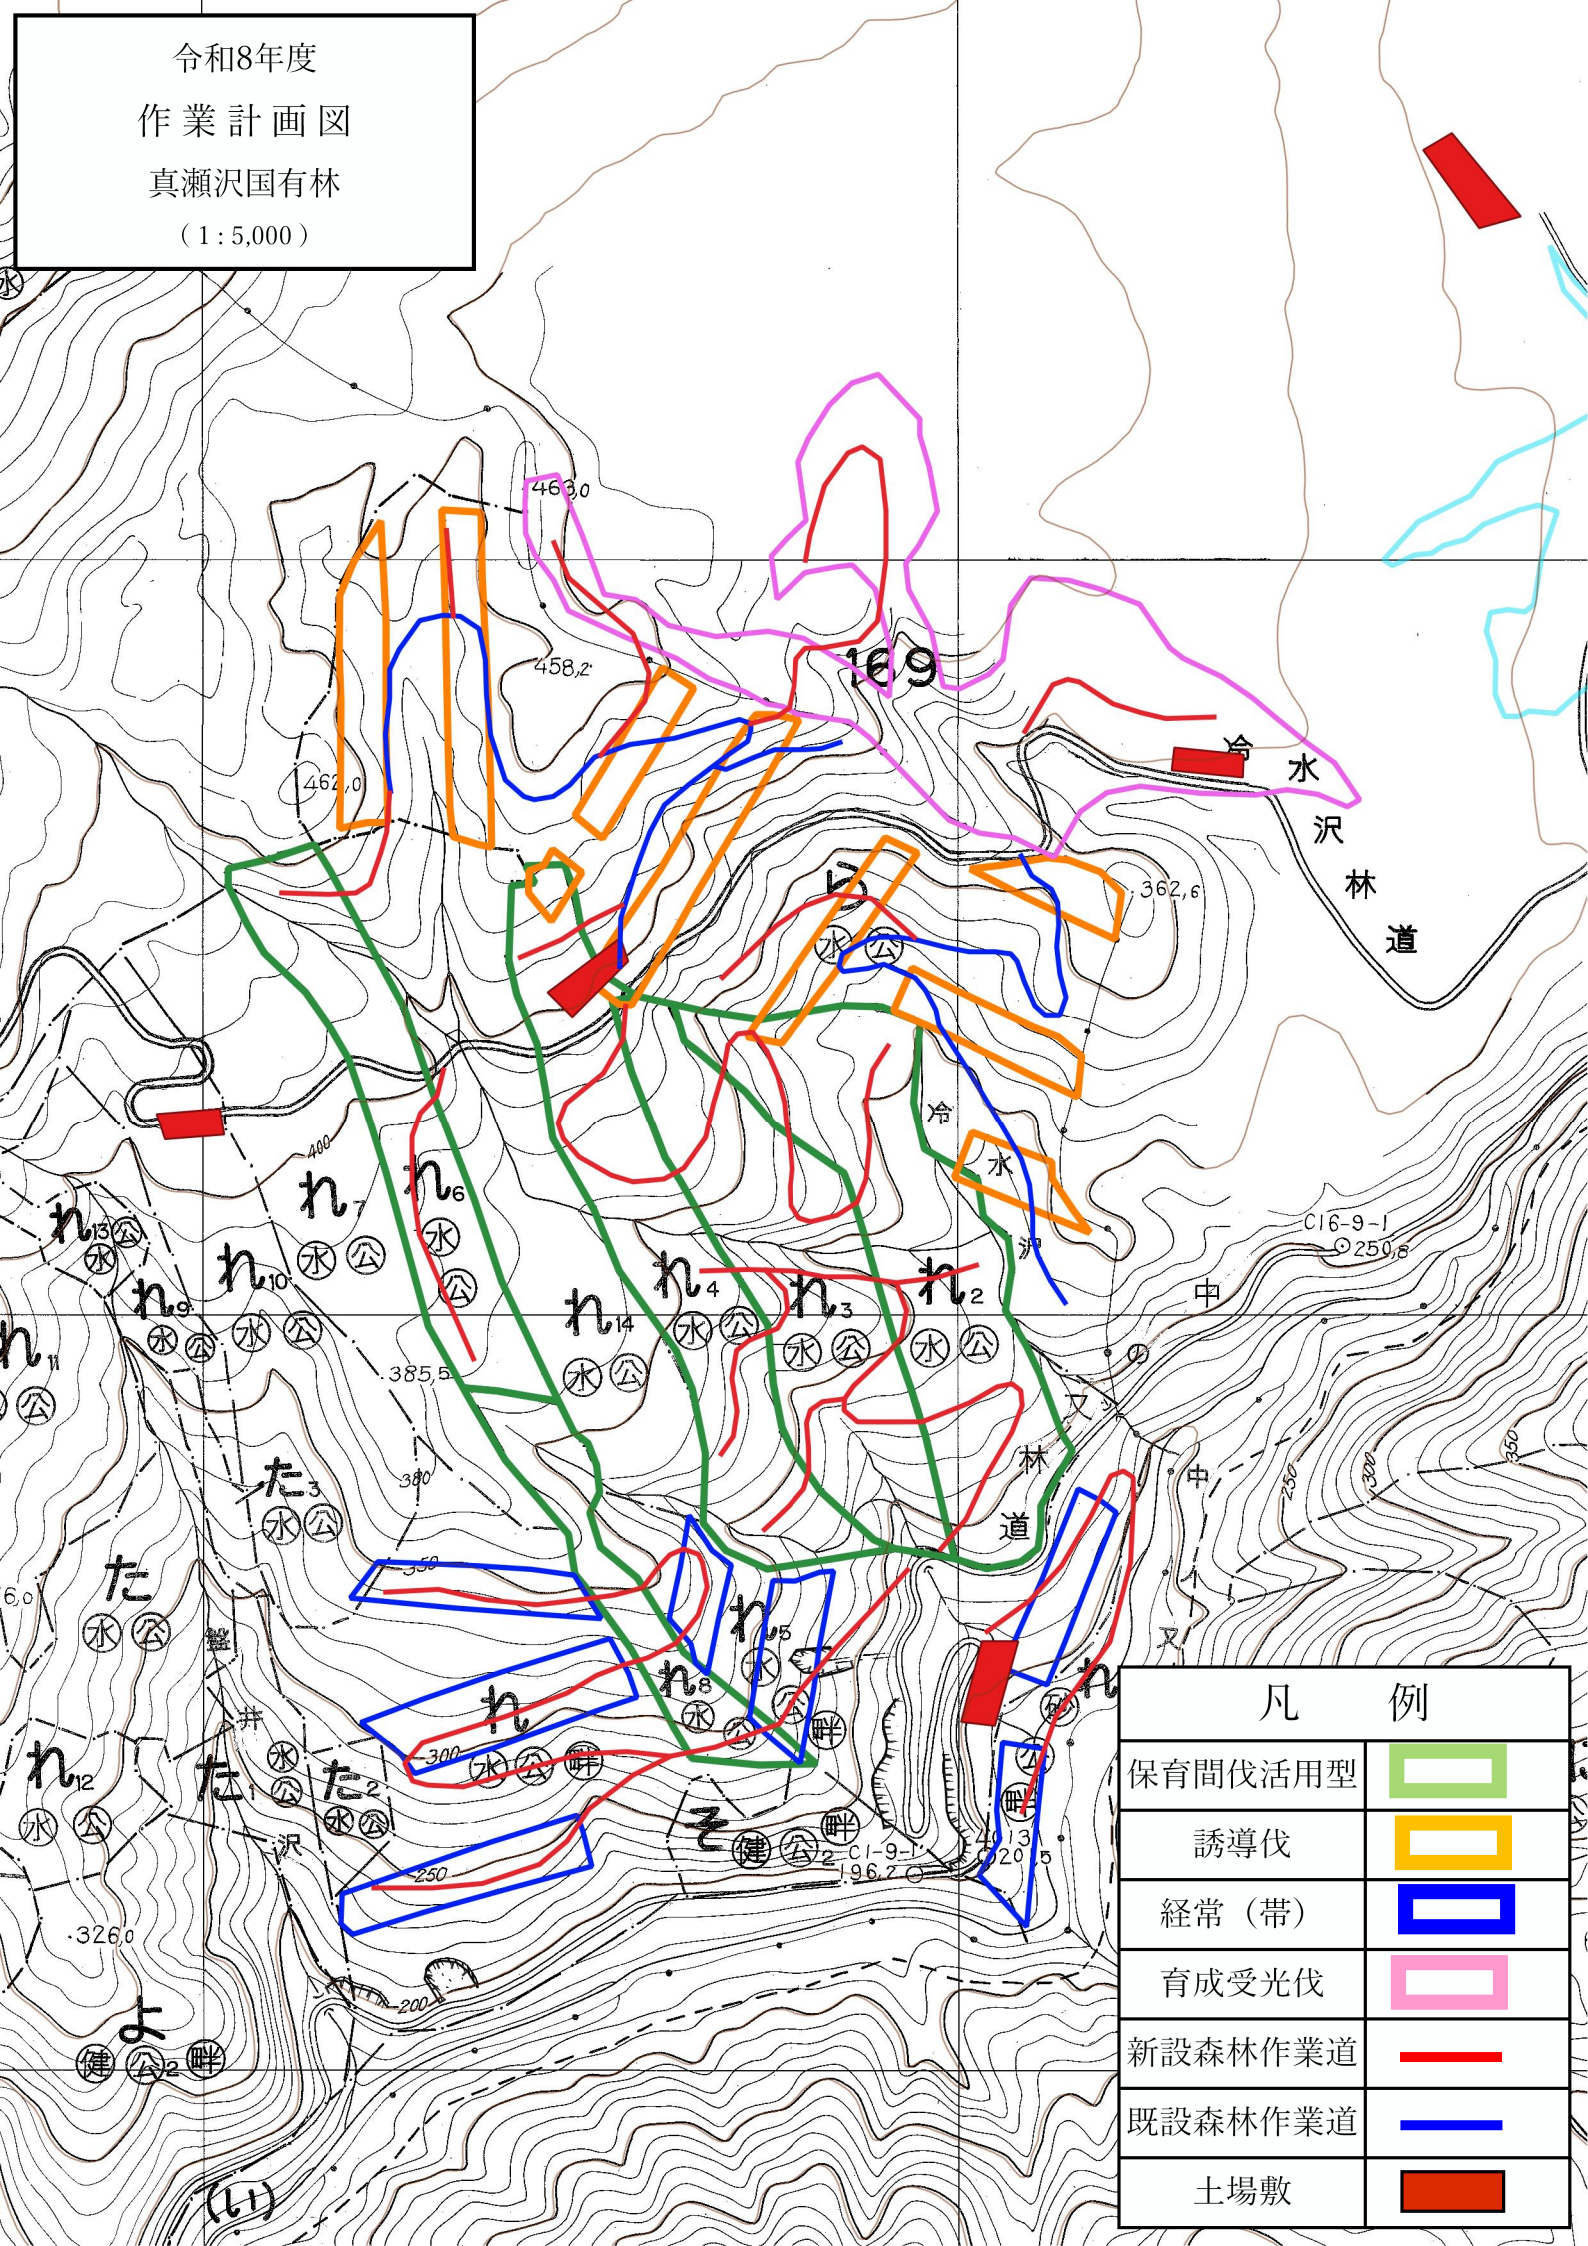

凡 例	
保育間伐活用型	
誘導伐	
經常（帯）	
育成受光伐	
新設森林作業道	
既設森林作業道	
土場敷	

令和8年度
作業計画図
真瀬沢国有林
(1:5,000)

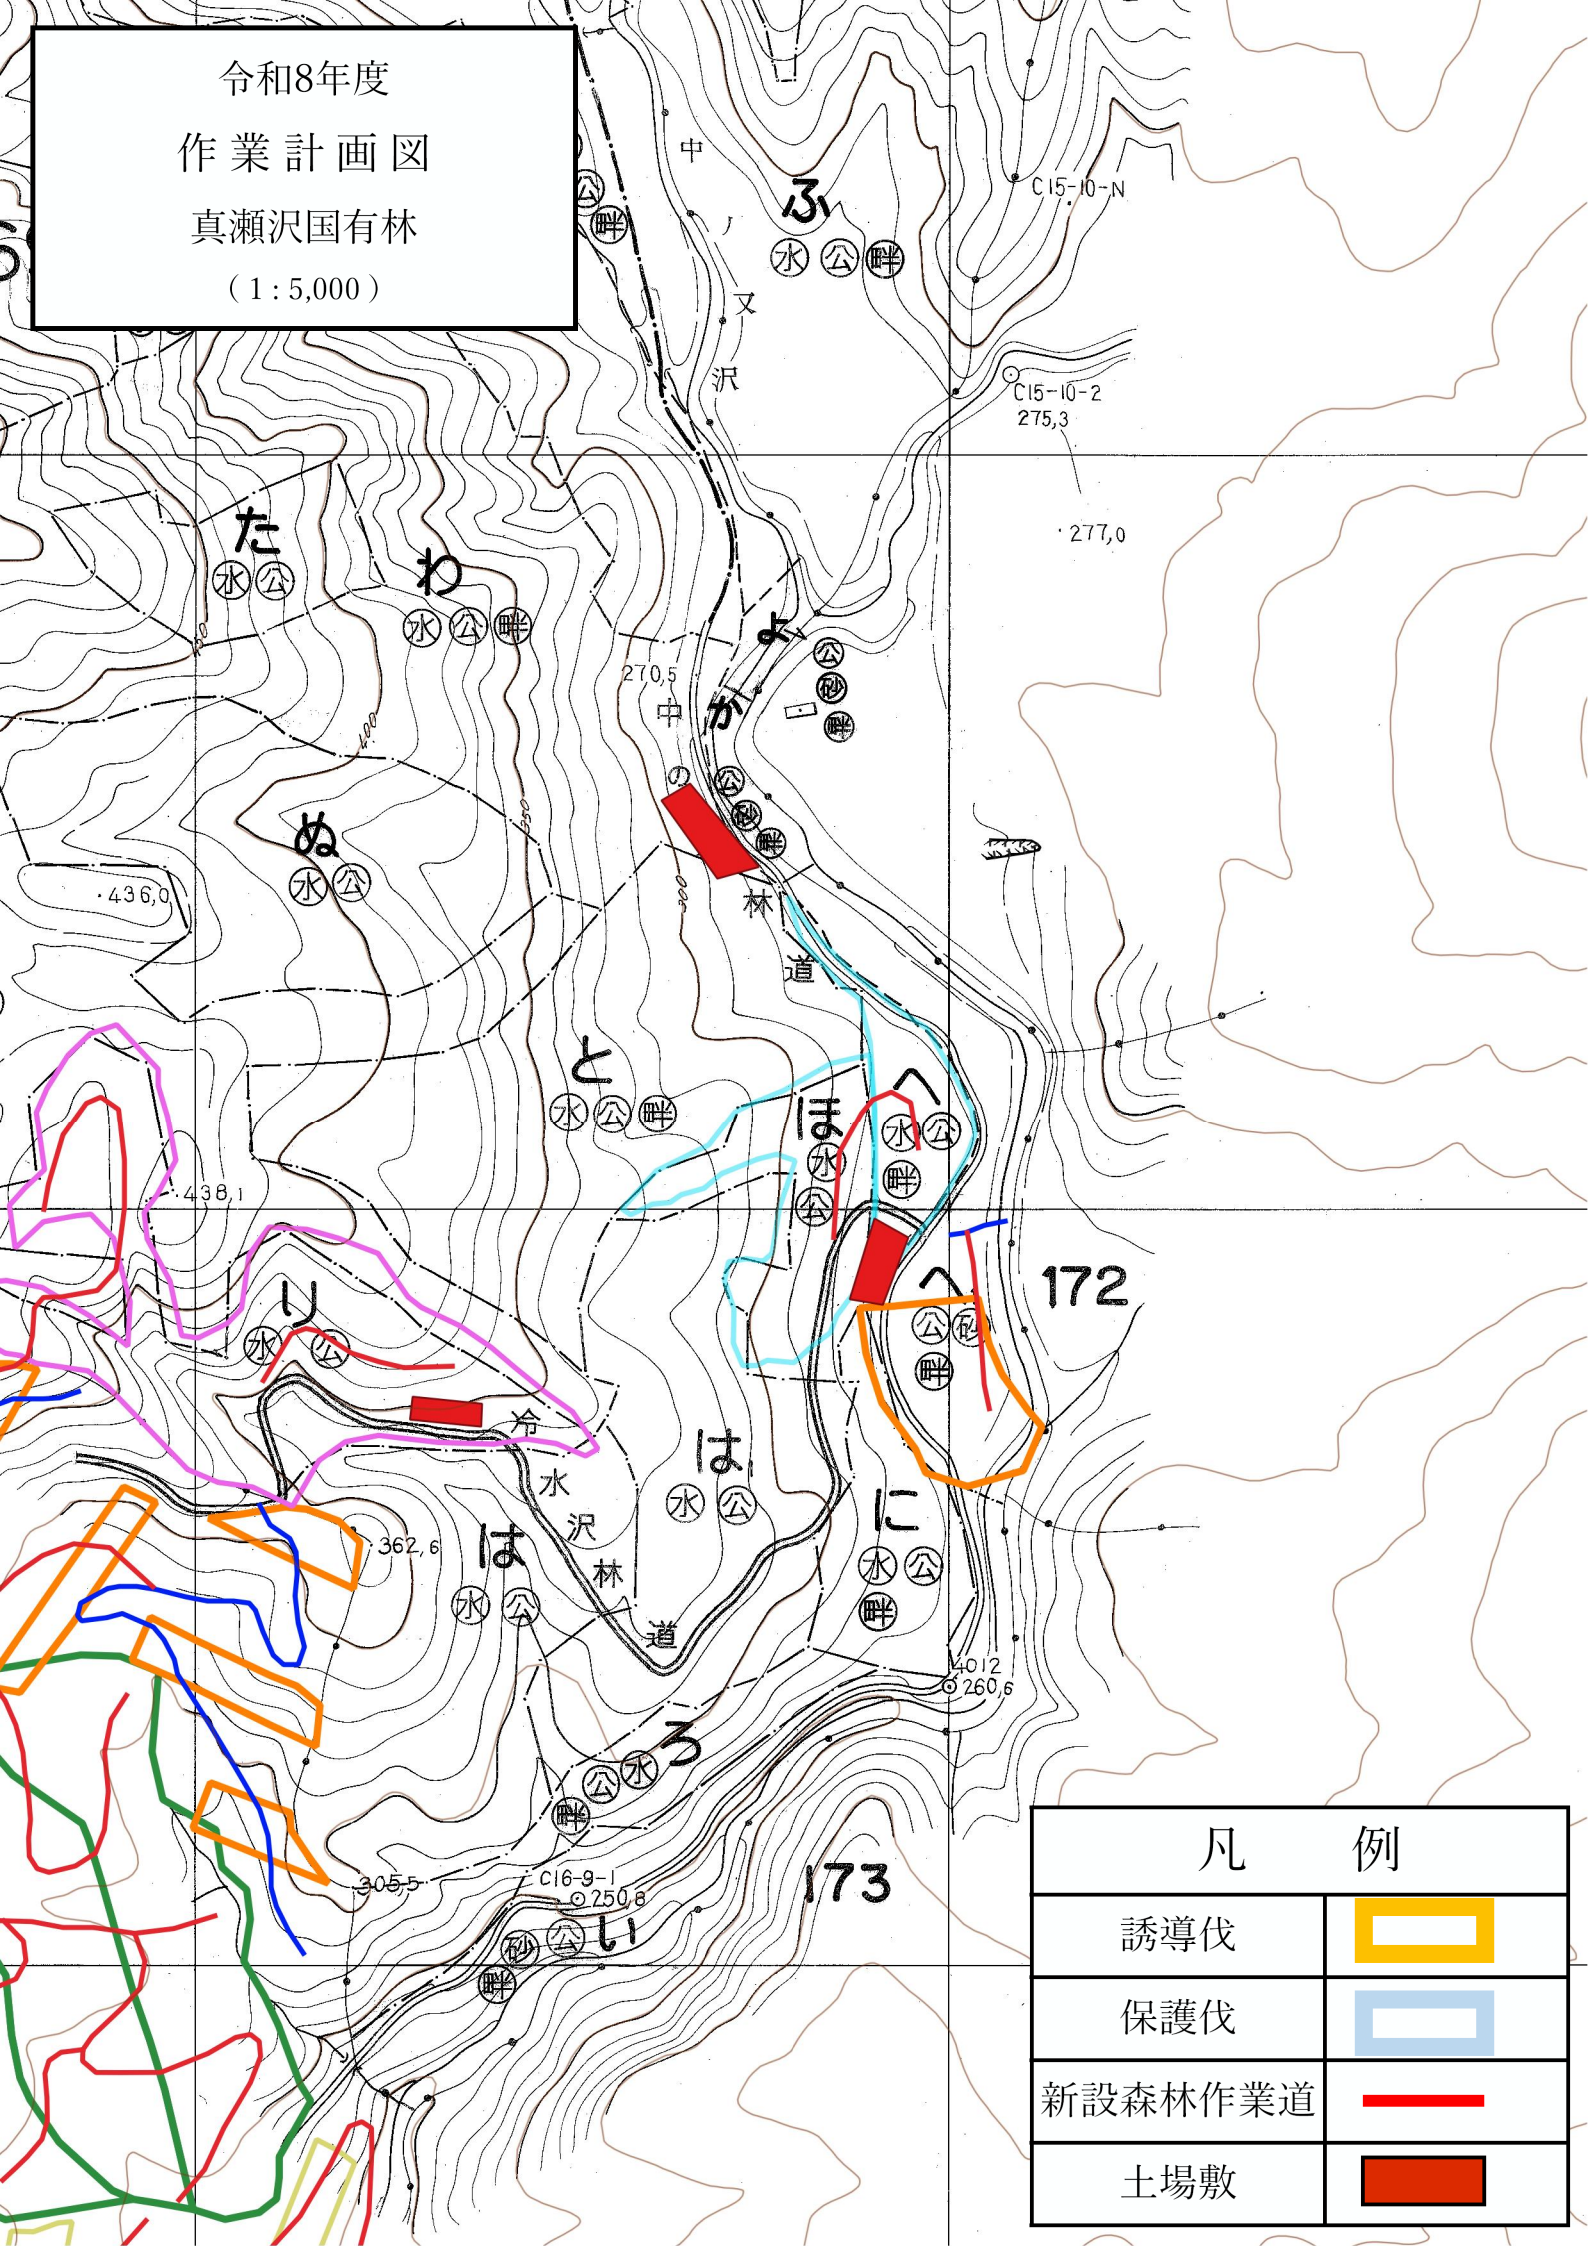

凡 例	
誘導伐	
保護伐	
新設森林作業道	
土場敷	
