

五百瀬地区 (2号地)

○概要

場所：十津川村三浦

崩壊地面積：4.35ha


主要工種：谷止工、山腹工
(施設災害復旧工事)

工期：平成27年 4月23日から
平成29年 3月17日まで

概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置

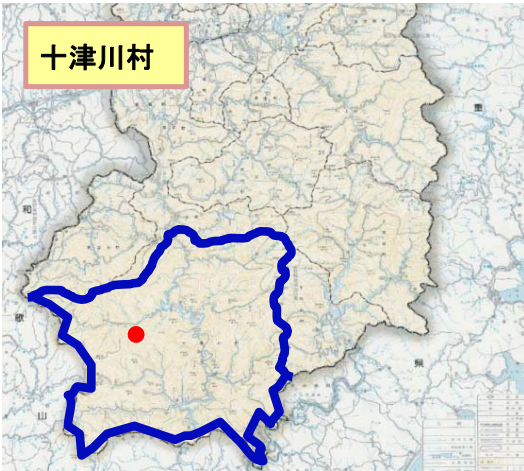

○復旧状況

凡 例	
■ (Green)	既設
■ (Red)	H27予定箇所
■ (Yellow)	次年度以降計画

崩壊地

山腹工 緑化状況

護岸工 完成状況

H27施工箇所

第1号谷止工

第4号谷止工 完成状況

第3号谷止工 完成状況

第2号谷止工 完成状況
