（令和8年10月30日現在）

白米千枚田（輪島市白米町）

高市総理大臣現場視察
（令和7年12月7日：珠洲市 大谷区域）

ゴジラ岩（珠洲市馬緤町）

令和6年能登半島地震・奥能登豪雨
民有林直轄治山事業 実施状況
（令和8年度）

輪島市のキリコ祭り

鈴木農林水産大臣現場視察
（令和7年11月1日：輪島市 興徳寺区域）

大谷町鯉のぼりフェス（珠洲市大谷町）

民有林直轄治山事業箇所位置図

林野庁 近畿中国森林管理局 石川森林管理署
奥能登地区山地災害復旧対策室

大谷
※写真①、②、③

大久保
※写真⑤

南方
※写真④

鳳至
※写真⑥、⑦

寺山南

興徳寺
※写真⑧、⑨、⑩

①_大谷(ケ-1ほか)渓間工事（工事期間:R8.3.17~R9.2.5）

R8.10.30現在の施工内容：コンクリート谷止工(型枠設置作業ほか)

令和7年度（完了）
コンクリート谷止工

令和8年度（予定）
流路工

令和8年度（予定）
コンクリート谷止工

令和7年度（完了）
鋼製谷止工

令和8年度（予定）
流路工

令和8年度（予定）
土砂等撤去整理

コンクリート谷止工施工状況（R7完了）
令和8年1月27日現在

鋼製谷止工施工状況（R7完了）
令和8年3月16日現在

流路工施工状況（上流側完了）
令和8年7月28日現在

流路工施工状況（下流側埋戻作業）
令和8年9月28日現在

流路工施工状況（床固工設置完了）
令和8年8月24日現在

谷止工施工状況（型枠設置作業）
令和8年10月28日現在

工事施工箇所遠景　令和8年7月31日現在

②_大谷(ホ-3)山腹工事（工事期間：R8.6.3～R9.3.12）

R8.10.30現在の施工内容：鋼製土留工（掘削作業ほか）

仮設工（作業ヤード整備状況）
令和8年9月18日現在

土砂等撤去整理作業状況
令和8年9月24日現在

土砂等撤去整理作業状況
令和8年10月20日現在

令和7年度（完了）
山腹工（鋼製土留工ほか）

山腹工 施工状況（R7完了）
令和8年2月20日現在

令和8年度（予定）
山腹工（水路工、筋工ほか）

令和8年度（予定）
鋼製土留工

令和8年度（予定）
土砂等撤去整理、流末処理工

鋼製土留工施工状況（掘削作業）
令和8年10月28日現在

工事施工箇所遠景　令和8年7月31日現在

③_大谷(ホ-5)治山工事（工事期間:R8.6.9～R9.3.12）

R8.10.30現在の施工内容：鋼製谷止工(崩土除去作業ほか)

令和7年度（完了）
山腹工（法枠工ほか）

令和8年度（予定）
山腹工

令和8年度（予定）
鋼製谷止工

令和8年度（予定）
土砂等撤去整理、流末処理工

山腹工施工状況
令和8年10月1日現在

鋼製谷止工施工状況(鋼材組立設置作業)
令和8年10月20日現在

山腹工施工状況（R7完了）
令和8年3月5日現在

資材運搬状況（鋼製谷止工）
令和8年6月29日現在

工事施工箇所遠景　令和8年3月16日現在

④_南方(ケ-1)渓間工事（工事期間：R8.3.17～R9.2.5）

R8.10.30現在の施工内容：仮設工(後片付けほか)

流路工施工状況（掘削作業）
令和8年6月9日現在

鋼製谷止工施工状況（R7完了）
令和8年3月16日現在

流路工施工状況（鋼材組立設置作業）
令和8年6月23日現在

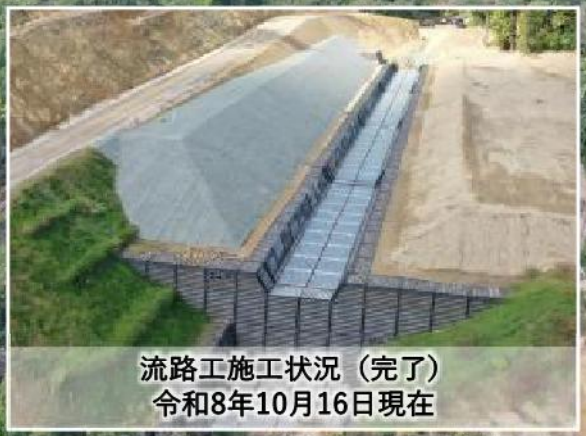
流路工施工状況（完了）
令和8年10月16日現在

流路工施工状況（鋼材組立設置作業）
令和8年9月24日現在

流路工施工状況（完了）
令和8年10月16日現在

工事施工箇所遠景　令和8年10月16日現在

⑤_大久保治山工事（工事期間：R8.9.2～R9.3.19）

R8.10.30現在の施工内容：航空実播工ほか

資材搬入状況（航空実播工）
令和8年10月23日現在

約42haの大規模崩壊地
令和6年5月29日現在

鋼製谷止工施工状況（R7完了：1/2）
令和8年3月18日現在

鋼製谷止工施工状況（鋼材組立設置作業）
令和8年10月28日現在

工事施工箇所遠景　令和7年10月24日現在

⑥_鳳至（地ホ-1）山腹工事（工事期間：R8.3.24～R9.2.19）

R8.10.30現在の施工内容：法枠工（枠内吹付作業ほか）

山腹工施工状況（R7完了）
令和8年5月19日現在

令和7年度（完了）
山腹工（法枠工ほか）

令和8年度（予定）
山腹工（法枠工）

令和8年度（予定）
大型カゴ枠土留工

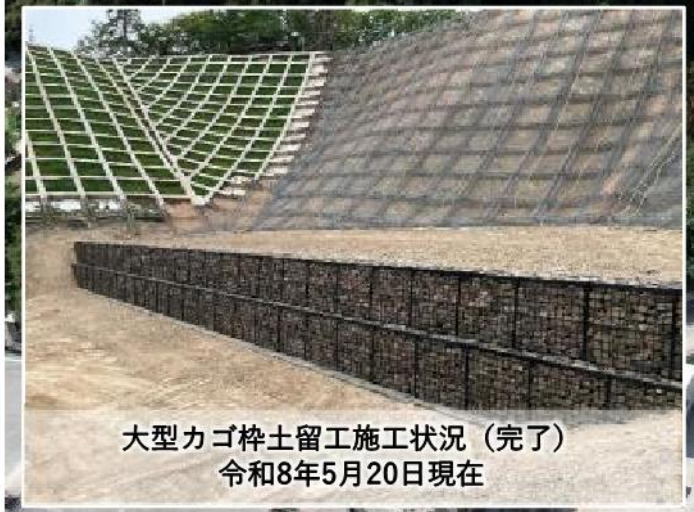

大型カゴ枠土留工施工状況（完了）
令和8年5月20日現在

山腹工施工状況（鉄筋挿入工）
令和8年9月16日現在

山腹工施工状況（法枠工）
令和8年8月10日現在

工事施工箇所遠景　令和8年10月7日現在

⑦_鳳至（ホ-1）施設災害対策工事（工事期間：R8.4.28~R9.3.12）

R8.10.30現在の施工内容：法枠工（金網設置作業ほか）

令和7年度（完了）
山腹工（法枠工ほか）

令和8年度（予定）
山腹工（法枠工）、土砂等撤去整理

土砂等撤去整理作業状況
令和8年7月21日現在

土砂等撤去整理作業状況
令和8年9月17日現在

土砂等撤去整理作業状況
令和8年10月7日現在

山腹工施工状況（R7完了）令和8年3月11日現在

工事施工箇所遠景　令和8年10月7日現在

⑧_興徳寺（ケ-6）渓間工事（工事期間：R8.3.3～R9.1.22）

R8.10.30現在の施工内容：残土整理作業ほか

谷止工(掘削)施工状況（完了）
令和8年7月13日現在

谷止工(鋼製枠組立設置)施工状況
令和8年7月16日現在

谷止工施工状況（完了）
令和8年8月25日現在

鋼製谷止工施工状況（R7完了）
令和7年12月1日現在

令和7年度（完了）
鋼製谷止工

令和8年度（予定）
鋼製谷止工

谷止工下流(側壁・水叩工)施工状況
令和8年10月22日現在

工事施工箇所遠景　令和7年12月1日現在

⑨_興徳寺（ホ-4）山腹工事（工事期間：R8.6.13～R9.3.12）

R8.10.30現在の施工内容：大型カゴ枠土留工(掘削作業ほか)

被災状況　令和6年7月19日現在

令和7年度（完了）
山腹工（鋼製土留工ほか）

令和8年度（予定）
山腹工（筋工、伏工）

令和8年度（予定）
大型カゴ枠土留工

山腹工施工状況（R7完了）
令和8年3月24日現在

山腹工施工状況
令和8年6月2日現在

仮設工（作業ヤード整備状況）
令和8年9月16日現在

資材搬入状況（大型カゴ枠土留工ほか）
令和8年10月22日現在

大型カゴ枠土留工施工状況（掘削作業）
令和8年10月29日現在

工事施工箇所遠景　令和8年3月16日現在

⑩_興徳寺渓間工事（工事期間：R8.6.13～R9.1.8）

R8.10.30現在の施工内容：流路工（掘削作業ほか）

仮設工（作業ヤード整備状況）
令和8年8月26日現在

資材搬入状況（型枠ほか）
令和8年10月22日現在

流路工（掘削作業状況）
令和8年10月29日現在

コンクリート谷止工施工状況（R7完了）
令和8年3月16日現在

工事施工箇所遠景　令和8年3月16日現在
