
平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

○工事概要（十津川村）

平成２３年９月の台風１２号、１５号の災害により、紀伊半島に甚大な被害が発生しました。
奈良県では南部を中心に被害が発生し、十津川村では多数の崩壊地が確認されました。
近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所では、被災箇所を早期に復旧し、平成２７年度に折立工区、平成３０年度に旭工区・高津工区、令和元年度に三田谷工区、令和３年度に山天工区、令和４年度に河津谷工区・五百瀬工区（１号地）、令和７年度に五百瀬工区（２号地）が完成しました。
令和８年度は十津川村において６箇所で民有林直轄治山事業を実施します。

奈良森林管理事務所管轄区域



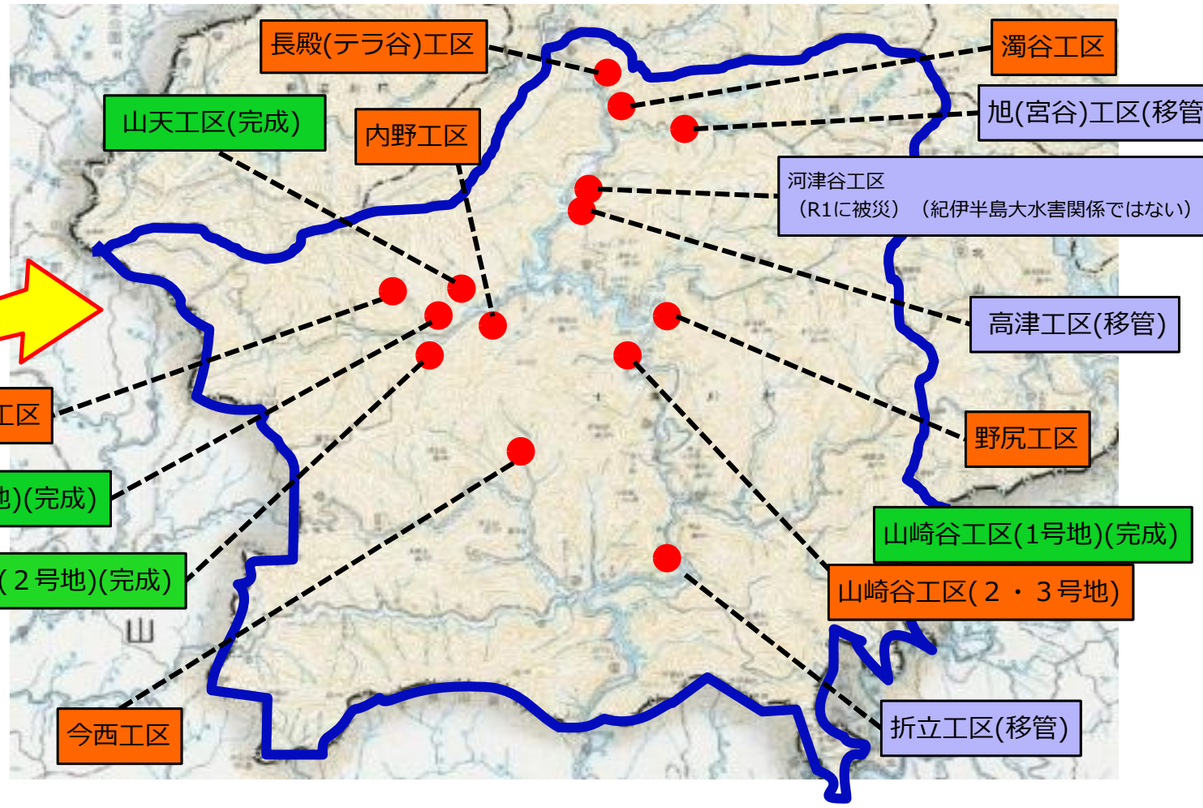

	施工箇所
	完成箇所
	移管箇所

※移管：国による工事が完成し施設を奈良県に引渡しが完了した箇所



野尻工区（被災直後）
・崩壊規模　20.44ha
・対策：谷止工、山腹工



長殿(テラ谷)工区（被災直後）
・崩壊規模　2.75ha
・対策：谷止工、山腹工



五百瀬工区(１号地)（被災直後）
・崩壊規模　0.47ha
・対策：山腹工
（令和４年度工事完了）



折立工区（被災直後）
・崩壊規模　2.36ha
・対策：山腹工
(平成27年度工事完了・移管済)



高津工区（被災直後）
・崩壊規模　2.67ha
・対策：谷止工、山腹工
（平成30年度工事完了・移管済）

平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

今西工区

令和８年10月現在

凡　　例	
	既設
	Ｒ７施工箇所
	次年度以降計画

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：１２.５ｈａ
主要工種：谷止工、山腹工


工期：令和　７年１０月１８日から
　　令和　８年１０月３０日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況

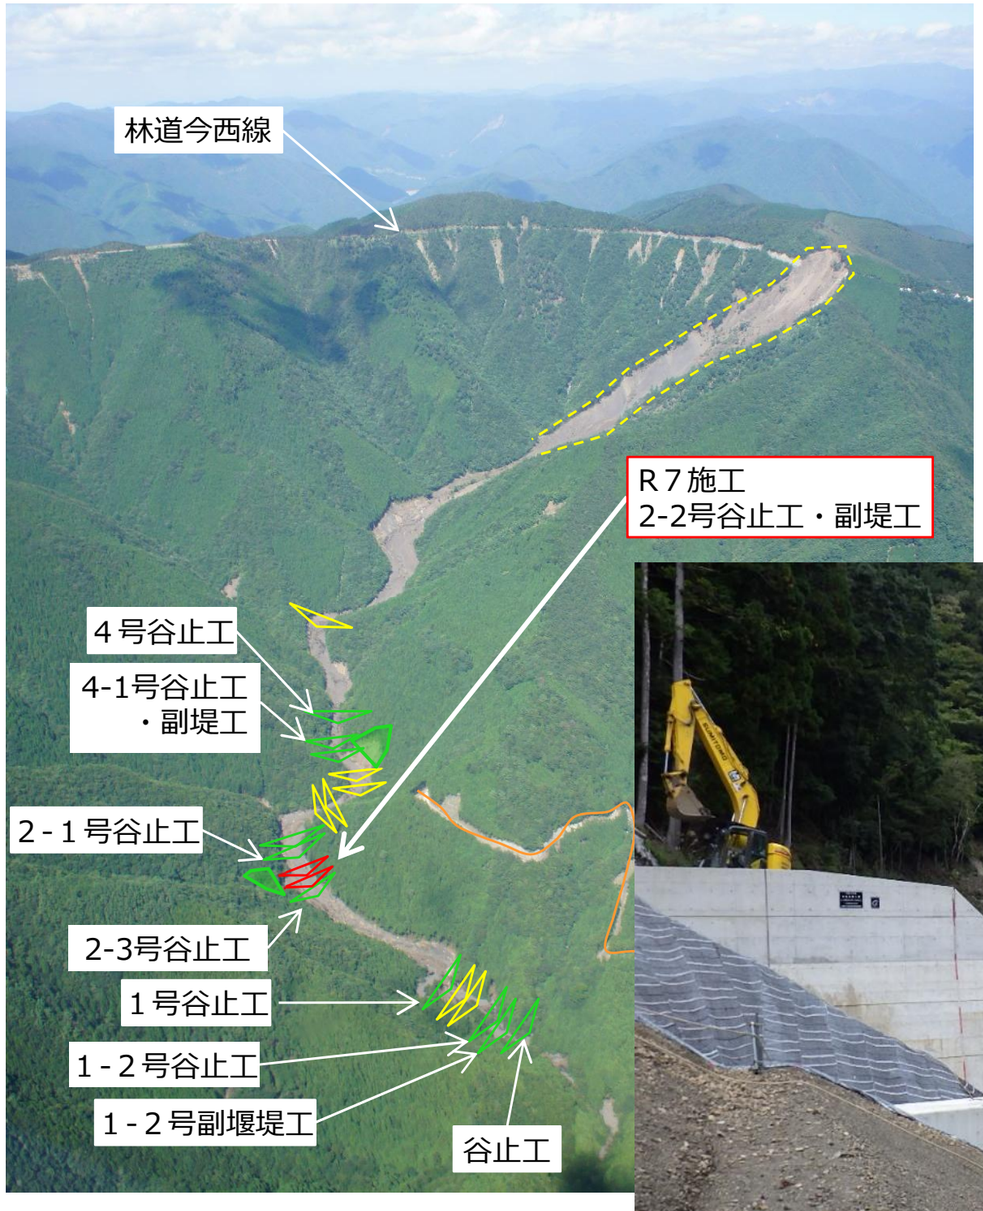





平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

内野工区

令和８年10月現在

○概要

場所：十津川内野

崩壊地面積：４．７９ｈａ
主要工種：谷止工、山腹工


工期：令和　８年　５月　９日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

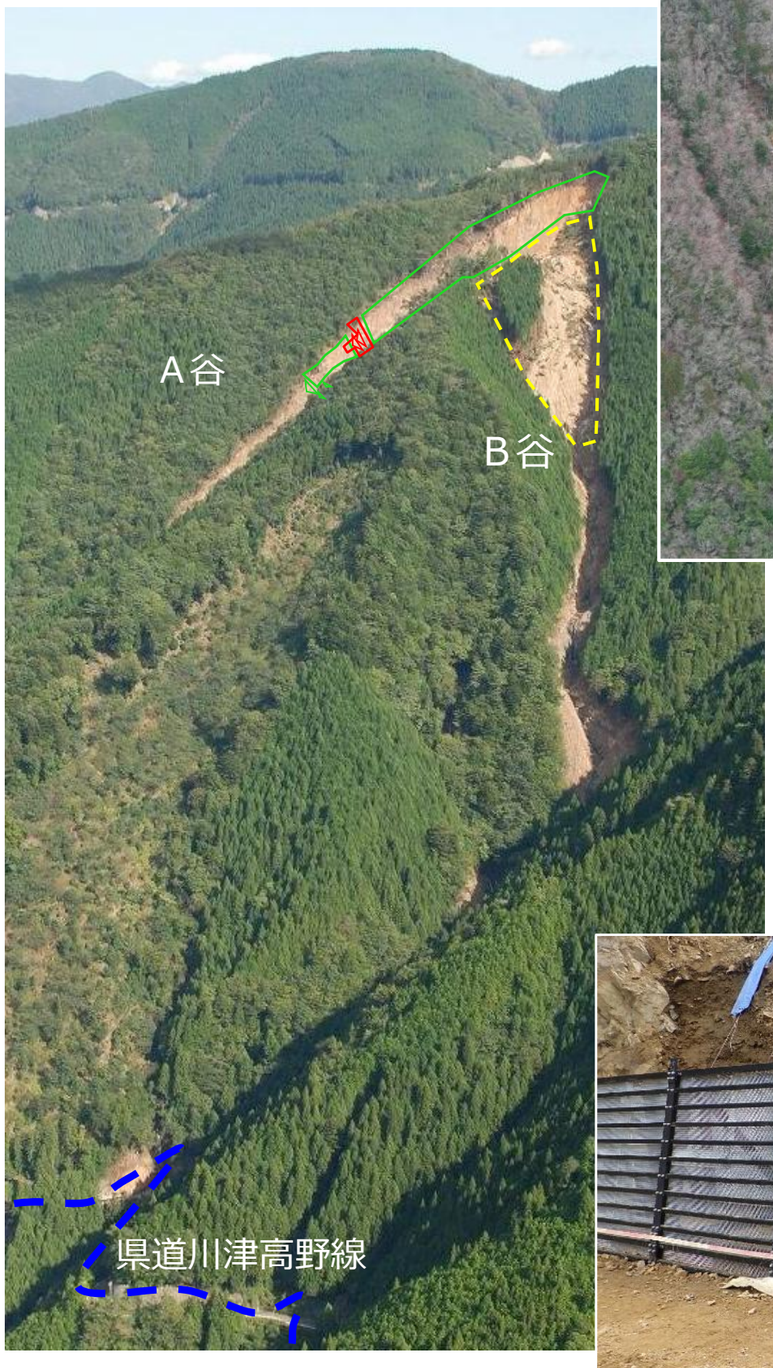



凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画





平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

野尻工区

令和８年10月現在

○概要


場所：十津川村野尻

崩壊地面積：２０.４４ｈａ
主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和　８年　４月２８日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床を安定させ、上部の山腹工を施工して斜面全体の安定を図ります。

○位置

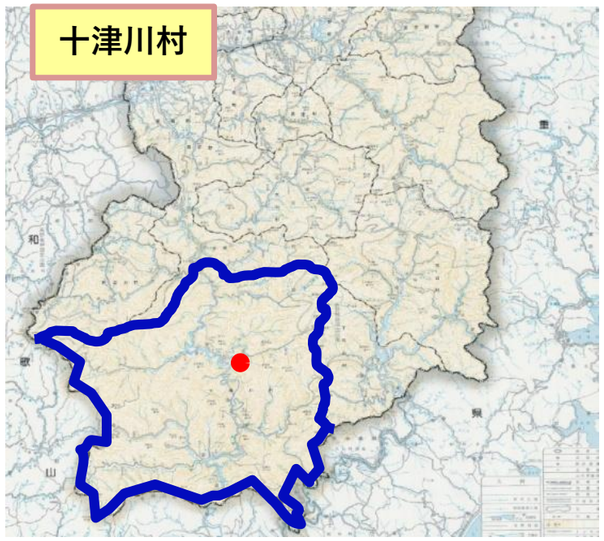

○復旧状況





凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画





平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

山崎谷工区（２号地）

令和８年10月現在

○概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：２．４５ｈａ
主要工種： 山腹工


工期：令和　８年　４月２８日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、谷止工・護岸工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

○位置




○復旧状況

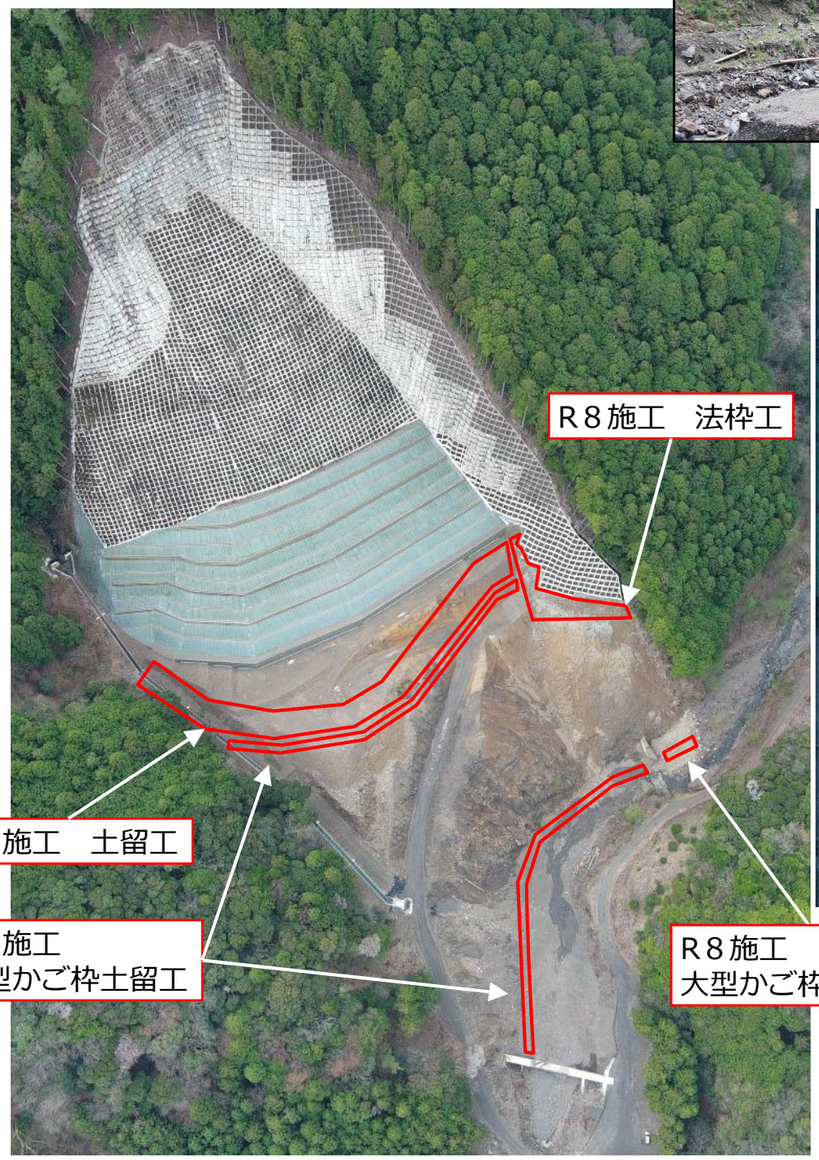

凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画





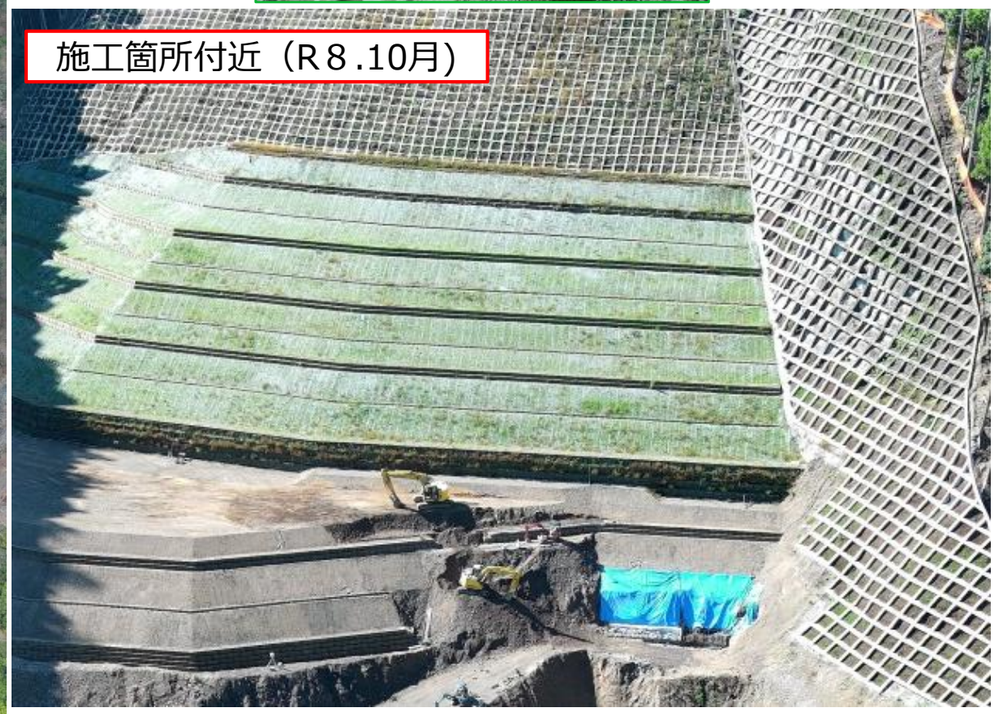



平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

長殿（テラ谷）工区

令和８年10月現在

○概要

場所：十津川村長殿

崩壊地面積：２.７５ｈａ
主要工種：谷止工、山腹工


工期：令和　８年　５月　９日から
　　令和　９年　１月１５日まで

概要
　山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況

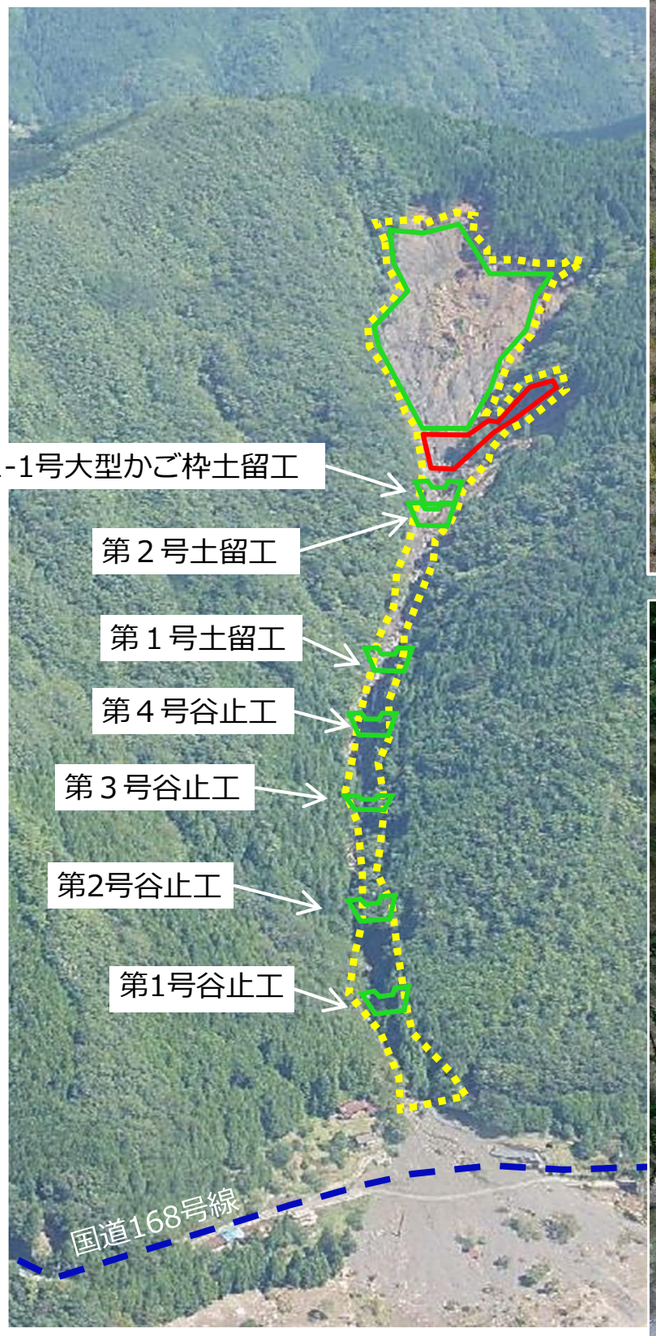



凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画





平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

濁谷工区

令和８年10月現在

凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画

○概要

場所：十津川村宇宮原

崩壊地面積：１６.５ｈａ
主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和　８年　６月１２日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を谷止工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況





