平成23年 紀伊半島大水害 林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）


○工事概要
（五條市・天川村・野迫川村）

平成２３年９月の台風１２号、１５号の災害により、紀伊半島に甚大な被害が発生しました。
奈良県では南部を中心に被害が発生し、十津川村以外にも、五條市や天川村、野迫川村で多数の崩壊地が確認されました。
近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所では、被災地を早期に復旧し、平成２５年度に天川村川合工区が完成、令和３年度には天川村栃尾（桑谷）工区並びに野迫川村檜股工区・五條市堂平工区が完成しました。
令和８年度は天川村において、１箇所で民有林直轄治山事業を実施します。

奈良森林管理事務所管轄区域

奈良県




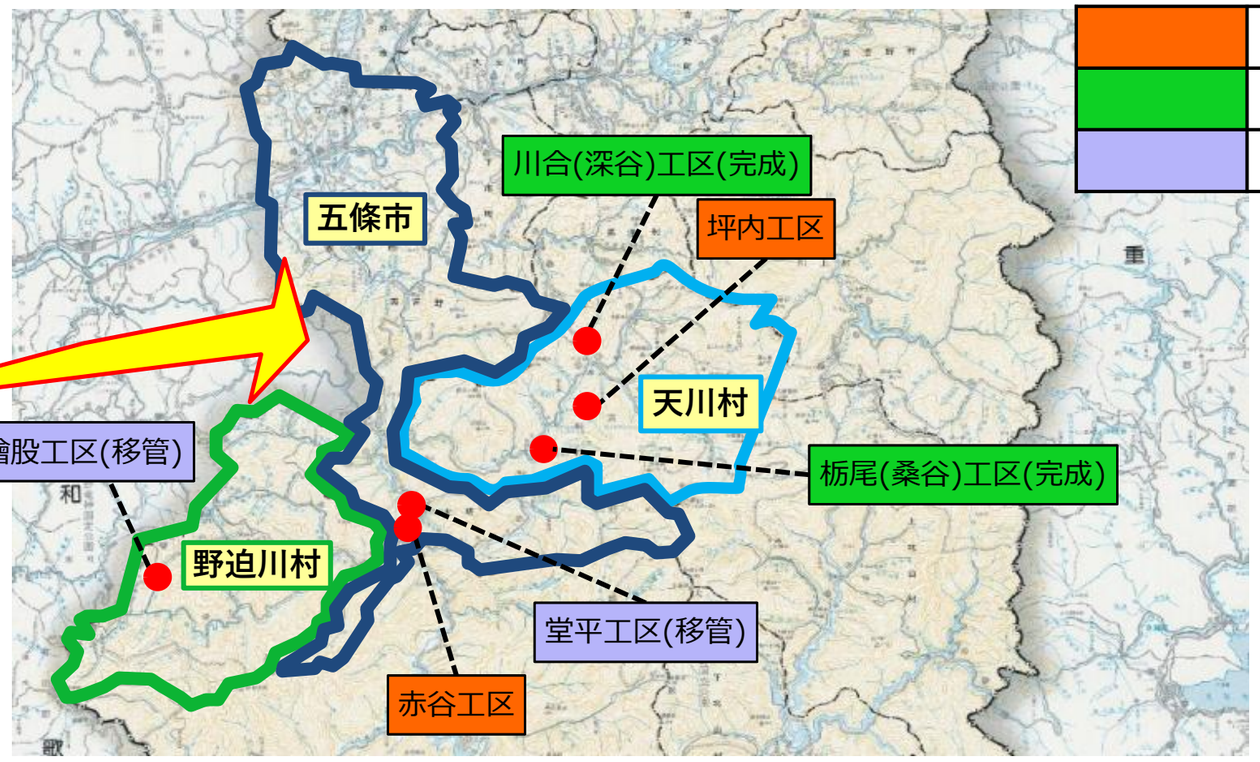

※移管：国による工事が完成し施設を奈良県に引渡した箇所



よしの復興

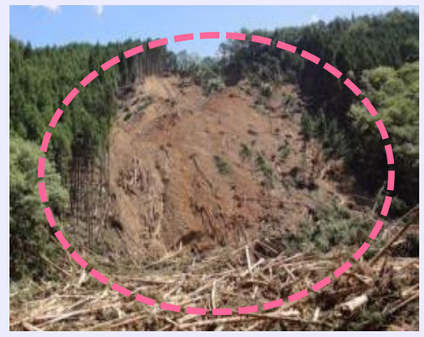

檜股工区（被災直後）
・崩壊規模　1.56ha
・対策：谷止工及び山腹工
（令和３年度工事完了・移管済）



赤谷工区（被災直後）
・崩壊規模　24.86ha
・対策：山腹工及び土留工



坪内工区（被災直後）
・崩壊規模　3.65ha
・対策：床固工及び山腹工



栃尾(桑谷)工区（被災直後）
・崩壊規模　1.5ha
・対策：谷止工及び山腹工
（令和３年度工事完了）



川合(深谷)工区（被災直後）
・崩壊規模　0.54ha
・対策：山腹工
（平成２５年度工事完了）



堂平工区（被災直後）
・地すべり兆候の規 3.00ha
・対策：アンカー工
（令和３年度工事完了・移管済）

平成23年 紀伊半島大水害　林野庁民有林直轄治山事業（近畿中国森林管理局　奈良森林管理事務所）

天川村：坪内工区

令和８年10月現在

凡　　例	
	既設
	Ｒ８施工箇所
	次年度以降計画

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：３．６５ｈａ
主要工種：床固工、護岸工、山腹工
　　排土工

工期：令和　８年　４月２８日から
　　令和　９年　３月　５日まで

概要
　山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

