（様式6）

令和7年度　林分条件調査表

森林管理署	秋田森林管理署
物件番号	1号
物件名	製品生産事業（小黒川国有林）

林小班	保安林種別等	主要樹種	林齢	事業区分	伐採方法	面積	伐採率	平均胸高直径	立木資材量			生産量			予定作業量																最寄り市町村からの距離	備考
															伐倒		集・造材		小運搬				巻立	森林作業道作設		林地保全		土場作設等	砂利数量	薬剤散布（スミハイン）	鉄板規格*枚数		
																			フォワーダ片道運搬距離	数量	ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙ付きﾄﾗｯｸ片道運搬距離	数量	数量	林地傾斜	延長	2種編柵	緑化					
						ha	%	cm	本数	材積 ㎥	㎥/本 ㎥	N ㎥	L ㎥	計 ㎥	方法	数量 ㎥	方式	数量 ㎥	m	㎥	m	㎥	㎥	緩・中・急	m	m	㎡	h	㎥	ℓ		km	
2002ろ	水涵保	秋田スギ	113	一般	皆伐	14.54	100	28	6,771	6,579	0.97	4,879	121	5,000	全木	6,579	プロセッサ	5,000	767	5,000	0	0	4,140	緩					C-0-80 180 ㎡ 割栗石　30㎥		3m*20枚　150日 6m*20枚　150日	大仙市役所 協和支所　7.8	
合計						14.54			6,771	6,579	0.97	4,879	121	5,000		6,579		5,000		5,000		0	4,140		870			バックホウ 0.45㎥ 60h	C-0-80 180 ㎡ 割栗石　30㎥	1,656L （一般材・合板460m³）	3m*20枚　150日 6m*20枚　150日		

1 量の端数は単位以下第1位を四捨五入し、単位止めとする。
2 面積は伐採面積とする。
3 森林作業道作設の林地傾斜欄は以下の区分とする。
　緩:0°～20°、中:20°～30°、急:30°以上

製品生産事業（小黒川国有林）

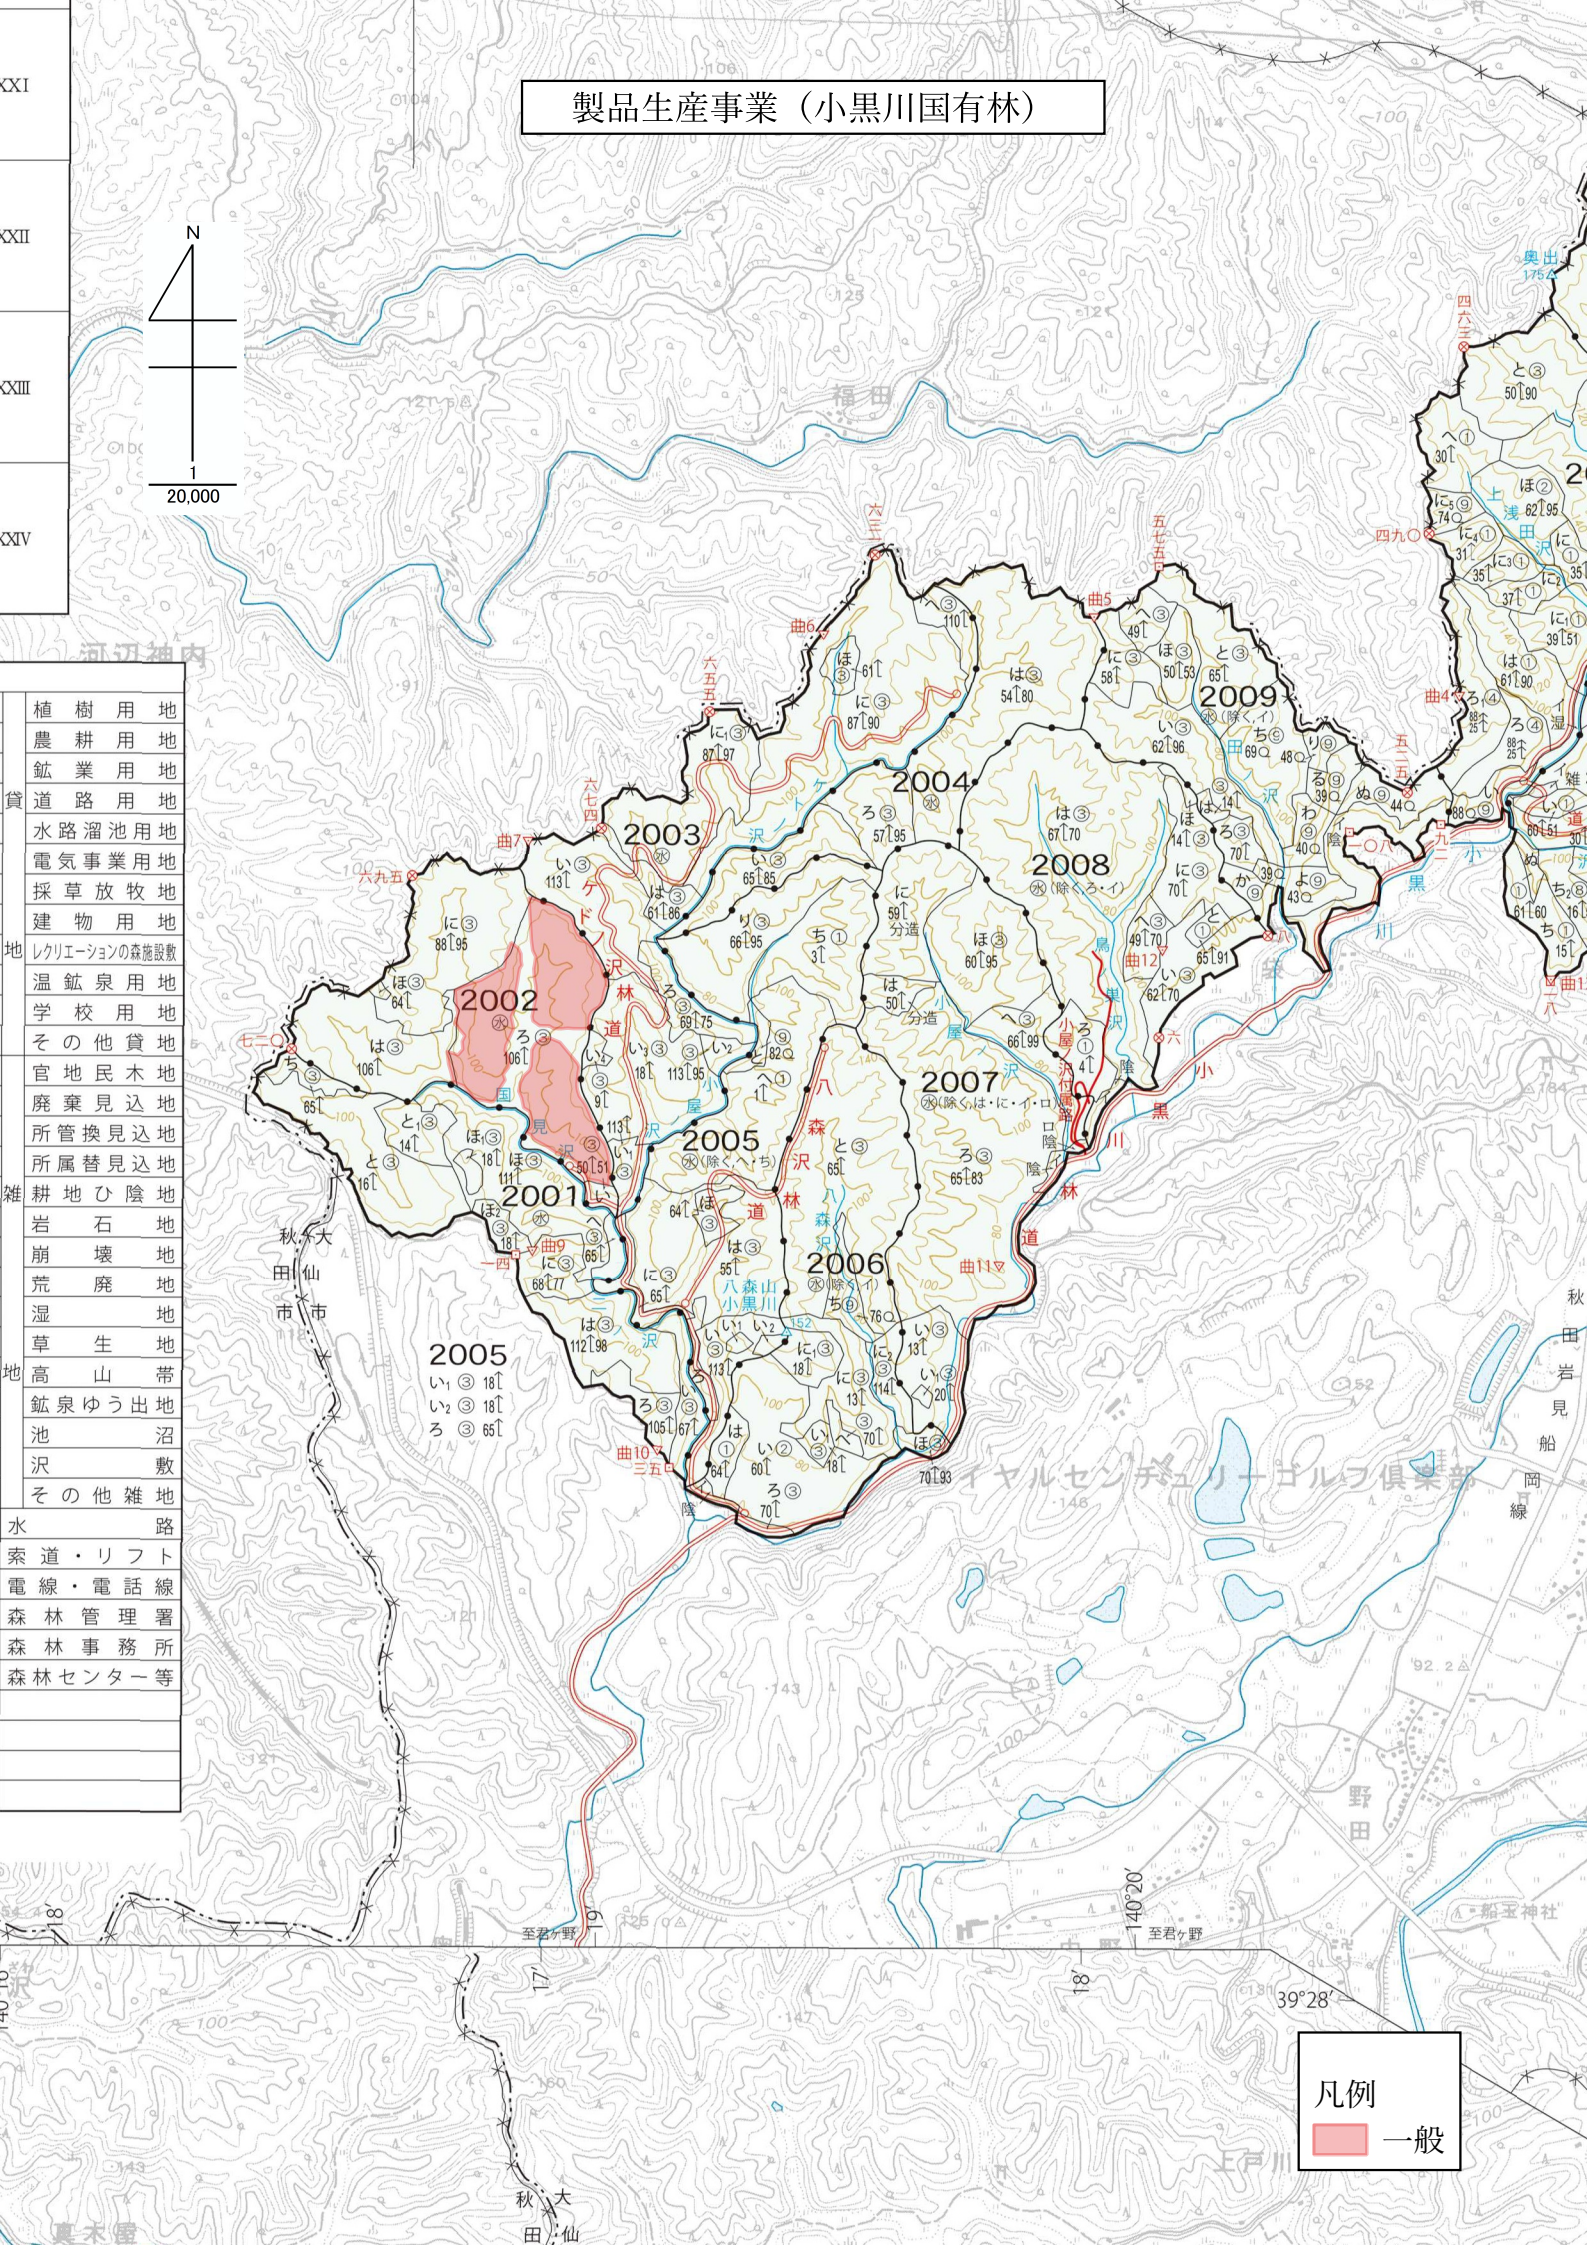

貸地	植樹用地
	農耕用地
	鉱業用地
	道路用地
	水路溜池用地
	電気事業用地
	採草放牧地
	建物用地
	レクリエーションの森施設敷
	温泉用地
	学校用地
	その他貸地
雑地	官地民木地
	廃棄見込地
	所管換見込地
	所属替見込地
	耕地ひ陰地
	岩石地
	崩壊地
	荒廃地
	湿地
	草生地
	高山帯
	鉱泉ゆう出地
	池沼
	沢敷
	その他雑地
水路	
索道・リフト	
電線・電話線	
森林管理署	
森林事務所	
森林センター等	

製品生産事業作業計画図

小黒川国有林
2002ろ林小班
船岡森林事務所

凡例	
	林道
	森林作業道
	一般
	山元土場

N

1
5,000
