

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第2号
- 2 事業場所 十勝西部森林管理署東大雪支署 133林班れ小班ほか
- 3 事業量 地拵（人力機械） 1.86ha
 地拵（大型機械） 6.35ha
 地表処理（大型機械） 11.54ha
 植付（コンテナ苗） 11.70ha（17,120本）
 下刈 6.77ha
 根踏 14.86ha
 作業道修理（路面整正） 6.20km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
 令和8年11月30日まで
 ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
 （うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
 金 円也）
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
 （適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	10分の4以内 第35条第1項
×	中間前金払	第35条第3項
○×	部分払	回以内 第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項 別紙のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の契約日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 河東郡上士幌町字上士幌東3線231番地
 分任支出負担行為担当官
 氏名 十勝西部森林管理署東大雪支署長 今野 智之 印

請負者 住所
 氏名 印

特記仕様書

7年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第2号について、下記の事項を定める。

記

1 苗木の使用について

(1) 植付作業で使用するコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」を締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
(有) 谷口精光園 北斗市本町2丁目2番3号 TEL 0138-77-8101	カラマツ	1号(150cc)	4,200本
	トドマツ	1号(300cc)	960本
(有) 竹内山林緑化 上川郡美瑛町寿町1丁目1-34 TEL 0166-92-3111	クリーンラーチ	1号(150cc)	8,000本


(2) 植付作業で使用する一部（又はすべて）のコンテナ苗木について、下記苗木生産者で取り扱う苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
(有) 竹内山林緑化 上川郡美瑛町寿町1丁目1-34 TEL 0166-92-3111	クリーンラーチ (プライミングペレット)	1号(150cc)	450本


なお、成長調査を行う場合は、協力すること。植栽位置について監督職員等と事前に協議すること。

2 2101 は林小班及びは1林小班の地表処理（表土戻し作業）については、次のとおりとする。


(1) 通常のかき起こしを実施後（下図①）、かき起こした表土と下層植生を敷き戻すこと（下図②）。



(2) かき起こしの際はササの地下茎の最深部まで掘削し、根茎を切断すること。

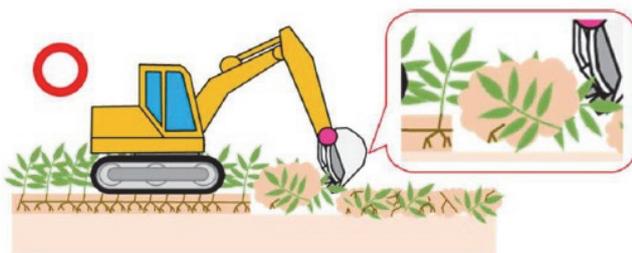

○良い例 ササの根茎の最深部まで掘削している



△悪い例 ササの根茎が残っている

(3) 以上の記載事項以外に、指示・承認を要する事案が生じた場合には、監督職員等と協議すること。

事業内訳書

コンテナ苗植付

7年度東大雪支署【上士幌・鹿追・新得地区】保全整備造林第2号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
三股	176 は	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	0.54	0.54	960	1	4.0	1.46	1	契約締結日の翌日	R8.6.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		0.54	0.54	960							
		三股 計		0.54	0.54	960							
岩松	1006 ろ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	4.16	1.86	2,900	1	3.5	1.83	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
岩松	1006 ろ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	4.16	1.91	2,970	2	4.0	1.43	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
岩松	1041 ろ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ(コン テナ苗)	17.06	3.90	6,090	6	4.0	1.60	1	契約締結日の翌日	R8.6.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		25.38	7.67	11,960							
		岩松 計		25.38	7.67	11,960							
新得	2010 ま1	改植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	3.61	3.49	4,200	2	2.0	1.43	1	契約締結日の翌日	R8.6.30	
		改植 コンテナ苗植付 計		3.61	3.49	4,200							
		新得 計		3.61	3.49	4,200							
合計				29.53	11.70	17,120							

別紙

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとします。
