

令和7年度

赤谷林道災害復旧工事

閱 覧 図 書

添付書類

1. 入札者注意書
2. 契約書（案）
3. 工事数量内訳明細書
4. 森林整備保全事業工事標準仕様書
5. 特記仕様書

奈良森林管理事務所

入札者注意書

入札者（代理人を含む。以下同じ。）は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。

- 1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。
- 2 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
- 3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
- 4 入札書は、電子入札システム（以下「電子入札」という。）に基づくものとする。
なお、電子入札により難しい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式（以下「紙入札」という。）に代えることができる。（別紙様式1、2）
ただし、紙入札による入札書は所定の用紙（別紙様式4）を使用し、入札案件毎に別葉として持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による入札書の提出は認めない。
- 5 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額（契約金額）とする。
- 6 電子入札による入札の場合は、電子入札システム運用基準（令和5年6月林野庁）に基づくものとする。
- 7 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。
- 8 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状（別紙様式5）又は委任権限を証明した書類を提出すること。
また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。
- 9 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。
- 10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。
- 11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
 - (1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書
 - (2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
 - (3) 紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書
 - (4) 紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書
 - (5) 紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書
 - (6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書
 - (7) 紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書
 - (8) 紙入札において、入札時刻に遅れてした入札
 - (9) 入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書

- (10) 明らかに連合によると認められる入札書
 - (11) 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書
 - (12) 入札保証金（その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。）の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき
 - (13) 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき
 - (14) 入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき
 - (15) 暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札
 - (16) その他入札に関する条件に違反した入札
- 12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。
- 13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。
また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。
ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第26条違反になる場合は、直ちに発注者に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関する申出書（別紙様式3）の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。
- 14 開札は電子入札により行うこととし、電子入札システム運用基準（令和5年6月林野庁）に定める立会官が立ち会って行う。
ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。
なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。
- 15 開札の結果、予定価格に達する者がいないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。
その場合、無効の入札をした者は参加することができない。
なお、入札の回数は原則として2回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。
- 16 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。
(1) 予定価格が1千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあつて、著しく不適當であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。
(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。
(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。
(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。
- 17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。

なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知するものとする。

- 18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。
- 19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額（入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額）の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。
- 20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めるときは、入札の執行を中止する。
- 21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。
- 22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基準（令和5年6月林野庁）を熟知しておくものとする（農林水産省ホームページ・農林水産省電子入札センター）。
- 23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
- (5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

(別紙様式1)

紙入札方式参加承諾願

1 発注工事(業務)名

2 電子入札システムでの参加ができない理由
(記入例)

認証カードの発行手続きが遅れているため。

年 月 日 認証カードを取得予定

上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。

年 月 日

住 所

商号又は名称 ○○ 株式会社

代表者氏名 ○○ ○○

(契約担当官等の官職氏名)

殿

上記について承諾します。

年 月 日

殿

(契約担当官等の官職氏名)

(別紙様式2)

入札方式変更承諾願

1 発注工事(業務)名

2 入札方式を変更する理由
(記入例)

認証カードが破損したため。

年 月 日 認証カードを取得予定

上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での参加に変更することを承諾いただきますようお願いいたします。

年 月 日

住 所
商号又は名称 ○○ 株式会社
代表者氏名 ○○ ○○

(契約担当官等の官職氏名)

殿

上記について承諾します。

年 月 日

殿

(契約担当官等の官職氏名)

(別紙様式3)

技術提案書等の取り下げに関する申出書

1 発注工事(業務)名

2 技術提案書等を取り下げる理由

(記載例)

他の工事(業務)の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。

※ 入札書提出後(同時提出型を含む)においては、記載例の理由に限る。

年 月 日

住 所

商号又は名称 ○○ 株式会社

代表者氏名 ○○ ○○

(契約担当官等の官職氏名)

殿

(別紙様式4)

入札書

入札物件 第 号

発注工事(業務)名

入札金額	億	千万	百万	十万	万	千	百	十	円

ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日

(分任) 支出負担行為担当官

〇〇森林管理局(〇〇森林管理署)長 ○ ○ ○ ○ 殿

入札者

住所

商号又は名称

代表者氏名

代理人氏名

(別紙様式5)

委任状

令和 年 月 日

(分任) 支出負担行為担当官

〇〇森林管理局 (〇〇森林管理署) 長 〇 〇 〇 〇 殿

委任者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

私は、都合により
下記の入札に関する一切の権限を委任します。

を代理人と定め、

記

発注工事 (業務) 名

工事請負契約書（案）

- 1 工 事 名 赤谷林道災害復旧工事
- 2 工 事 場 所 奈良県五條市大塔町(赤谷国有林)
- 3 工 期 契約締結の翌日から
令和9年1月22日まで
- 4 工事を施工しない日 定めない
工事を施工しない時間帯 定めない
- 5 請 負 代 金 額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 . -)
- 6 契約保証金額
- 7 前 金 払 請負代金額の10分の4以内
- 8 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
[]建設工事紛争審査会
- 9 選 択 条 項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適 用 削 除 の 区 分	選 択 事 項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
	[]主任技術者	第10条第1項第2号
	[]監理技術者	
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	第35条第1項
	中間前金払	第35条第5項
	部分払	1回以内
	部分払の対象となる工場製品	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

10 適用条項

別冊約款の第3条、第25条、第26条、第30条、第38条、第39条に代えて、別紙2記載条項を適用する。

11 解体工事に要する費用等 別紙3のとおり(注)

(注) 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。

12 特約事項

(1) 請負代金は近畿中国森林管理局で支払うものとする。

(2) 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担 別紙1のとおり。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年1月21日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 (住所) 奈良県奈良市赤膚町1143-20
分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
(氏名) 奈良森林管理事務所長 川上 吉伸 印

受注者 (住所)

(氏名) 印

別紙1

第1 繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担(以下「翌債」という)に基づく契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という)は次のとおり。

令和7年度	前金額	円
-------	-----	---

令和8年度	契約額－前金額	円
-------	---------	---

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は次のとおりとする。

令和7年度	0	円
-------	---	---

令和8年度	契約額	円
-------	-----	---

別紙2

(請負代金内訳書、工程表及び単価合意)

第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

2 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)並びに建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金を明示するものとする。

(注)「健康保険料等」とは、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保険料及び労働者災害補償保険料をいう。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

4 発注者及び受注者は、この契約締結後、速やかに、この契約書に係る単価等を協議し、単価合意書(「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知)6.(1)に規定する単価合意書をいう。以下同じ。)を作成の上、合意するものとする。この場合において、協議開始の日か14日以内に当該協議が整わない時は、発注者が単価等を定め、受注者に通知する。

5 第4項の規定は、請負代金額の変更があった場合において準用する。

6 第4項(前項において準用する場合を含む。)の単価合意書は、第26条第3項の規定により残工事代金額を定める場合並びに第30条第5項、第38条第6項及び第39条第2項に定める場合(第25条第2項各号に掲げる場合を除く。)を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。

7 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の対象工事であり、受発注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

(請負代金額の変更方法等)

第25条 請負代金額の変更については、第3条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により作成した単価合意書の記載事項を基礎として発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 次に掲げる場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

一 数量に著しい変更が生じた場合。

二 単価合意書の作成の前提となっている施工条件と実際の施工条件が異なる場合。

三 単価合意書に記載されていない工種が生じた場合。

四 前各号に掲げる場合のほか、単価合意書の記載内容を基礎とした協議が不相当である場合。

3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

4 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不相当となったと認めるときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、単価合意書の記載事項、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

9 発注者は、第3項又は第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注者が第60条に規定するあつせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

(不可抗力による損害)

第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

- 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工事目的物であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下この条において「損害合計額」という。）のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
- 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。この場合においては、第25条第2項各号に掲げる場合を除き、単価合意書の記載事項に基づくものとする。
- 一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
 - 二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
 - 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
- 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

（部分払）

- 第38条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕（第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあつては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあつては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中1回を超えることができない。
- 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。
- 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
- 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
- 5 受注者は、第3項の規定による確認があつたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

- 6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同条第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額 \leq 第1項の請負代金相当額 \times (9/10-前払金額/請負代金額)

- 7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

- 2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、単価合意書の記載事項に基づき定め、第25条第2項各号に掲げる場合には発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額

=指定部分に相応する請負代金の額 \times (1-前払金額/請負代金額)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

1 分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分 別 解 体 等 の 方 法
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2 解体工事に要する費用(直接工事費) _____ 円(税抜き)

(注)・解体工事の場合のみ記載する。

- ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
- ・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地

(注)建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用(直接工事費) _____ 円(税抜き)

(注)運搬費を含む。

工事数量内訳明細書

工事名：赤谷林道災害復旧工事

工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量
工事区分 (レベル1)	工種 (レベル2)	種別 (レベル3)	細別 (レベル4)			
林道施設災害復旧				L=38.0m	式	1.00
	土工				式	1.00
		掘削工			式	1.00
			掘削(土砂)	(堆積土)	m3	15.00
			掘削(土砂)	(礫質土)	m3	1.00
			床掘(土砂)	(礫質土)	m3	20.00
			床掘(岩)	(中硬岩)	m3	56.00
		盛土工			式	1.00
			盛土(流用土)	1種盛土	m3	20.00
			埋戻し		m3	27.00
		残土処理工			式	1.00
			残土処理		m3	36.00
	擁壁工				式	1.00
		重力式コンクリト擁壁工			式	1.00
			コンクリト	18-8-40BB	m3	38.90
			型枠(躯体)	一般型枠 鉄筋無筋構造物	m2	100.10
			型枠(基礎)	一般型枠 均しコンクリト	m2	22.40
			足場	キャットウォーク	m	14.20
			目地板	t=10mm 瀝青繊維質目地板	m2	4.50
			水抜パイプ	VU φ75mm	m	7.00
			埋戻しコンクリト	18-8-40BB	m3	9.00
	排水構造物工				式	1.00
		横断工			式	1.00
			横断溝蓋	グレーチング	枚	4.00
			U型横断溝	U300B	m	4.80
	落石雪害防止工				式	1.00
		落石防止工			式	1.00
			固定(ロ-フ [°] 伏工)		m2	983.30
			固定(ロ-フ [°] 掛工)		m2	41.30
	構造物撤去工				式	1.00
		構造物取壊し工			式	1.00
			コンクリト構造物取壊し	無筋構造物	m3	3.10
		落石雪害防止撤去工			式	1.00
			落石防止網(繊維網)撤去		m2	897.70
仮設工					式	1.00
	仮設工				式	1.00
		工事用道路			式	1.00
			工事用道路補修		km	3.00
		仮水路工			式	1.00
			洗堀防止工	基礎部	m2	9.90
			洗堀防止工	集水部	m2	6.80
		運搬設備工			式	1.00
			モノレール運搬設備	500kg積/45° 施工延長75m リース期間4カ月	式	1.00

森林整備保全事業工事標準仕様書

平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知(最終改正 令和7年3月31日付け6林整計第670号)で定められた森林整備保全事業工事標準仕様書を使用するものとする。

森林整備保全事業工事標準仕様書に記載されていない特殊な工種等については、特記仕様書による。

特記仕様書

特記仕様書(一般事項)

工事成績評定に関する特記仕様書

間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書

現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書

小黑板情報電子化特記仕様書

森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書

熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書

電子納品に関する特記仕様書

工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書

現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)

ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書

間伐材を活用した合板特記仕様書

水抜特記仕様書、モルタル特記仕様書

コンクリート特記仕様書

落石防止工(ロープ伏工)に関する特記仕様書

落石防止工(ロープ掛工)に関する特記仕様書

特記仕様書

安全・訓練等

1 土石流のおそれのある工事箇所における安全確保

土石流のおそれのある箇所で行う工事においては以下の点に留意して施工計画書を作成、適切に実施するものとする。また、安全確保対策について契約内容の変更等が必要であれば監督職員に協議するものとする。

(1) 見張り等の状況確認、作業内容、工法等の検討

土石流発生形態を踏まえ、見張り等による状況確認や土石流災害を回避できる作業内容・工法等の検討

(2) 避難路の検討

作業場所からの避難場所へ安全かつ迅速に退避できる避難路の検討

(3) 避難訓練の実施

合図、連絡、避難方法等を徹底する避難訓練の実施

(4) その他必要な措置

2 同一溪流内で同時期に実施する工事の調整等

同一溪流内で同時期に実施する他の工事がある場合には、監督職員の指導に基づき、次の事項について調整を図り、適切に実施するものとする。

(1) 施工方法、工程等を定めた工事の施工計画に関する具体的な連絡調整

(2) 土石流に対する警戒避難等を含む防災体制に関する具体的な連絡調整

(3) 安全巡視の連携実施

(4) 安全対策に関する研修・訓練の連携実施

法定外の労災保険の付保

受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保険」という。)に付さなければならない。なお、法定外の労災保険に係る保険料等の費用は、現場管理費率の中に計上されている。

アフリカ豚熱(ASF) 対策

受注者は、山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時におけるアフリカ豚熱(ASF)の感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。

受注者は、アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款第20条第2項に基づき工事を一時中止する可能性がある。

工事成績評定に関する特記仕様書

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出について、所定の様式により提出することができる。

高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況

工事名		受注者名		
項目	評価内容	備 考		
<input type="checkbox"/> 高度技術 工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力	<input type="checkbox"/> 施工規模	対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度		
	<input type="checkbox"/> 構造物固有	複雑な形状の構造物 既設構造物の補強、特殊な撤去工事		
	<input type="checkbox"/> 技術固有	特殊な工種及び工法 新工法(機器類を含む)及び新材料の適用 各種調査等の工事		
	<input type="checkbox"/> 自然条件等	特殊な土壌。地質の影響 湧水、地下水の影響 制約の厳しい工事用道路・作業スペース等 気象現象の影響 資材運搬の制限の影響 動植物等への配慮、山林砂防工の適用の有無		
	<input type="checkbox"/> 社会条件等	埋設物等の地中内の作業障害物 鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工 周辺住民、周辺環境、景観への配慮対策 廃棄物処理 現道上の交通規制		
	<input type="checkbox"/> 現場での対応	災害等での臨機の処理 施工状況(条件)の変化の対応		
	<input type="checkbox"/> その他			
	<input type="checkbox"/> 創意工夫 「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫	<input type="checkbox"/> 準備・後片付け		
		<input type="checkbox"/> 施工関係	施工に伴う機械、器具、工具、装置類 二次製品、代替製品の利用 施工方法の工夫 施工環境の改善 仮設計画の工夫 施工管理、品質管理の工夫 自然環境への影響軽減の工夫	
		<input type="checkbox"/> 品質関係		
<input type="checkbox"/> 安全衛生関係		安全施設・仮設備の配慮 安全教育・講習会・パトロールの工夫 作業環境の改善 交通事故防止の工夫		
<input type="checkbox"/> 施工管理関係				
<input type="checkbox"/> その他				
<input type="checkbox"/> 社会性等 地域社会や住民に対する貢献		<input type="checkbox"/> 地域への貢献等	地域の自然環境保全、動植物の保護 現場環境の地域への調和 地域住民とのコミュニケーション ボランティアの実施	

1. 該当する項目に□にレマーク記入。
2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料として整理。

高度技術・創意工夫・社会性等の関する実施状況(説明資料)

工 事 名		/d
項 目	評価内容	
提 案 内 容		
(説 明)		
(添付図)		

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。

間伐材、合法性・持続可能性が証明された木材の利用促進に関する特記仕様書

第1条 木材

当該工事の施工に係る木材については、次によるものとする。

- ① 間伐材又は合法性・持続可能性が証明された木材を使用すること。
- ② 前述の木材のうち、合法性・持続可能性が証明された木材である場合は、証明書を監督職員に提出し確認を受けること。
- ③ 現場で発生した支障木等を利用する場合は、監督職員の指示に従うとともに、必要な手続きを行うこと。

第2条 工事看板等

- ① 工事看板又は工事を周知する掲示物は、地元住民や通行車から認知される場所に設置し、工事の実施に関し周知させること。
- ② 工事看板又は工事を周知する掲示物には「間伐材、合法材利用促進工事」である旨を表記すること。
(別途定規図がある場合、又は監督職員が別途指示する場合は、それによること)

【工事看板作成例】 記載例1



記載例2



記載例3



現場環境改善(快適トイレの設置)特記仕様書

本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する工事である。

1. 内容

受注者は、現場に以下の(1)～(11)の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。(12)～(18)については、満たしていればより快適に使用できるものと思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

- (1) 洋式便器
- (2) 水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付き含む)
- (3) 臭い逆流防止機能
- (4) 容易に開かない施錠機能
- (5) 照明設備
- (6) 衣類掛け等のフック付、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)

【付属品として備えるもの】

- (7) 現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示
- (8) 入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)
- (9) サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置)
- (10) 鏡と手洗器
- (11) 便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

- (12) 室内寸法900×900mm以上(面積ではない)
- (13) 擬音装置(機能を含む)
- (14) 着替え台
- (15) 臭気対策機能の多重化
- (16) 室内温度の調整が可能な設備
- (17) 小物置き場(トイレトーパー予備置き場等)
- (18) 付属品等の木質化

2. 快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。

【快適トイレに求める機能】(1)～(6)及び【付属品として備えるもの】(7)～(11)の費用については、従来品相当(10,000円/月)を差し引いた後、51,000円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)^{*}までとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)^{*}より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。

※「施工箇所が点在する工事の積算方法」を適用する工事等トイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所計上できるものとする。

3. その他

快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議を行い対象外とする。

小黑板情報電子化特記仕様書

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、受発注者間協議によりデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」という。)とすることができる。

なお、対象工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2. 管理の実施(3)黑板」に示す項目の電子的記入ができること。かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」)に記載している技術を使用していることとする。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、使用機器について掲示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」記載の「デジタル工事写真の小黑板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。

ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における小黑板情報の電子的記入

受注者は、同条1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黑板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黑板情報の電子的記入を行う項目は、森林整備保全事業工事写真管理基準「2. 管理の実施(3)黑板」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黑板情報の電子的記入の取扱い

工事写真の取扱いは、森林整備保全事業工事写真管理基準に準ずるが、同条2. に示す小黑板情報の電子的記入については、森林整備保全事業工事写真管理基準「2. 管理の実施(6)」で規定されている画像編集には該当しない。

4. 小黑板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条2. に示す小黑板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黑板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお、納品時に、受注者は、URL「<http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html>」のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黑板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

森林土木工事における受発注者間の情報共有システム特記仕様書

1. 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
2. 情報共有システムの活用は、「森林整備保全事業の工事並びに調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。
3. 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用に当たっての評価を行うために聞き取り調査等を求められた場合、これに協力しなければならない。
4. 費用(登録料及び使用料)は、共通仮設費率(技術管理費)に含まれる。

熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書

1. 対象工事等

本工事は、「熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行工事」として、日最高気温の状況に応じた現場管理費率の補正を行う対象工事である。

2. 用語の定義

(1) 真夏日

日最高気温が30℃以上の日をいう。

(2) 工期

工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間を含まない。

(3) 真夏日率

工期内の真夏日を工期で除した割合をいう。

3. 積算方法等

(1) 補正方法

ア 発注者は、受注者より提出された計測結果の資料をもとに、工期中の補正後の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正値を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとし、補正値の算定は、次によるものとする。

$$\text{補正値(\%)} = \text{真夏日率} \times \text{補正係数}$$

イ 「森林整備保全事業設計積算要領」第6-1-(2)-イ-(ウ)-aと合わせて適用する場合の補正値の上限は、2.0%とする。

ウ 補正値及び真夏日率は、小数点以下3位を四捨五入して、2位止めとする。

(2) 補正係数

補正係数は、1.2とする。

4. 気温の計測方法等

受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出するものとする。

(1) 計測方法

気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所または地域気象観測所(以下「地上・地域気象観測所」という。)の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これによりがたい場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁以外の者が行う気温の計測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とする。

(2) 気温の補正方法

受注者は、(1)の気温の計測結果(工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を除く。)は、次の算定式により補正を行うものとする。ただし、気象条件又は現場条件により次の補正方法によりがたい場合は、監督職員と協議の上、決定するものとする。

【算定式】

補正後の気温(°C)

$$= \text{気温(°C)} - \text{標高差(m)} \times 0.6 / 100(\text{m})$$

※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m) = 工事現場の標高(m) - 計測箇所の標高(m)

(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)

※標高差の値は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

(3) 工事現場の標高

気温の補正に用いる工事現場の標高は、着手前の地形において、作業(仮設工事を含む)を行う最も標高が低い箇所を標準とし、10m未満切り捨てとする。なお、標高値については、契約図面を用いることを標準とするが、これにより難しい場合は、監督職員と協議の上、工事現場の標高を決定するものとする。

(4) 計測結果の報告

施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出する。

5. 施工箇所が点在する工事への適用

施工箇所が点在する工事については、点在する箇所ごとに補正を行うことができる。

6. その他

上記の取り扱いについて、地域の実情により対応が困難な場合等については、監督職員と協議の上、これによらないことができる。

電子納品に関する特記仕様書

1. 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。
電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。
2. 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。
3. 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。
4. 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されていないことを確認した上で提出するものとする。

工事現場等における遠隔臨場に関する特記仕様書

本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

1 実施方法

本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする。

2 効果把握のためのアンケート調査

本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。

現場閉所による週休2日特記仕様書(発注者指定方式)

1. 週休2日の取組

本工事は、現場閉所による週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)であり、その実施に当たっては次によるものとする。

(1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。

(2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

ア 現場閉所による月単位の週休2日とは、対象期間において、月単位の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

現場閉所による通期の週休2日とは、対象期間において、通期の4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、その他発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

ウ 月単位の4週8休とは、対象期間内の全ての月で現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。

ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)の水準の状態とみなす。

通期の4週8休とは、対象期間内の現場閉所率が28.5%(8日/28日)の水準の状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

エ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書(平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。)第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

(3) 本工事では、表1に掲げる現場閉所の状況に応じた補正係数(以下「週休2日補正係数」という。)のうち月単位の4週8休以上を達成した場合の補正係数を、当初から労務単価、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、当該達成状況が月単位の4週8休以上でない場合は、通期の4週8休以上の補正係数に変更し、請負代金額を変更する。

通期の4週8休に満たないものについては、通期の4週8休以上の補正係数を除いた変更を行うものとする。

ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない等の理由により、現場閉所の達成状況が4週8休以上でなかったときは、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。

表1

現場閉所の状況	月単位の4週8休以上	通期の4週8休以上
労務単価	1.04	1.02
機械経費(賃料)	1.02	1.02
共通仮設費率	1.03	1.02
現場管理費率	1.05	1.03

※見積りによる単価等のうち労務単価、機械経費(賃料)が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

表2

名 称	区 分	月単位の 4週8休以上	通期の 4週8休以上
鉄筋工(太径鉄筋を含む)		1.04	1.02
鉄筋工(ガス圧接)		1.03	1.02
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.01	1.00
	撤去	1.04	1.02
防護柵設置工 (横断・転落防止柵)	設置	1.04	1.02
	撤去	1.04	1.02
防護柵設置工(落石防止柵)		1.01	1.01
防護柵設置工(落石防止網)		1.02	1.01
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.01	1.00
	撤去	1.04	1.02
道路標識設置工	設置	1.01	1.00
	撤去・移設	1.03	1.02
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.04	1.02
法面工		1.02	1.01
吹付砕工		1.03	1.01
軟弱地盤処理工		1.02	1.01
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.03	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04	1.02

表3

名 称	区 分	月単位の 4週8休以上	通期の 4週8休以上
区画線工		1.04	1.02
排水構造物工		1.04	1.02
コンクリートブロック積工		1.04	1.02
構造物取りこわし工	機械	1.03	1.02
	人力	1.04	1.02
橋梁塗装工		1.03	1.01
塗膜除去工		1.04	1.02
道路反射鏡設置工	設置	1.01	1.00
	撤去	1.04	1.02
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		1.04	1.02

- (4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の休日取得計画(実績)書を作成し、休日取得計画書(別紙1)にあつては当該作業計画月の前月末(初回月分は工事着手日前)までに、休日取得実績書(別紙2)にあつては当該作業実施月の翌月初め(最終月分は工事完成後)までに速やかに監督職員へ提出する。
- (5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を掲示する。
- (6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
- (7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組む別紙3のアンケートについて記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
- (8) 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は週休2日の取組実績証明書を発行する。

○ 休日取得(計画・実績)書

工事件名: ○○工事

別紙1

令和○年 ○月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考						
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							
工程	現場事務所の設置、資材の搬入	計画																																					
		実績																																					
	仮設工	計画																																					
		実績																																					
	土工	計画																																					
		実績																																					
	法面工	計画																																					
		実績																																					
		計画																																					
		実績																																					
		計画																																					
		実績																																					
		休日	作業日	当月の休日数割合		休日率																																	
元請	○○建設	現場代理人	林野 太郎				作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.6%
		監理技術者	林野 一郎				作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.6%
		職員	林野 二郎				作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.6%
		職員	林野 三郎				作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.6%
		職員	林野 四郎				作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.6%
		職員	林野 五郎				作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	7	20	7/27*100=25.9%	16/56*100=28.6%
下請	△△土建													作	作	作	○	○	作	作	作	作	○	○	作	作	作							4	12	4/16*100=25.0%	4/16*100=25.0%		
下請	□□土木																												作	作	○				1	2	1/3*100=33.3%	1/3*100=33.3%	
備考																												休日 計画	作業 計画	現場 閉所率	全体休日率								
																												7	20	25.9%	101/355*100 =28.5%								
																												累計											
																												休日 計画	作業 計画	現場 閉所率									
																												16	40	28.6%									

交替制の場合に記入

現場閉所の場合に記入

※休日数割合とは、休日を休日と作業日の和で除した割合をいう。

凡例: ○:休日、●:振替休日、作:作業日、振作:振替作業日

「週休 2 日を促進する試行工事」実施アンケート

1 試行工事の概要について

- (1) 工事名：
 (2) 工事期間：

2 貴社の週休 2 日の達成状況及び試行工事の条件について

- (1) 計画的に完全週休 2 日、月内週休 2 日又は工期内週休 2 日を達成できましたか。

※「完全週休 2 日」とは、週のうち土曜日及び日曜日を休工日とするもの。

「月内週休 2 日」とは、ひと月のうちで 4 週 8 休を達成するもの。

「工期内週休 2 日」とは、工期内で 4 週 8 休を達成するもの。

- ①完全週休 2 日を達成できた。
 ②①は確保できなかったが、月内週休 2 日は達成できた。
 ③①、②は確保できなかったが、工期内週休 2 日は達成できた。
 ④週休 2 日を達成できなかった。

回答：_____

- (2) 完全週休 2 日、月内週休 2 日又は工期内週休 2 日を達成できなかった理由は何ですか。

(自由記載)

--

- (3) 試行工事の工期設定はどうでしたか。

- ①適切である。
 ②余裕がある。
 ③不足する。 → (4) へ

回答：_____

- (4) 不足する理由及び不足日数を教えてください。

(自由記載)

--

不足日数	
------	--

3 完全週休 2 日の導入について

完全週休 2 日を導入することに関して、発注者に求めること、現場や体制上の課題や不安はありますか。

(自由記載)

--

ウィークリースタンス実施に関する特記仕様書

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。なお、災害対応等緊急を要する場合は、この限りではない。

1. 目的

工事を円滑かつ効率的に進めるため、1週間の受発注者間における相互の態勢に関する事項の目標を定め、計画的な工事の施工を確保しつつ、より一層の業務環境の改善等に努めることを目的とする。

2. 取組内容

以下の項目について、受発注者間で確認及び調整の上、取組内容を設定する。

- (1) 休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。
- (2) 休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。
- (3) 「ノー残業デー」は勤務時間外に依頼しない。
- (4) 打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。
- (5) 午後4時以降の打合せ、現地立会を行わない。
- (6) 作業内容に見合った作業期間を確保する。
- (7) 業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。
- (8) その他必要な事項について任意に設定することができる。

3. 進め方

(1) 原則、初回打合せ時に、発注者から受注者に本取組の目的及び内容を説明するとともに、取組内容を確認及び調整し設定する。取組期間については、初回打合せ時(取組内容を設定した日)から工期末までを原則とする。また、受注者は、初回打合せ時に設定した取組内容をウィークリースタンス推進チェックシート(別記様式1)に整理し、工事打合せ簿等とともに発注者に提出する。

(2) 施工の途中において、受発注者間で取組のフォローアップ等を原則1回以上行う。

(3) 受注者は、工期末までに、実施結果(効果、改善点等)をウィークリースタンス実施状況報告書(別記様式2)に整理し、発注者に提出する。

ウィークリースタンス推進チェックシート (初回打合せ時)

(1) 参加者

実施日 令和〇年〇月〇日

工事名	●●工事		
工期	令和〇年〇月〇日 ~ 令和〇年〇月〇日		
発注者	発注者名	〇〇森林管理署	
	役職名	監督職員	
	氏名	〇〇 〇〇	
受注者	会社名	〇〇建設(株)	
	役職名	監理(主任)技術者	現場代理人
	氏名	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇

(2) 営業時間等

発注者		受注者	
始業時間	8:30	始業時間	9:15
終業時間	17:15	終業時間	18:00
ノー残業デー※1	毎週水、金曜日、毎月16日	ノー残業デー※1	毎月10日、15日、20日、25日

※1 毎月の定時退社・退庁の曜日または日を記入すること。

(3) ウィークリースタンス取り組み実施内容 (■実施項目)

実施項目	特記事項 (日付け等の設定)	実施
(1) 休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。	月曜日等 (第三者の要求対応を除く)	■
(2) 休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。	金曜日等 (第三者の要求対応を除く)	■
(3) ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。	毎週水曜日 (第三者の要求対応を除く)	■
(4) 打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。		■
(5) 午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。	16時以降開始する打合せを行わない。	■
(6) 作業内容に見合った作業期間を確保する。		■
(7) 業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。		■
(8) その他の項目※2		
打合せは午前10時~午後4時までの時間とする		<input type="checkbox"/>
ノー残業デーは定時の帰宅に心がける		<input type="checkbox"/>
打合せはWEB会議を活用するなど、効率的な実施に努める		<input type="checkbox"/>

※2 (1)~(7)以外で取り組む内容がある場合に記入する。

※ 受注者の希望する実施項目は「□」とし、初回打合せを踏まえ実施する項目を「■」とする。

予め対応出来ない事項やその措置に対する対応を確認する。

(4) 緊急時等の対処方法

緊急時等の対処方法
受注者は権利者等との調整の結果、休日の作業となる場合は休日の翌日(●曜日)を振替日(休日)とする。 ノー残業デーは権利者等の第三者の要求によるものを除き勤務時間外の業務対応を求めない。

※ 工事の内容や特性を踏まえ、緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び休日又は夜間作業等により、設定した取り組みが実施できない場合の対処方法(依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等)について双方で確認し設定する。

ウィークリースタンス実施状況報告書

(1) 基本情報

提出日 令和〇年〇月〇日

工事名	●●工事		
工期	令和〇年〇月〇日 ～ 令和〇年〇月〇日		
発注者	発注者名	〇〇森林管理署	
	役職名	監督職員	
	氏名	〇〇 〇〇	
受注者	会社名	〇〇建設(株)	
	役職名	監理(主任)技術者	現場代理人
	氏名	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇

(2) 実施状況及び改善点

- ① 休日の翌日(月曜日等)は依頼の期限日としない。

実施状況: 実施できた

「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

- ② 休日の前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。

実施状況: どちらかというと実施できた

「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

- ③ ノー残業デーは勤務時間外に依頼しない。

実施状況: 実施できた

「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

- ④ 打合せの開始時に終了時刻を定め、原則としてその時刻までに打合せを終了する。

実施状況: 全く実施できなかった

「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

打合せを効率的に実施することができず、長引き設定した時間内に終了しなかった

- ⑤ 午後4時以降の打合せ、現地立会は行わない。

実施状況: どちらかというと実施できなかった

「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

急ぎ決めたい内容が発生し、16時以降に打合せすることがあった

- ⑥ 作業内容に見合った作業期間を確保する。

実施状況: 実施できた

「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

- ⑦ 業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。

実施状況: 実施できた

「実施できた・どちらかというと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

⑧ その他、任意で設定する取組

設定の有無: 有

設定ありの場合の内容: ... (追加した内容を記載)

実施状況: 実施できた

「実施できた・どちらか」というと実施できた」以外を選択した場合、その理由を以下に記入

⑨ 本取組を実施するにあたっての問題点や、今後の改善点などを記入

本取組の問題点や改善点を記入してください。(自由記載)

間伐材を活用した合板特記仕様書

1. 受注者は、コンクリート型枠等の資材として合板を使用する場合は、間伐材が混入した製品を使用しなければならない。

なお、製品の調達が困難な場合等で、代替製品を利用する場合は、事前に監督職員の承諾を得なければならない。

水抜特記仕様書

1. 水抜きは設計図に基づき水平に設けるものとする。
 水抜きに用いる材料の品質規格は、設計図に基づき下表のものを使用する。

適用工種	品 質	規 格	摘 要
コンクリート擁壁工	塩ビ管	VU75	

モルタル特記仕様書

1. モルタルの適用工種と品質規格は、次による。

適用工種	用途	配 合								
該当なし		レデーミクストモルタルは次による。 呼び強度 N/mm ² スランプ cmのコンクリートのうち粗骨材を 除いた配合とする。								
		現場練りは次による 呼び強度 N/mm ²								
		単位量								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">水</th> <th style="text-align: center;">セメント</th> <th style="text-align: center;">細骨材</th> <th style="text-align: center;">粗骨材</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	水	セメント	細骨材	粗骨材				
水	セメント	細骨材	粗骨材							

コンクリート特記仕様書

適用等については、設計図書等によるものとし、疑義が生じた場合は監督職員の指示に従うこと。

1 コンクリートの品質規格

コンクリートの品質規格は、次表記載によること。

レデーミクストコンクリート(JIS5308により生産されたレデーミクストコンクリート)

適用工種	種類	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の最大寸 法(mm)	セメント の種類
コンクリートブロック積工の胴込・裏込 コンクリート・横断溝・集水桝・飛水防 止用作工物	標準品	18	8	20又は25	高炉B
コンクリート擁壁工・コンクリートブロッ ク積工の基礎コンクリート	標準品	18	8	40	高炉B
コンクリート路面工	標準品	曲げ4.5	6.5	40	高炉B

注)コンクリートは、上記の「適用工種」の工種に該当する品質規格のものを使用すること。

落石防止工（ロープ伏工）に関する特記仕様書

1. 総則

この特記仕様書は、ロープ伏工による落石防止工に適用する。

この仕様書、標準図及び森林整備保全事業工事標準仕様書に定めない事項については、施工目的に基づき監督職員と協議して定める。

一般

主材料搬入時には、納入書と照合して部材数量及び部材寸法を確認しなければならない。また、必要に応じて品質証明書（ミルシート）を監督員に提出しなければならない。

監督員が必要と認めて指示をした場合、設計図面または測量図面を基本とし、各部材の応力計算書を提出しなければならない。

2. 材料仕様

2-1. 材料基準

本工事に使用する材料は下記に定める製品またはこれと同等以上の製品とする。

表 2-1. ロープ伏工 標準使用材料

ワイヤロープ	ロープ径 mm	破断荷重 kN		亜鉛付着量 g/m ²	準拠規格
3×7 G/O φ12	12+7%・-0%	78.8 以上		165 以上	JIS G3525
3×7 G/O φ14	14+7%・-0%	109 以上		190 以上	JIS G3525
巻付グリップ	構成 mm×本	引張強さ N/mm ²	滑り量 mm/kN	亜鉛付着量 g/m ²	準拠規格
φ12 用	2.80×6	1,370 以上	10 以下/78.8	250 以上	テザック規格
φ14 用	3.45×6	1,370 以上	10 以下/109	250 以上	テザック規格
岩部用アンカー	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
D22 (M20) ×1,000	490 以上	345~440	18 以上	49 以上	JIS G3112
D22 (M20) ×1,500					JIS H8641
D25 (M24) ×1,000	490 以上	345~440	19 以上	49 以上	JIS G3112
D25 (M24) ×1,500					JIS H8641
表土部用アンカー	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
アローEX アンカー-25	490 以上	345~440	18 以上	77 以上	JIS G3112・JIS H8641
アローEX アンカー-35	490 以上	345~440	19 以上	77 以上	JIS G3112・JIS H8641
土砂部用アンカー	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
アローSR アンカー-25	400~510	245 以上	17 以上	77 以上	JIS G3101・JIS H8641
アローSR アンカー-35	400~510	245 以上	17 以上	77 以上	JIS G3101・JIS H8641
交点クリップ	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
φ12 用 t12×50×100	450 以上	280 以上	10 以上	49 以上	JIS G5502・JIS H8641

φ 14 用 t 19×65×130	450 以上	280 以上	10 以上	49 以上	JIS G5502・JIS H8641
交点アンカーリップ	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
φ 12 用 t 12×50×100	450 以上	280 以上	10 以上	49 以上	JIS G5502・JIS H8641
φ 14 用 t 19×65×130	450 以上	280 以上	10 以上	49 以上	JIS G5502・JIS H8641
三方アンカーリップ	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
t 19×120×155	450 以上	280 以上	10 以上	49 以上	JIS G5502・JIS H8641
エクスクリップ	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
大 t 4.5×85×85	400~510	245 以上	21 以上	49 以上	JIS G3101・JIS H8641
小 t 3.2×70×70	400~510	245 以上	21 以上	49 以上	JIS G3101・JIS H8641
金網	目合 mm	線径 mm	引張強さ N/mm ²	亜鉛付着量 g/m ²	準拠規格
φ 3.2-50×50 Z-GS3	50±3%	3.2±0.07	290~540	128 以上	JIS G3552・JIS G3547
結合コイル	線径 mm	引張強さ N/mm ²		亜鉛付着量 g/m ²	準拠規格
φ 3.2 - 50×300	3.2±0.08	1,230 以上		400 以上	JIS G3548

3. 施工要領

3-1. 施工フロー

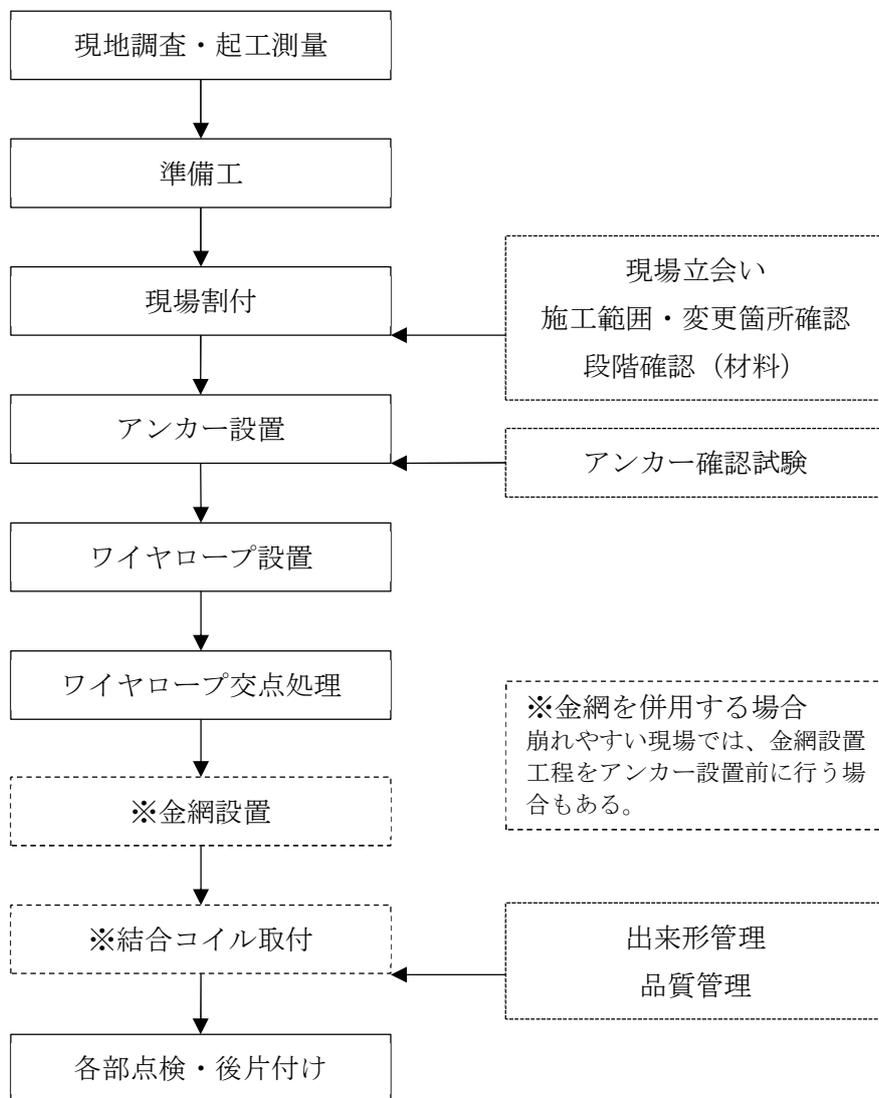


図3-1-1. ロープ伏工 施工フロー

3-2. 現地調査・起工測量

設計図書に基づき以下の項目の確認及び調査を行う。

- ① 転石・浮石の位置、数量、大きさを確認し設計耐力及び施工方法との照査を行う。
- ② 立木の位置、大きさからワイヤロープ、アンカーの設置に支障が出ないか確認する。
- ③ アンカー設置部の土質を確認し、使用するアンカーの選定を行う。
- ④ 斜面の位置、形状、勾配を確認し、必要に応じて足場設置、荷揚げ方法、第三者への安全対策等の協議を行う。

3-3. 準備工

① 仮設工

作業中の落石から安全を確保するため、斜面下部に仮設フェンス等を設置する。

② 斜面整理工

ワイヤロープ、アンカー設置の支障となる立木を伐採する。
作業中の落石を防ぐため、不安定な転石、浮石を除去する。

③ 足場工等

昇降階段の設置、安全带を使用するための親綱仮設、荷揚げ用索道の架設など安全かつスムーズな施工が行えるよう現場に応じた対策をとる。

3-4. 現場割付

① 割付図・展開図の作成

起工測量を基に割付図、展開図を作成する。現地には紐やテープ等でマーキングを行い、ロープ・アンカーの相互の間隔が広がらないように配置し、扇状箇所については縦ロープが重複しないようできるだけ等間隔に設置することに留意する。なお、ロープの標準間隔は2.5m以内とし、間隔がこれを超える場合にはアンカー及びワイヤロープを増設し、標準間隔の許容範囲内に収める。当初設計と変更となる箇所は図面上明記する。

② 監督員による現地立会

割付図、展開図を基に監督員の立会を受ける。施工範囲や変更箇所の確認を行い、施工承認を受ける。立会時に新たな変更が生じた場合には図面及び現地マーキングの変更を行う。

※マーキング方法

ロープ伏工は斜面になじませながら架設するため、縦横ロープの間隔は斜面起伏の影響を受けやすい。従ってメインアンカー位置をマーキングする際、施工面の端部もしくは中央部の通りの良い箇所に縦ロープの基準軸、最下段に横ロープの基準軸を設けてマーキングする。その基準軸から縦横方向へロープ相互間隔が広がらないよう注意しながら割付を行い、横ロープ間隔については法肩部で調整する。

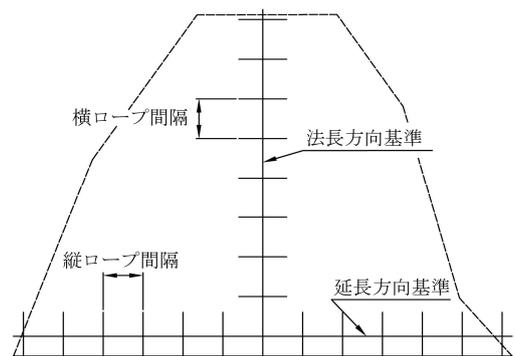


図 3-4-1. マーキング方法

3-5. アンカー設置

3-5-1. 岩部用アンカー設置

① 削孔

削岩機を用いて岩部にビット径 $\phi 40\sim\phi 44$ (D22)、 $\phi 44\sim\phi 48$ (D25)、深さ 900 mm以上の削孔を行う。土被り部は表土を人力掘削し岩部を露出させた後、所定のビット径で深さ 900 mm以上の削孔を行う。

② セメントカプセル浸漬

セメントカプセル（アンカー定着材）を水中に浸して気泡の発生が無くなるまで含水させる（4～5分程度）。

③ セメントカプセル挿入

吸水させたセメントカプセルを孔内に挿入し、アンカー材を上下に動かして練り混ぜ孔底まで押し込む。所定の可使時間を過ぎると凝結が始まるので吸水後は速やかに使用する。

④ アンカー設置

アンカー材を設計定着長以上まで挿入する。

⑤ 完了

設置完了後 24 時間以上経過した後、所定の数量の確認試験を行う。ワイヤロープとの接続部材は所定の強度が得られてから取り付ける。

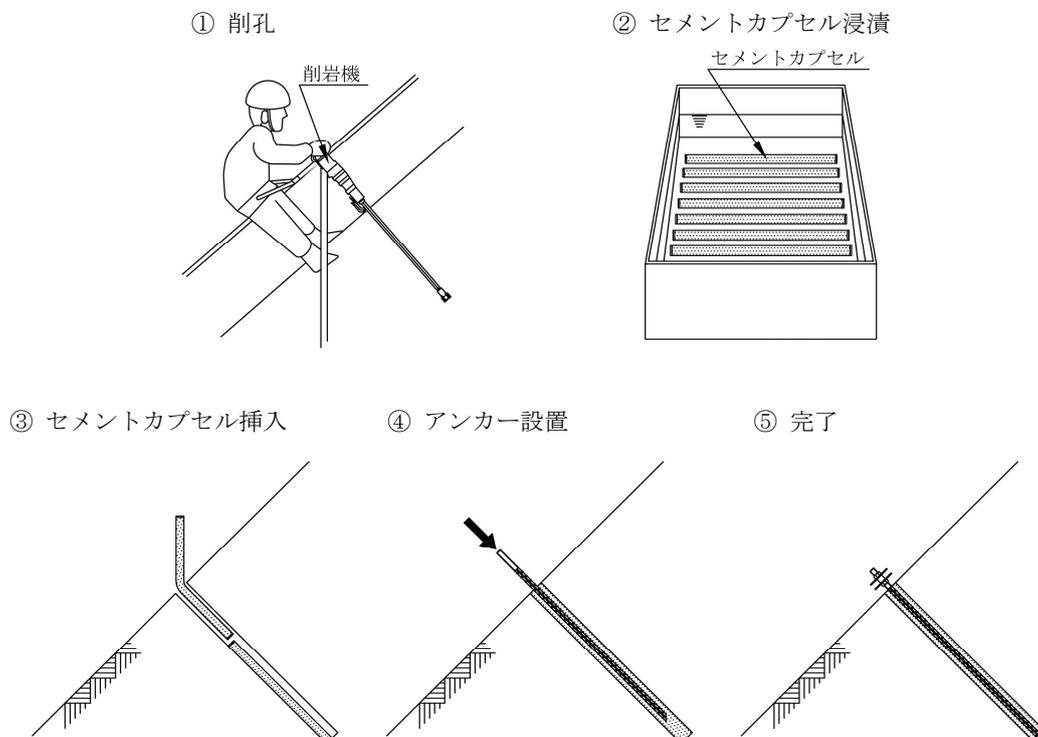


図 3-5-1. 岩部用アンカー設置

3-5-2. アローSR アンカー設置

アローSR アンカーの頭部に杭打機をセットし打ち込む。打ち込み長は図1-5-2に示す有効長以上とし、マーキングの状況からロープが斜面になじむように調整する。

打ち込みが困難な場所については、削岩機やニューマチックパンチャーで下穴をあけてから打ち込む。

なお、アローSR アンカーの使用に際しては、供試体を用いて耐力試験を行い、所定の耐力を得られるか確認すること。

アローSR アンカーの打設途中において、障害物などに当たり、打ち込みが困難な場合は、監督員と協議し、その指示により施工を行う。

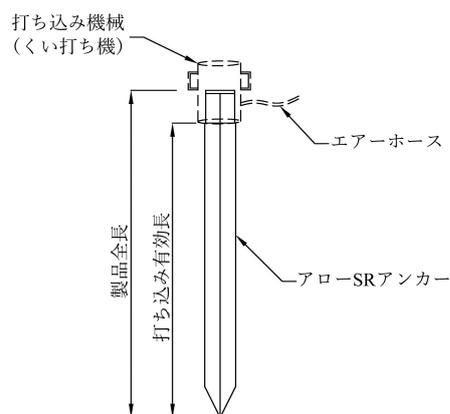


図3-5-2. アローSR アンカー設置

3-5-3. アローEX アンカー設置

① 土圧板設置

土圧板をハンマー等で表土部に打ち込む。

打ち込みが困難な場所については、筋掘りを行ってから打ち込む。

② 異形棒鋼設置

岩部用アンカー設置と同じ手順で異形棒鋼を設置する。削孔長は1,400 mm以上とする。

③ 支圧板設置

支圧板とサポートテーブルを土圧板に設置し、コマナットを用いて異形棒鋼と締結させ、地山へ圧着させる。

なお、アローEX アンカーの使用に際しては、供試体を用いて耐力試験を行い、所定の耐力を得られるか確認すること。

土圧板の打設途中において、障害物などに当たり、打ち込みが困難な場合は、監督員と協議し、その指示により施工を行う。

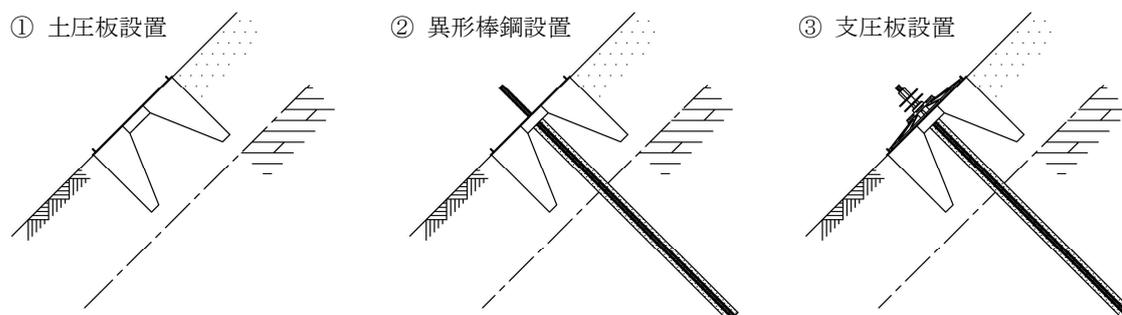


図3-5-3. アローEX アンカー設置

3-6. ワイヤロープ設置


① 切断

ワイヤロープは割付図、展開図の設計長を基に切断する。切断の際、斜面の凹凸を考慮し余尺をとる。切断したワイヤロープの片端に巻付グリップを取り付ける。


② 設置

縦横ロープとも相互の間隔が広くならないように配置し、斜面になじませるように設置する。扇状箇所については縦ロープが重複しないようできるだけ等間隔に設置することに留意する。

なお、ロープの標準間隔は2.5m以内とし、間隔がこれを超える場合にはアンカー及びワイヤロープを増設し、標準間隔の許容範囲内に収める。

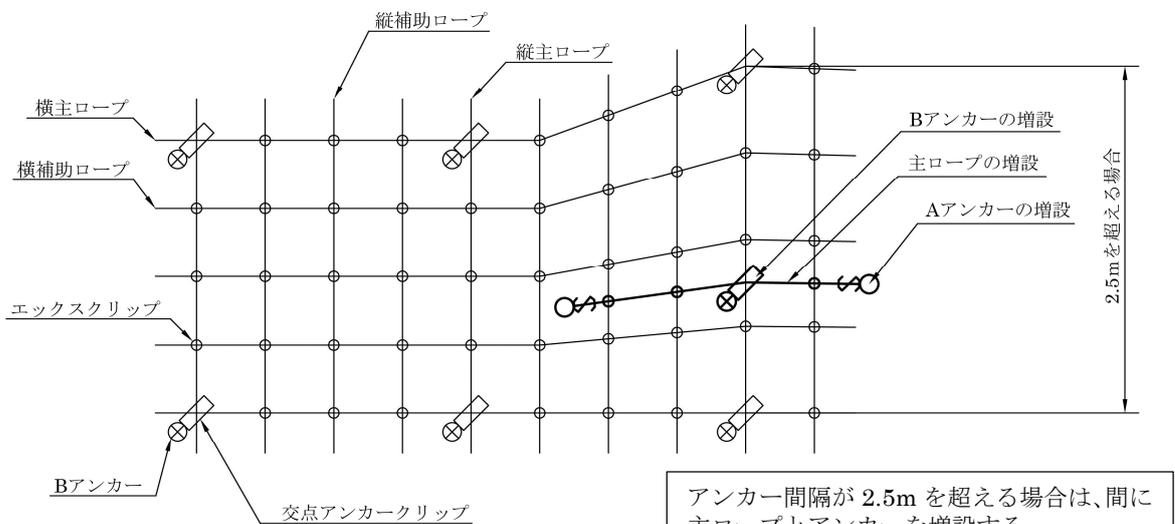

アンカー間隔が2.5mを超える場合は、間に主ロープとアンカーを増設する。また、補助ロープは主ロープ間にできるだけ等間隔に設置する。

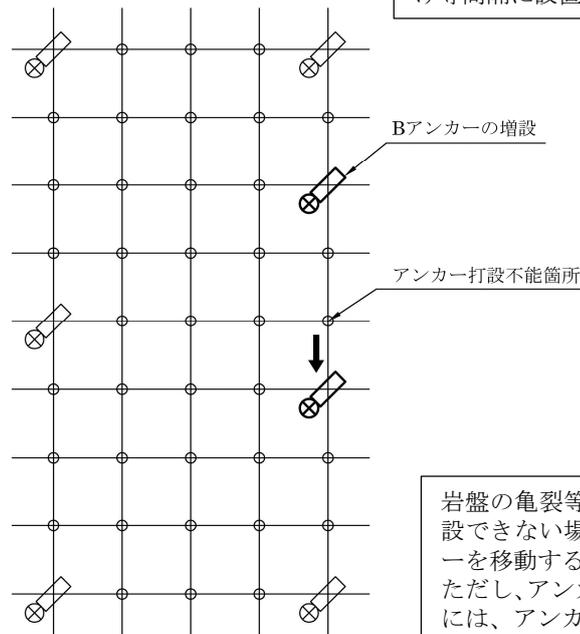

岩盤の亀裂等でアンカーを所定の位置に打設できない場合には、主ロープ上でアンカーを移動する。ただし、アンカー間隔が2.5mを超える場合には、アンカーを増設する。

図3-6-1. アンカー及びワイヤロープの増設例

3-7. ワイヤロープ交点処理

縦ロープと横ロープの交点については、外縁部の角は A アンカーに接続し、それ以外の T 字交点は三方アンカークリップを用いて B アンカーと締結する。その他の十字交点については交点アンカークリップを用いて B アンカーと締結する。

補助ロープはアンカーと締結せず、エックスクリップを取り付ける。

3-8. 金網設置

浮石・転石がワイヤロープ間隔より小さい場合、又は岩の剥離が想定される場合には、ワイヤロープ間より抜け落ちる事が想定されるため、金網を併用することでこれに対処する。金網の選定については、横ロープにかかる等分布荷重と金網の有効張力を比較して選定する。

金網の設置は斜面上部より 1 枚ずつ行い、金網の目をできるだけ壊さないよう設置し、重ね幅は 20 cm を標準とし 10 cm 以上とする。ただし、現場条件により不都合が出る場合は、監督員と協議とする。

3-9. 結合コイル取付

以下の通り、結合コイルを用いてワイヤロープと金網を接合する。

縦ロープ	1 個/m
横ロープ	1 個/m
補助ロープ	アンカー間の 4 m ² に 4 個

3-10. 各部点検・後片付け

エックスクリップ・交点アンカークリップ等のナットの弛みを確認し、施工現場周辺・資材置場周辺の清掃をして作業を終了する。

4. 施工管理基準

4-1. 工程管理

施工に当たり現地の状況を十分調査し、工程計画を立てて安全且つスムーズに施工を行うこと。

4-2. 出来形管理

4-2-1. 出来形管理項目

出来形管理資料を下記に基づき作成する。

- ① 縦、横ロープ・・・基準ロープを設定し（例 横ロープ：最上段 縦ロープ：最端）、それを基準にロープ間隔、長さを測定する。
- ② 補助ロープ・・・主ロープの測定結果より算出する。
- ③ アンカー・・・施工したアンカー数量を算出する。
- ④ 三方アンカークリップ、交点アンカークリップ、巻付グリップ、エックスクリップ
・・・施工した数量を算出する。
- ⑤ 金網・・・施工面積を算出する。

表 4-2-1. 管理項目一覧表

区分	工種	項目	規格値	測定値
アンカー	削孔工	削孔長検尺	L=900、1,400	総本数の 5%*
	アンカー挿入	設置角度	測定基準参照	総本数の 5%*
ロープ長さ検測	主縦ロープ	全長検尺	公差 < +500 mm	基準軸
	主横ロープ	全長検尺	公差 < +500 mm	基準軸
	主縦横ロープ	基準軸間隔	2m 公差 < +100 mm	1 施工区に 1 箇所
金網(金網併用の場合)	金網設置	検尺		全面積
面積	X × Y	検尺		全面積

注) 土砂部及び表土部用アンカーは施工本数 10 本以上で 2 本、10 本未満で 1 本の確認試験とし、試供体にて実施する。

4-2-2. 測定基準

(1) ロープ、アンカー間隔

基本的に設計図書によってロープ、アンカー間隔は確定するが、斜面の起伏、立ち木など現地状況により変更する場合は表4-2-2の通りに定める。

表4-2-2. ロープ、アンカー間隔（標準ピッチ 2.0m）

2.0m×2.0m タイプ	縦ロープ間隔	2.5m以内
	横ロープ間隔	2.5m以内
	アンカー間隔	2.5m以内

注) 上記の間隔を越える場合は、アンカーを増設する。

(2) 岩部用アンカー

削孔長、設置角度を表4-2-3に示す。

表4-2-3. 岩部用アンカー削孔長

岩部用アンカー	削孔長 (mm)	設置角度 (°)
D22(M20)×1,000	900 以上	図2-2-1 参照
D22(M20)×1,500	1,400 以上	図2-2-1 参照
D25(M24)×1,000	900 以上	図2-2-1 参照
D25(M24)×1,500	1,400 以上	図2-2-1 参照

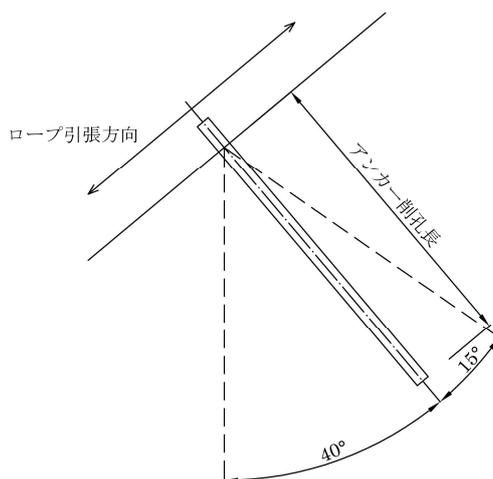


図4-2-1. 岩部用アンカー設置角度

アンカーは、せん断抵抗力によって能力を発揮させるため、打設角度は法勾配に対し 90° を原則とする。尚、許容打設角度はロープ張出し方向に対し、上向き 15°、下向き 40° 以内とする。

又、現地の状況より設置困難な場合は別途協議する事とする。

(3) アローSR アンカー

土砂部用アンカーを使用する場合は施工前に必ず耐力試験を行い、耐力を発揮する設置角度、最少根入れ長を確認すること。

(4) アローEX アンカー

削孔長、設置角度を表4-2-4に示す。

表4-2-4. アローEX アンカー削孔長

アローEX アンカー	削孔長 (mm)		設置角度 (°)
	表土部	岩盤部※	
D22×1,600(2,100)	1,000 以下	400 以上	図2-2-1 参照
D25×1,600(2,100)	1,000 以下	400 以上	図2-2-1 参照

注) 岩盤部の削孔長は、表土部削孔長と全削孔長から算出する。

アンカーの耐力を正しく発揮させる為、支圧板は飛出し箇所のないスポーク部分(4か所)を土圧板の羽根4方向と合致させるよう羽根上の突起に合わせ、設置する。

アローEX アンカーを使用する場合は施工前に必ず耐力試験を行い、規定の耐力を満たすことを確認すること。

【アンカー引抜き力】

アンカーの角度が、上向きに設置したときに発生する引抜き力 T_a は(式2-2-1)で求められる。

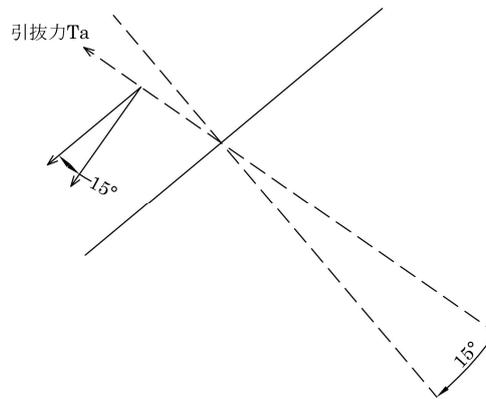


図4-2-2. アンカー引抜き力

$$T_a = T_{ca} \cdot \sin 15^\circ \dots\dots\dots (式2-2-1)$$

T_a : 上向きに設置したときに発生する引抜き力 (kN)

T_{ca} : ワイヤロープの許容荷重 (kN)

ここで、引抜力 T_a の計算結果を表 4-2-5 に示す。

表 4-2-5. 引抜力 T_a

規格	引抜力 T_a
TSR-12 型	5.919kN
TSR-14 型	8.463kN

アンカーを上向き 15° に設置したときに発生する引抜力 T_a は、岩部用アンカー及びアローEX アンカーの許容引抜荷重の範囲内である。

(5) 金網（金網併用の場合）

重ね幅は 20 cm を標準とし 10 cm 以上とする。ただし、現場条件により不都合が出る場合は、監督員と協議とする。

(6) 結合コイル（金網併用の場合）

結合コイルの数量管理基準を表 4-2-6 に示す。

表 4-2-6. 結合コイル使用数量

設置箇所	結合コイル
縦ロープ	1 個/m
横ロープ	1 個/m
補助ロープ	アンカー間の 4 m^2 に 4 個

4-3. 写真管理

- ① 縦、横ロープ・・・・・・・・設置状況写真
縦、横ロープ共に長さが分かるようスケール等を使用し撮影する。
- ② 岩部用アンカー・・・・・・・・下記の項目についてアンカー総数の5%以上とする。
- ③ アローSR アンカー・・・・・・・・下記の項目について施工本数10本以上で2本、10本未満で1本とする。
- ④ アローEX アンカー・・・・・・・・下記の項目について施工本数10本以上で2本、10本未満で1本とする。

表4-3-1. 写真管理項目一覧

着工前		全景	起点・終点	着工前
伐開		状況・処理		適時
		運搬処理		適時
材料検測		各部材検測	各部材、納入数を入れる	全種類
アンカー工	岩部用	削孔	作業状況	施工時
		削孔検尺	削孔長	施工時
		アンカー・モルタル挿入	作業状況	施工時
		出来形	アンカー挿入角度	施工時
	土砂部用	アンカー挿入	作業状況	施工時
		出来形	アンカー挿入角度	施工時
	表土部用	羽根挿入	作業状況	施工時
		削孔	作業状況	施工時
		削孔検尺	削孔長	施工時
		アンカー・モルタル挿入	作業状況	施工時
		組立	作業状況	施工時
出来形	アンカー挿入角度	施工時		
ロープ取付工		主ロープ取付	作業状況	施工時
		補助ロープ取付	作業状況	施工時
		金具取付	作業状況	施工時
		主横ロープ	測長	測定時
		主縦ロープ	測長	測定時
金網設置工（金網併用の場合）		金網設置	作業状況	施工時
		金具取付	作業状況	施工時
完成		面積	測量	測定時
		全景	起点・終点	施工後・各1

4-4. 品質管理

4-4-1. 材料管理

材料ミルシートと搬入時における寸法、外観検査にて確認する。

4-4-2. アンカー耐力管理

(1) 岩部用アンカー

岩部用アンカーの岩盤への定着を確認するため、センターホールジャッキを用いてアンカー縦軸方向に引抜試験を行う。試験荷重はアンカーの許容せん断力 τa を基に設計される。

表 4-4-1. 試験内容

アンカーの種類	仕様	試験荷重	試験本数	試験種別
岩部用アンカー	D22(M20)×1,000 D22(M20)×1,500	26kN	施工本数の 5%	アンカー軸方向 引抜試験
岩部用アンカー	D25(M24)×1,000 D25(M24)×1,500	37kN	施工本数の 5%	アンカー軸方向 引抜試験

【試験機器及び方法例】

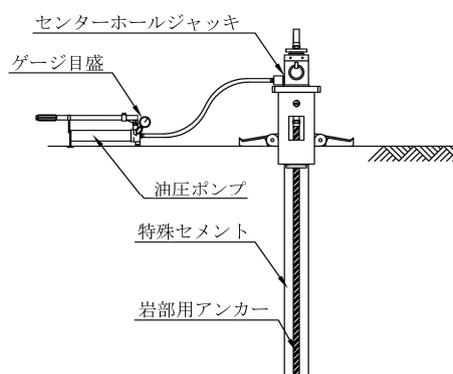


図 4-4-1. 岩部用アンカーの試験機器及び方法例

合否判定基準

所定の荷重を負荷し、抜けが見られないこと (変位が 0)

(2) アローSR アンカー

チルホールもしくはハンドブロック、滑車等を利用しロープ引張方向にアローSR アンカーの設計標準耐力まで引張試験を行う。

表 4-4-2. 試験内容

アンカーの種類	仕様	試験荷重	試験本数	試験種別
アローSR アンカー-25	L-75×75×6×2×1,600 L-75×75×6×2×2,000	25kN	施工本数が 10本未満 1本 10本以上 2本	アンカー横軸方向 引張試験
アローSR アンカー-35	L-90×90×7×2×1,600 L-90×90×7×2×2,000	35kN		アンカー横軸方向 引張試験

注) 供試体による確認試験とする。

【試験機器及び方法例】

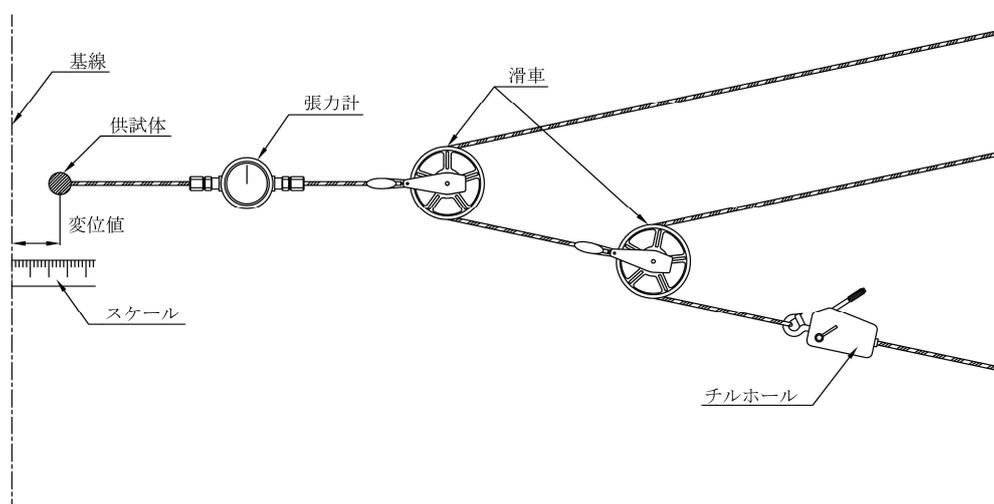


図 4-4-2. アローSR アンカーの試験機器及び方法例

合否判定基準

限界荷重以下であること。(限界荷重：荷重が上がらず、変位量が増加する荷重)

(3) アローEX アンカー

チルホールもしくはハンドブロック、滑車等を利用しロープ引張方向にアローEX アンカーの設計標準耐力まで引張試験を行う。

表 4-4-3. 試験内容

アンカーの種類	仕 様	試験荷重	試験本数	試験種別
アローEX アンカー25	D22×1,600 D22×2,100	25kN	施工本数が 10本未満 1本 10本以上 2本	アンカー横軸方向 引張試験
アローEX アンカー35	D25×1,600 D25×2,100	35kN		アンカー横軸方向 引張試験

注) 供試体による確認試験とする。

合否判定基準

限界荷重以下であること。(限界荷重：荷重が上がらず、変位量が増加する荷重)

〈引張試験が行えない場合〉

センターホールジャッキを用いてアンカー軸方向にアローEX アンカーの設計標準耐力まで引抜試験を行う。

表 4-4-4. 試験内容

アンカーの種類	仕 様	試験荷重	試験本数	試験種別
アローEX アンカー25	D22×1,600 D22×2,100	25kN	施工本数が 10本未満 1本 10本以上 2本	アンカー軸方向 引抜試験
アローEX アンカー35	D25×1,600 D25×2,100	35kN		アンカー軸方向 引抜試験

注) 供試体による確認試験とする。

合否判定基準

所定の荷重を負荷し、抜けが見られないこと (変位が0)

落石防止工（ロープ掛工）に関する特記仕様書

1. 総則

この特記仕様書は、ロープ掛工による落石防止工に適用する。

この仕様書、標準図及び森林整備保全事業工事標準仕様書に定めない事項については、施工目的に基づき監督職員と協議して定める。

一般

主材料搬入時には、納入書と照合して部材数量及び部材寸法を確認しなければならない。また、必要に応じて品質証明書（ミルシート）を監督員に提出しなければならない。

監督員が必要と認めて指示をした場合、設計図面または測量図面を基本とし、各部材の応力計算書を提出しなければならない。

2. 材料仕様

2-1. 材料基準

本工事に使用する材料は下記に定める製品またはこれと同等以上の製品とする。

表 2-1. ロープ掛工 標準使用材料

リングユニット	ロープ径 mm	破断荷重 kN		亜鉛付着量 g/m ²	準拠規格
3×7 G/O φ12-500	12+7%・-0%	78.8 以上		165 以上	JIS G3525
アンカー接続板	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
標準型 t 12×75×190	400~510	245 以上	17 以上	77 以上	JIS G3101・JIS H8641
ワイヤロープ	ロープ径 mm	破断荷重 kN		亜鉛付着量 g/m ²	準拠規格
3×7 G/O φ12	12+7%・-0%	78.8 以上		165 以上	JIS G3525
3×7 G/O φ14	14+7%・-0%	109 以上		190 以上	JIS G3525
3×7 G/O φ16	16+7%・-0%	139 以上		220 以上	JIS G3525
3×7 G/O φ18	18+7%・-0%	157 以上		300 以上	JIS G3525
ターンバックル φ25	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
φ25 J&E パイプ部	420~540	235 以上	23 以上	49 以上	JIS G3475・JIS H8641
φ25 J&E ロッド部	400~510	235 以上	20 以上	49 以上	JIS G3101・JIS H8641
ターンバックル φ22	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
φ22 J&E パイプ部	400~540	235 以上	23 以上	49 以上	JIS G3475・JIS H8641
φ22 J&E ロッド部	400~510	235 以上	20 以上	49 以上	JIS G3101・JIS H8641
巻付グリップ	構成 mm×本	引張強さ N/mm ²	滑り量 mm/kN	亜鉛付着量 g/m ²	準拠規格
φ12 用	2.80×6	1,370 以上	10 以下/78.8	250 以上	テザック規格
φ14 用	3.45×6	1,370 以上	10 以下/109	250 以上	テザック規格

φ16用	3.45×7	1,370以上	10以下/139	250以上	テザック規格
φ18用	4.20×6	1,370以上	10以下/159	260以上	テザック規格
岩部用アンカー	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
D22 (M20) ×1,000 D22 (M20) ×1,500	490以上	345~440	18以上	49以上	JIS G3112 JIS H8641
D25 (M24) ×1,000 D25 (M24) ×1,500	490以上	345~440	19以上	49以上	JIS G3112 JIS H8641
D29 (M27) ×1,000 D29 (M27) ×1,500	490以上	345~440	19以上	49以上	JIS G3112 JIS H8641
D32 (M30) ×1,000 D32 (M30) ×1,500	490以上	345~440	19以上	49以上	JIS G3112 JIS H8641
アンカーバンド	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
岩部用 φ22×185	400~510	215以上	22以上	49以上	JIS G3101・JIS H8641
クロスリップ	引張強さ N/mm ²	降伏点 N/mm ²	伸び %	亜鉛付着量 膜厚 μm	準拠規格
大 t 4.5×75×60	400~510	245以上	21以上	49以上	JIS G3101・JIS H8641
小 t 3.2×65×60	400~510	245以上	21以上	49以上	JIS G3101・JIS H8641

3. 施工要領

3-1. 施工フロー

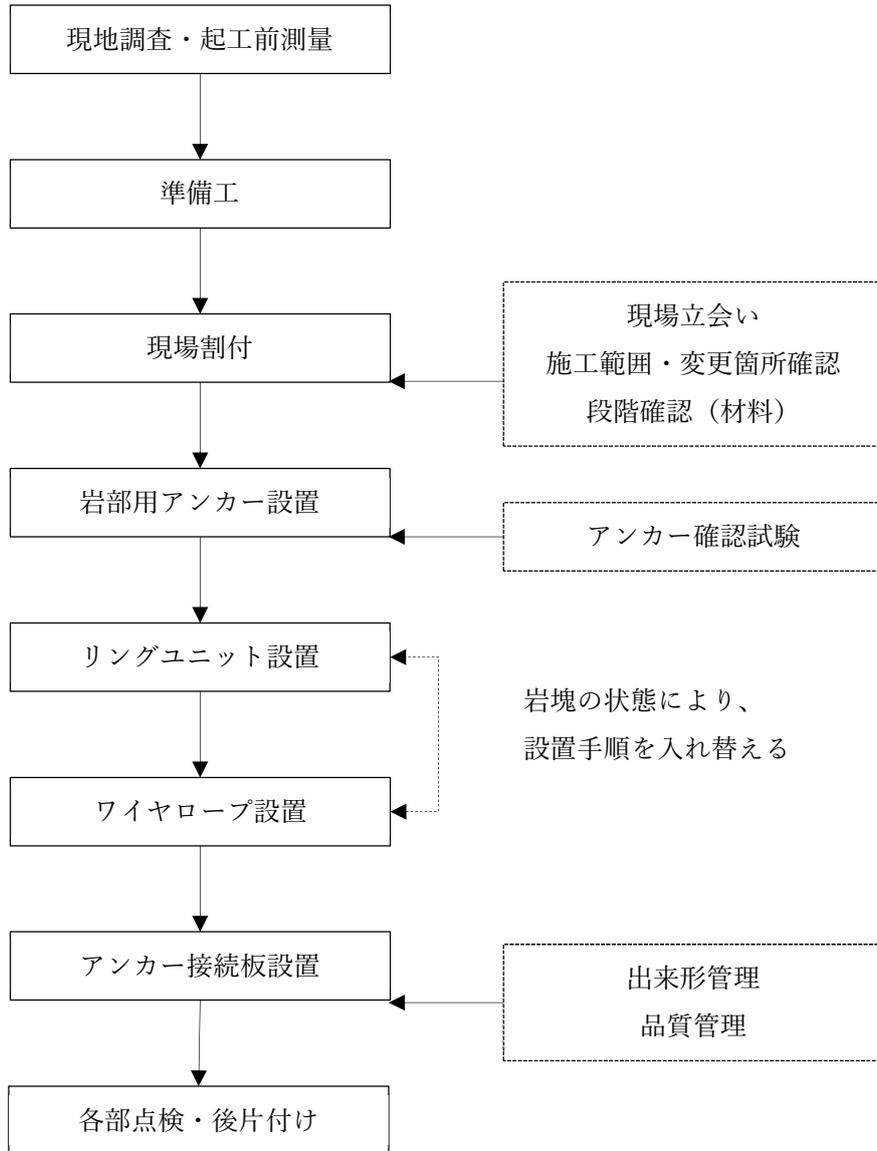


図3-1. ロープ掛工 施工フロー

3-2. 現地調査・起工前測量

設計図書に基づき以下の項目の確認及び調査を行う。

- ① 転石・浮石の位置、数量、大きさを確認し設計耐力及び施工方法との照査を行う。
- ② 立木の位置、大きさから設置に支障が出ないか確認する。
- ③ アンカー設置部の土質を確認し、使用するアンカーの選定を行う。
- ④ 斜面の位置、形状、勾配を確認し、必要に応じて足場設置、荷揚げ方法、第三者への安全対策等の協議を行う。

3-3. 準備工

① 仮設工

作業中の落石から安全を確保するため、斜面下部に仮設フェンスを設置する。

② 足場工等

昇降階段の設置、安全帯を使用するための親綱仮設、荷揚げ用索道の架設など安全かつスムーズな施工が行えるよう現場に応じた対策をとる。

3-4. 現場割付

① 割付図・展開図の作成

起工測量を基に割付図、展開図を作成する。現地には紐やテープ等でマーキングを行い、各アンカーの位置を決め、リングユニットの敷設面積とワイヤロープの長さを測定し、当初設計と変更となる箇所は図面上明記する。

② 監督員による現地立会

割付図、展開図を基に監督員の立会を受ける。施工範囲や変更箇所の確認を行い、施工承認を受ける。立会時に新たな変更が生じた場合には図面及び現地マーキングの変更を行う。

3-5. 岩部用アンカー設置

構造計算により算出された所定の本数を設置する。なお、最低必要本数は4本とし、敷設したリングユニットの四隅には必ず配置するものとする。

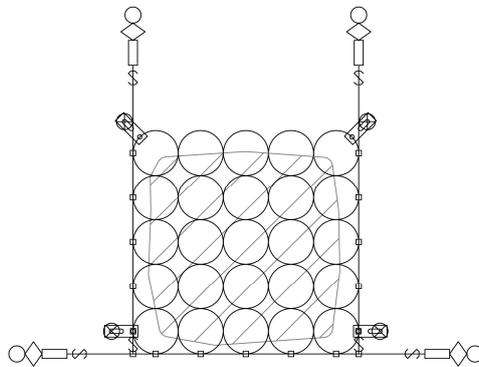


図3-2. リングユニット四隅へのアンカー設置

① 削孔

削岩機を用いて岩部に所定のビット径で削孔を行う。

土被り部は表土を人力掘削し岩部を露出させた後、所定のビット径で削孔を行う。

② セメントカプセル浸漬

セメントカプセル（アンカー定着材）を水中に浸して気泡の発生が無くなるまで含水させる（4～5分程度）。

③ セメントカプセル挿入

吸水させたセメントカプセルを孔内に挿入し、アンカー材を上下に動かして練り混ぜ孔底まで押し込む。
所定の可使時間を過ぎると凝結が始まるので吸水後は速やかに使用する。

④ アンカー設置

アンカー材を設計定着長以上まで挿入する。

⑤ 完了

設置完了後 24 時間以上経過した後、所定の数量の確認試験を行う。ワイヤロープとの接続部材は所定の強度が得られてから取り付ける。

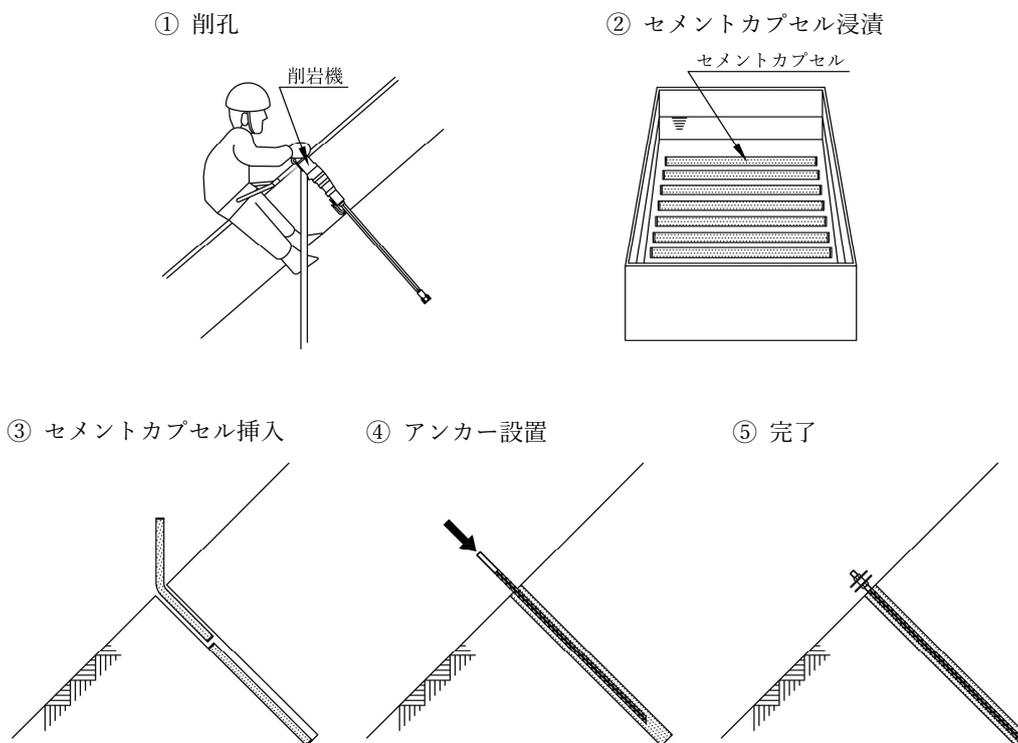


図 3 - 3. アンカー設置

3-6. リングユニット設置

敷設面積に必要なリングユニットを、リング接続金具を用いて繋ぎ合わせ、岩塊上部に設置したアンカーに仮止め後、岩塊を被うように展開する。

岩塊の形状によっては、次項の抜き防止ロープ設置後に、リングユニットをワイヤロープに仮止めし、下部から捲し上げるように展開することも可能である。

【立木箇所での処理方法】

立木箇所ではワイヤロープとワイヤクリップを使用し、立木を巻き込むようにリングを形成しながらリングユニット同士を接続する。ワイヤクリップは JIS B 2809 に従い以下の通り設置する。

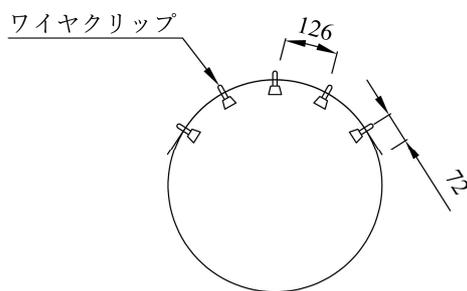


図3-4. ワイヤクリップによるリング形成

表3-1. 設置基準

項目	基準
ワイヤロープ規格	3×7 G/O φ12
ワイヤクリップ規格	F12
クリップの取付個数	5個
クリップの中心間距離	126 mm
クリップ終末端部のロープ長さ	72 mm以上

なお、構造計算による必要交点数を満たしていれば形成するリングの直径に制限はなく、立木の直径やリングユニットのバランスを考慮しワイヤロープ長を決定する（直径 500 mm のリングを形成する場合、ワイヤロープ長は 2,300 mm 以上）。

3-7. ワイヤロープ設置

ワイヤロープは起工測量で測定した寸法を基に切断する。切断の際、測量寸法との誤差を考慮して余尺をとる。

(1) 抜き防止ロープ

岩塊の左右・下部に沿うようにワイヤロープを設置し、アンカーに取り付ける。

ワイヤロープとリングユニットを、クロスクリップを用いて接合する。

抜き防止ロープは可能な限り地山に密着させることが望まれるため、アンカー位置の検討や、押えアンカーによる浮き上がり防止などの対策を講じる。なお、岩塊の形状によっては、リングユニットとの接合は最下段に限らない（図3-5）。

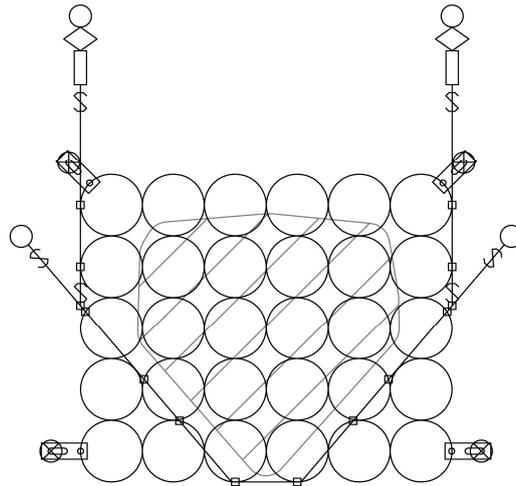


図3-5. 抜け出し防止ロープの設置例

(2) アンカー間隔保持用控えロープ

アンカー間隔が1m未満になる場合や、設置箇所の地質状況により設置が困難な場合に、構造計算により選定された規格のワイヤロープを用いてリングユニット敷設箇所から離れた位置にアンカー設置箇所を調整することができる。

ワイヤロープの両端をアンカー、リングユニットに取り付ける。リングユニットとの接合はクロスクリップを用いる。

3-8. アンカー接続板設置

アンカー接続板を用いてリングユニットをアンカーに固定する。

3-9. 各部点検・後片付け

クロスクリップ・アンカー接続板等のナットの弛みを確認し、施工現場周辺・資材置場周辺の清掃をして作業を終了する。

4. 施工管理基準

4-1. 工程管理

施工に当たり現地の状況を十分調査し、工程計画を立て安全且つスムーズに施工を行うこと。

4-2. 出来高管理

出来高管理資料を下記に基づき作成する。

- ① リングユニット・・・・・・敷設面積を算出する。
- ② アンカー・・・・・・施工したアンカー数量を算出する。
- ③ アンカー接続板、巻付グリップ、クロスクリップ・・・・・・施工した数量を算出する。

4-3. 出来形管理

出来形管理資料を表4-1に基づき作成する。

表4-1. 管理項目一覧表

区分	工種	項目	規格値	測定頻度	写真管理
アンカー	削孔工	削孔長検尺	L=900、1,400	全数	総本数の5%※
	アンカー挿入	設置角度	測定基準参照	全数	総本数の5%※
設置面積	X × Y	検尺	設計値以上	全面積	全面積

※1 施工箇所当り1本未満の場合は1本。

設置面積の考え方

複雑な形状の岩塊の表面積を算出することは困難であることから、ロープ掛工の設計面積及び設置面積は岩塊底面周囲の敷設位置の面積とし、材料使用量は割り増しにより算出する(技術資料7-3. 使用材料参照)。なお、設計面積は地山の地盤や形状、施工の安全性等を考慮し決定することが望まれる。




図4-1. 設計面積

4-4. アンカー測定基準

削孔長、穿孔角度を表4-2に示す。

表4-2. 岩部用アンカー削孔長

岩部用アンカー	削孔長 (mm)	穿孔角度 (°)
D22(M20)×1,000	900 以上	図4-2 参照
D22(M20)×1,500	1,400 以上	図4-2 参照
D25(M24)×1,000	900 以上	図4-2 参照
D25(M24)×1,500	1,400 以上	図4-2 参照
D29(M27)×1,000	900 以上	図4-2 参照
D29(M27)×1,500	1,400 以上	図4-2 参照
D32(M30)×1,000	900 以上	図4-2 参照
D32(M30)×1,500	1,400 以上	図4-2 参照

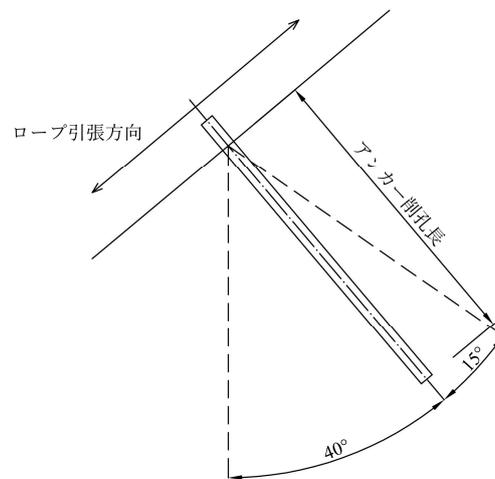


図4-2. 岩部用アンカー設置角度

アンカーは、せん断抵抗力によって能力を発揮させるため、打設角度は法勾配に対し 90° を原則とする。尚、許容打設角度はロープ張出し方向に対し、上向き 15°、下向き 40° 以内とする。

又、現地の状況より設置困難な場合は別途協議する事とする。

4-5. 品質管理

4-5-1. 材料管理

材料ミルシートと搬入時における寸法、外観検査にて確認する。

4-5-2. アンカー耐力管理

岩部用アンカーの岩盤への定着を確認するため、センターホールジャッキを用いてアンカー縦軸方向に引抜試験を行う。試験荷重は強度計算で算出したアンカー1本当たりの作用荷重 T とし、また、ゲージ目盛を考慮し5kNピッチの近似値とする。

表4-3. 試験内容

種類	試験荷重	試験本数	試験種別
アンカー	設計値 T	施工本数の5%	アンカー縦軸方向引抜試験

【試験機器及び方法例】

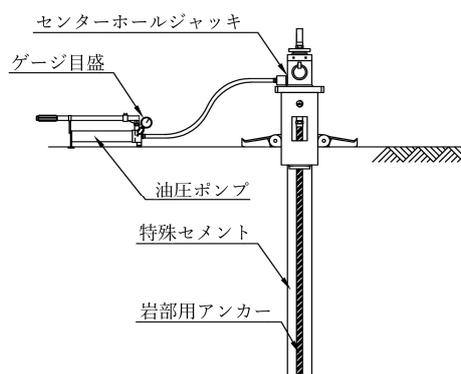


図4-3. 岩部用アンカーの試験機器及び方法例

合否判定基準

所定の荷重を負荷し、抜けが見られないこと (変位が0)

4-6. 写真管理

表4-4. 写真管理項目一覧

区分	撮影項目		撮影時期
着工前	全景	起点・終点	着工前
伐開	状況・処理		適時
	運搬処理		適時
材料検測	各部材検測	各部材、納入数を入れる	全種類
アンカー工	削孔	作業状況	施工時
	削孔検尺	削孔長	施工時
	アンカー・モルタル挿入	作業状況	施工時
	出来形	アンカー挿入角度	施工時
リングユニット設置工	リングユニット取付	作業状況	施工時
	金具取付	作業状況	施工時
ワイヤロープ取付工	ワイヤロープ取付	作業状況	施工時
	金具取付	作業状況	施工時
完成	面積	測量	測定時
	全景	起点・終点	施工後・各1
